Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE // 2024

COBAS-AEP

Ressourcer le monde VEOLIA

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

SOMMAIRE

1. Présentation du contrat et du service 4
1.1. Données du contrat 5
1.2. Les chiffres clés du service 6
1.3. Principaux indicateurs réglementaires 7
2. L'essentiel de votre service 10
2.1. Les interlocuteurs de la SEEBAS à vos côtés 11
2.2. Focus sur les principaux engagements contractuels 13
2.3. Faits marquants du contrat en 2024 13
2.4. Évolutions réglementaires de 2024 et à venir 17
2.5. Incontournables pour 2025 21
3. Bilan et perspectives du service 27
3.1. Bilan hydraulique 28
3.2. Bilan qualité de l'eau 34
3.3. Bilan énergie 37
3.4. Gestion de votre patrimoine 39
3.5. A l'écoute des consommateurs 41
3.6. Résilience du territoire 53
4. Rapport financier du service 60
4.1. Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation 61
4.2. Situation des biens 68
4.3. Les investissements et le renouvellement 69
4.4. Les engagements à incidence financière 78
4.5. Annexes financières 82
5. Donnees detaillees 89
5.1. Le prix du service public de l'eau 90
5.2. Vision pluriannuelle des volumes 94
5.3. Indice de protection de la ressource 97
5.4. Qualité de l'eau 98
5.5. Energie et réactifs 138
5.6. Inventaire des installations et réseaux 141
5.7. Réseaux 151
5.8. Gestion des installations 156
5.9. Opérations de renouvellement, de maintenance et travaux réalisés 162
5.10. Les consommateurs de votre service 184
6. Annexes 186
6.1. Détail des textes réglementaires 187
6.2. Assurances 197
6.3. Synoptique 198
6.4. Certificats ISO 199
6.5. Inventaire du patrimoine 206
6.6. Glossaire 351

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES

Le Règlement Général pour la Protection des Données, entré en vigueur le 25/05/2018, a renforcé les droits et libertés des personnes physiques sur leurs données à caractère personnel. Afin de s'y conformer, les Responsables de traitement des données doivent adapter les mesures de protection les concernant. En conséquence, Veolia Eau France communique à travers le rapport annuel uniquement des données anonymisées ou agrégées

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

1. Présentation du contrat et du service

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

1.1. Données du contrat

- Délégataire : Société d'Exploitation d'Eau du Bassin d'Arcachon Sud
- Périmètre du service : ARCACHON, GUJAN MESTRAS, LA TESTE DE BUCH, LE TEICH
- Numéro du contrat : I0260
- Nature du contrat : Affermage
- Date de début du contrat : 31/12/2015
- Date de fin du contrat : 31/12/2027

Conventions avec des tiers

Type d'engagement	Tiers engagé	Objet
vente	AQUALAND	Convention tripartite relative au droit de forage tirage SEEBAS/AQUALAND/COBAS

Avenants au contrat

Avenant N°	Date d'effet	Commentaire
3	01/07/2021	Révision tarifaire, actualisation des prix, programme de renouvellement, mise à jour inventaire, recalage CEP, répartition d'utilisation des ressources, relation usagers
2	05/07/2017	Intégration surpresseur, rémunération
1	20/12/2016	Actualisation de l'indice électricité de la formule de rémunération du délégataire

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

1.2. LES CHIFFRES CLÉS DU SERVICE

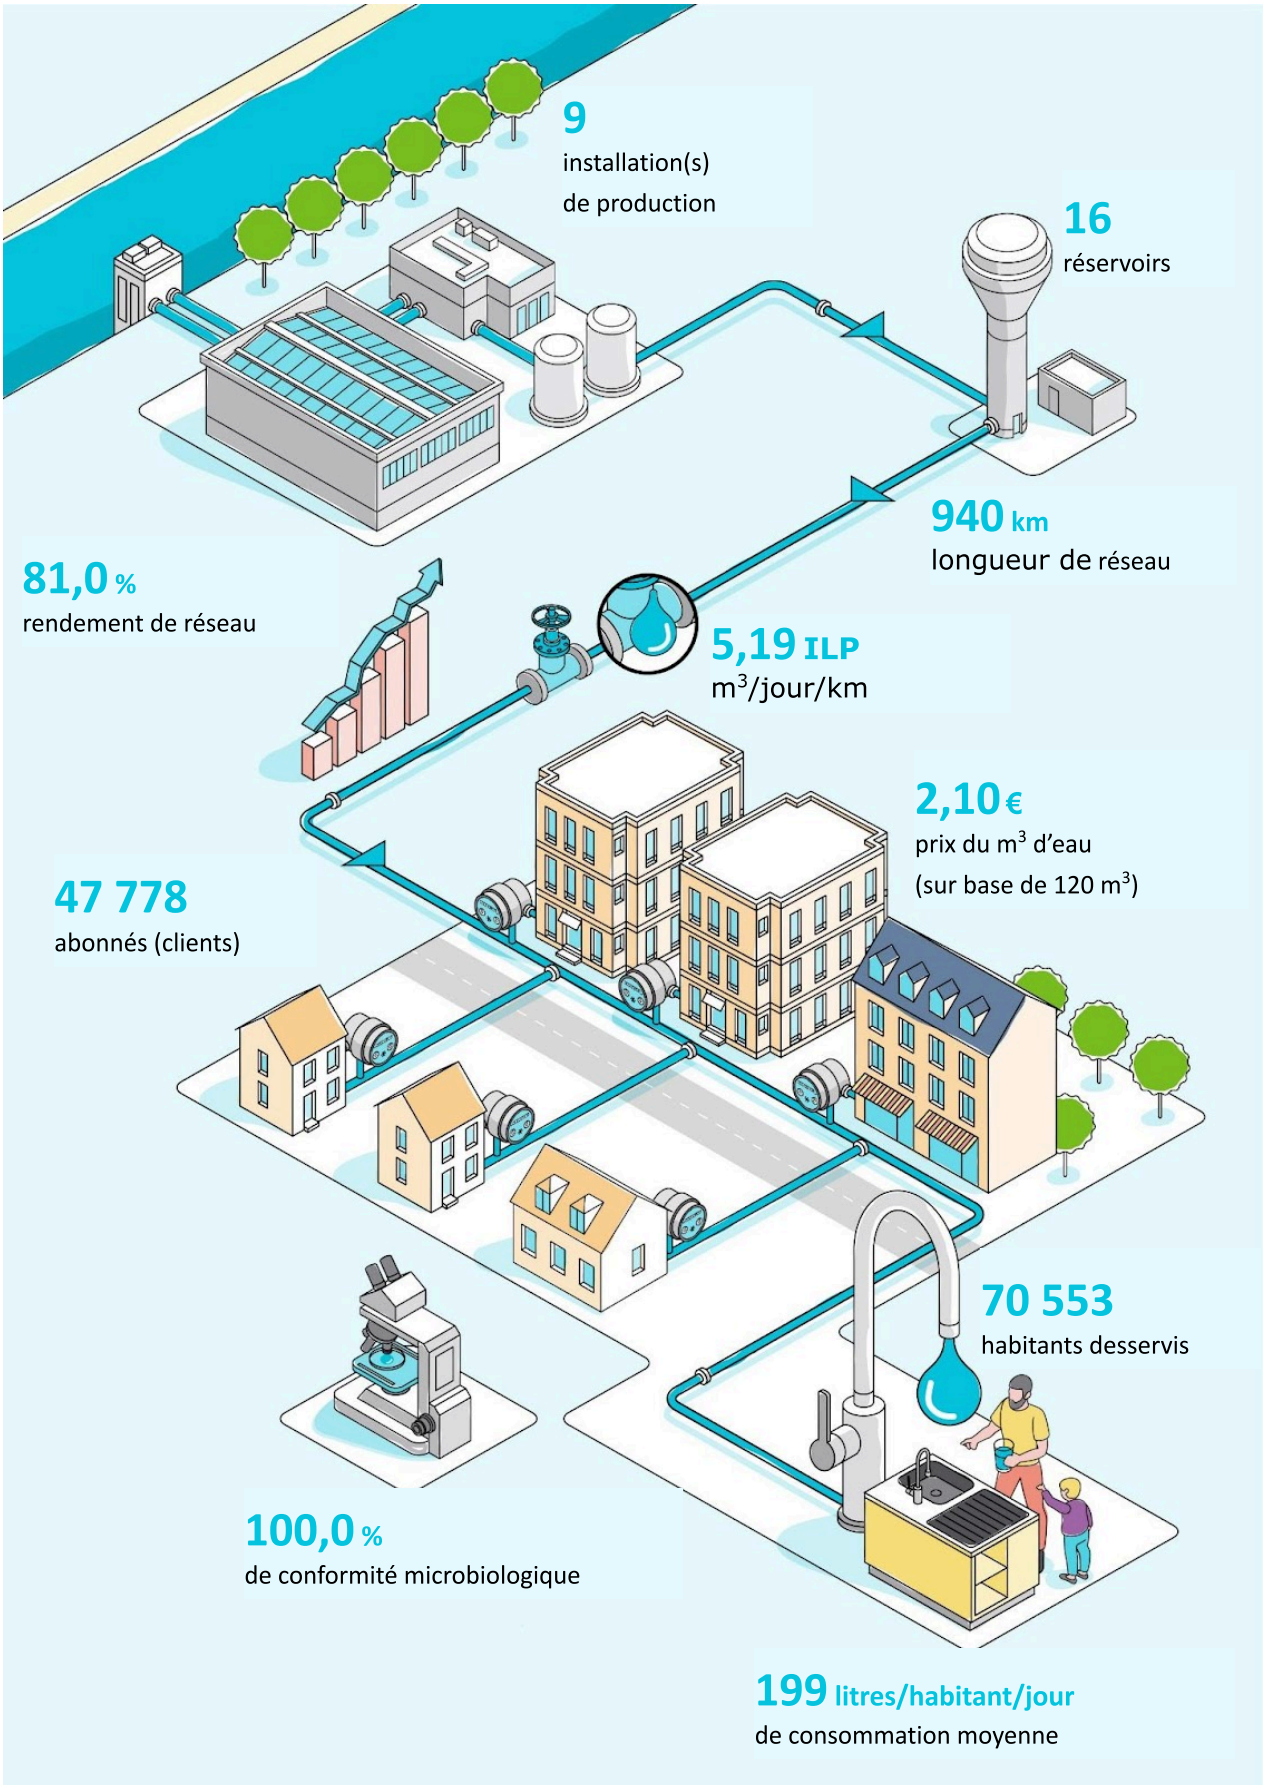

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

1.3. PRINCIPAUX INDICATEURS RÉGLEMENTAIRES

	2020	2021	2022	2023	2024
D101.0 - Estimation du nombre d'habitants desservis (u)	67 627	68 820	69 457	69 504	70 553
D102.0 - Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ (€\m³)	1,85	1,79	1,95	1,99	2,10
D151.0 - Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service (jours)	1	1	1	1	1
P101.1 - Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P102.1 - Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques %	100,00	98,31	100,00	98,48	100,00
P103.2B - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable (ND)	110	110	110	110	110
P104.3 - Rendement du réseau de distribution (%)	85,5	87,6	86,0	82,5	81,0
P105.3 - Indice linéaire des volumes non comptés (m3/km/j)	4,52	3,86	4,88	5,47	5,63
P106.3 - Indice linéaire de pertes en réseau (m3/km/j)	4,20	3,56	4,16	4,96	5,19
P107.2 - Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (%)	0,74	0,70	0,74	0,68	0,46
P108.3 - Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau (%)	80	80	80	80	80
P109.0 - Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité (€)	792,00	582,00	2 529,00	822,00	1 072,00
P151.1 - Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (u./1000 ab.)	0,68	0,97	0,85	1,08	0.71
P152.1 - Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P153.2 - Durée d'extinction de la dette de la collectivité (%)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
P154.0 - Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente (%)	1,35	1,37	1,21	0,95	0,98
P155.1 - Taux de réclamations (u./1000 ab.)	0,73	0,41	0,58	0,55	0,57

(*) Données collectivités

	2020	2021	2022	2023	2024
Qualité d'eau					
VP.126 - Nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses microbiologiques (u)	226	222	232	226	227
VP.127 - Nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses microbiologiques non conformes (u)	0	0	0	0	0
VP.128 - Nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-chimiques (u)	52	59	63	66	62
VP.129 - Nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-chimiques non conformes	0	1	0	1	0
Réseau					
VP.077 - Linéaire de réseau hors branchements (m)	666 500	668 554	672 265	674 759	677 931
VP.059 - Volume produit (m³)	7 041 810	7 009 551	7 279 919	6 995 952	6 780 738

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

VP.060 - Volume importé (m³)	0	0	0	0	0
VP.061 - Volume exporté (m³)	0	0	0	0	0
VP.062 - Volume prélevé (m³)	7 484 204	7 481 830	7 729 397	7 480 549	7 005 767
VP.220 - Volume de service du réseau (m³)	42 209	40 661	51 837	79 338	73 405
VP.221 - Volume consommé sans comptage (m³)	37 368	33 064	124 224	45 224	35 418
ICGPR - Plan des réseaux					
VP.141 - Linéaire de réseaux renouvelés au cours de l'année (quel que soit le financeur) (m)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
VP.236 - Existence d'un plan des réseaux (ND)	10	10	10	10	10
VP.237 - Mise à jour annuelle du plan des réseaux (ND)	5	5	5	5	5
ICGPR - Inventaire des réseaux					
VP.238 - Existence d'un inventaire des réseaux (ND)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
VP.240 - Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux (ND)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
VP.241 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose (%)	100,00	99,00	100,00	100,00	100,00
ICGPR - Autres éléments de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux					
VP.242 - Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes (ND)	10	10	10	10	10
VP.243 - Inventaire des pompes et équipements électromécaniques existants (ND)	10	10	10	10	10
VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux (ND)	10	10	10	10	10
VP.245 - Inventaire caractéristiques compteurs et références carnet métrologique (ND)	10	10	10	10	10
VP.246 - Inventaire secteurs de recherche de pertes eau (ND)	10	10	10	10	10
VP.247 - Localisation des autres interventions (ND)	10	10	10	10	10
VP.248 - Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations (ND)	0	0	0	0	0
VP.249 - Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux (ND)	5	5	5	5	5

	2020	2021	2022	2023	2024
Abonnés					
VP.056 - Nombre d'abonnés (u)	45 374	46 205	46 881	47 359	47 778
VP.020 - Nombre d'interruptions de service non programmées (u)	31	45	27	59	34
Financier					
DC.195 - Montant financier (HT) des travaux engagés (€)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
VP.119 - Somme des abandons de créances et versements à un fonds de solidarité (€)	792,00	582,00	2 529,00	822,00	1 072,00
VP.182 - Encours total de la dette	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
VP.183 - Epargne brute annuelle	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
VP.268 - Montant restant impayés au 31/12/N sur les factures émises au titre de l'année N-1 (€)	324 785	315 426	148 654	117 584	121 083

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

VP.185 - Chiffre d'affaire TTC facturé (hors travaux) au titre de l'année N-1 au 31/12/N (€)	24 056 962	23 007 630	12 331 342	12 369 593	12 336 087

(*) Données collectivités

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

2. L'ESSENTIEL DE VOTRE SERVICE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

2.1. LES INTERLOCUTEURS DE LA SEEBAS À VOS CÔTÉS

La SEEBAS (Société d'Exploitations des Eaux du Bassin d'Arcachon Sud) est la société délégataire du service public de production et de distribution de l'eau potable sur le Bassin d'Arcachon Sud. Elle s'appuie localement sur les ressources et compétences du Territoire Atlantique. Elle est garante de la qualité et de la continuité de ce service si précieux à la vie des habitants et du territoire

- **Organisation Société dédiée SEEBAS**

Au 31/12/2024, La SEEBAS s'appuie sur 21 salariés exclusivement affectés au service délégué

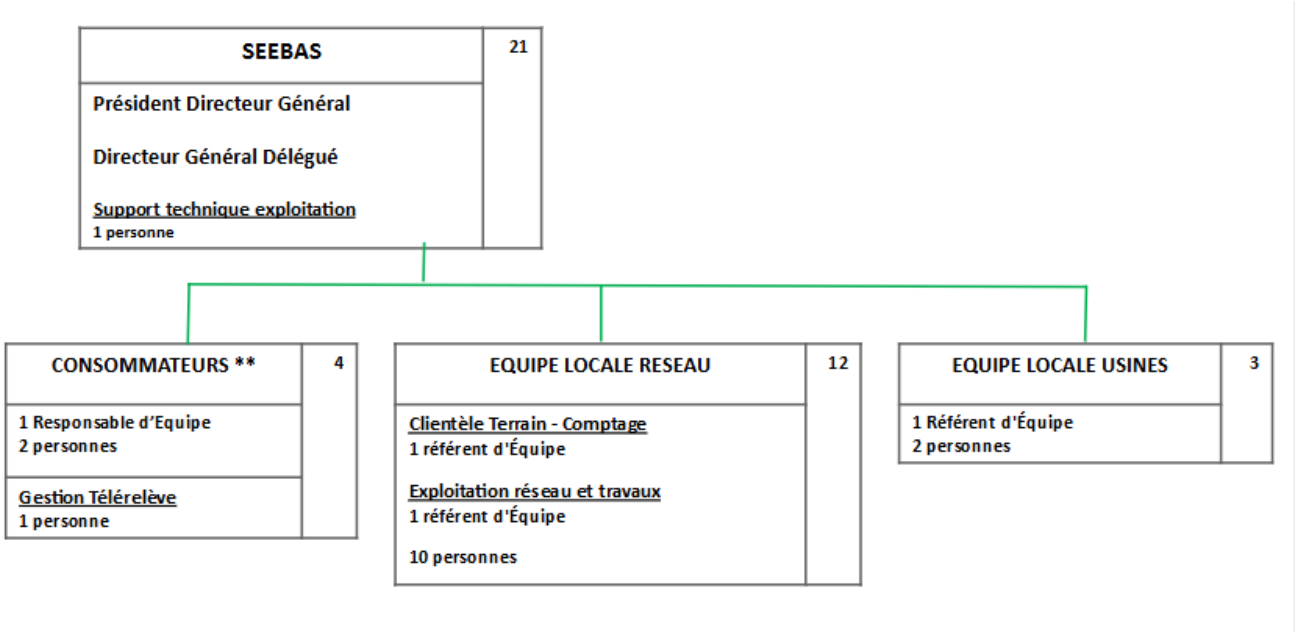

Il n'y a pas eu d'évolution majeure affectant la situation du personnel et aucune observation n'a été formulée par l'Inspection du Travail.

Les équipes de la SEEBAS sont réparties sur trois lieux d'embauche :

- l'équipe usine de 4 personnes embauche sur la station de Cabaret des Pins sur la commune de la Teste de Buch
- une chargé de clientèle embauche sur l'accueil client du 18 rue Jehenne à Arcachon
- le reste du personnel embauche au niveau du 2 rue Copernic au Teich avec une présence régulière sur les deux autres sites de l'équipe d'encadrement.

La liste des emplois et postes de travail et la qualification des agents est détaillée ci-dessous :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

- **Situation du personnel au 31/12/2024 : SEEBAS**

Liste des emplois et poste de travail
Agent Réseau
Agent Usine
Technicien Réseau
Technicien Usine
Agent Technico Administratif
Directeur Service

Qualification des agents
1 Cadre
5 Techniciens
15 Ouvriers

- **Sécurité**

En 2024 pour la quatrième année consécutive, nous n'avons pas déploré d'accidents du travail avec arrêt au sein des équipes de la SEEBAS ;

Nous avons mis en place un plan d'action Sécurité, afin de sensibiliser et d'acquérir une culture sécurité au sein de la SEEBAS. Ce plan d'action, avec un suivi mensuel d'indicateurs Sécurité, s'articule autour de 3 grands principes :

- La remontée de situations dangereuses et presqu'accidents
- La mise en place de quart d'heure sécurité pour l'ensemble des collaborateurs
- Des visites sécurités terrains par le management

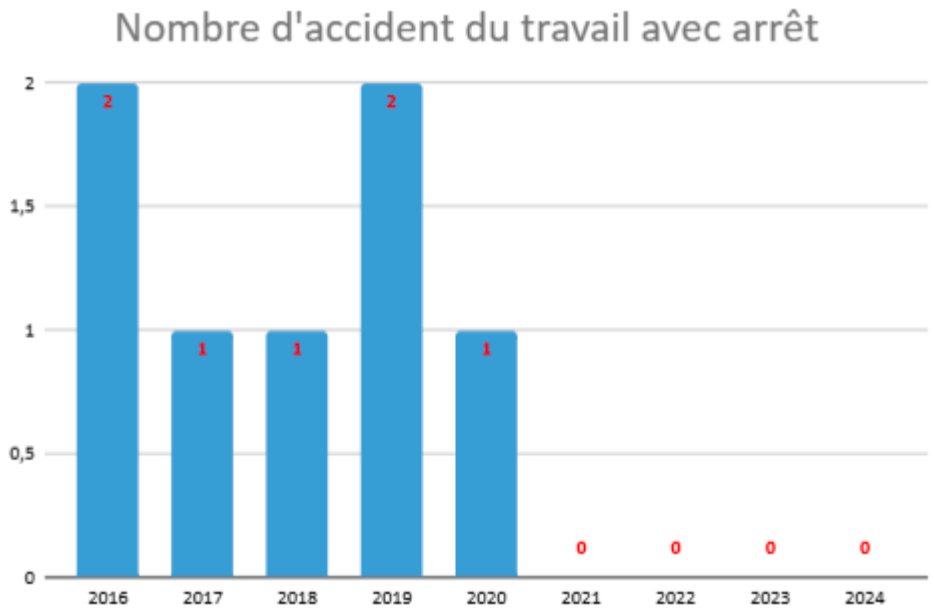

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

2.2. Focus sur les principaux engagements contractuels

Engagements	Objectifs	Résultats	Commentaires
Article 11.4 Télérelevé des compteurs : déploiement et mise à disposition de services aux abonnés (dont alerte fuite...)	100% des compteurs télérelevés	98,5%	au 31/12/2024 748 compteurs non équipés (actifs et inactifs)
Article 5.1 Maintien d'un ratio de [production Usine] / [production Forages + Usine]	32% de l'eau mise en distribution	24% par rapport au volume produit et 25,9% pour le prélevé	Arrêt usine en janvier 2024 (canalisation eau brute en travaux) et arrêt technique usine d'octobre 2024 à la fin décembre 2024
Annexe engagements	100% de réalisation sur la durée	70% à date	85 engagements réalisés 19 non réalisés 1 en cours 4 sans objet

2.3. Faits marquants du contrat en 2024

- **Redémarrage Exhaure Cazaux**

Remise en service de la canalisation d'eau brute le 11 janvier 2024, située dans le lac de Cazaux, après la fin des travaux de repositionnement effectués par la COBAS.

Cette installation a été arrêtée du 07 novembre 2023 au 11 janvier 2024.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

- **Arrêt technique usine suite présence de mousses au niveau du process de l'usine**

Depuis début octobre 2024, la présence de mousse dans la filière de traitement de l'usine de Cabaret des Pins empêche le fonctionnement normal de l'usine d'eau de surface. La qualité de l'eau n'est pas impactée et reste conforme aux exigences réglementaires.
Depuis que la présence de cette mousse a été constatée, l'eau distribuée depuis la bâche 1000 est issue du forage de Cabaret.
Un diagnostic génétique microbien et une désinfection complète de l'ensemble des ouvrages ont été lancés fin 2024

- **Baisse du rendement**

Le rendement de la COBAS connaît une dégradation de 1,5 points entre 2023 et 2024.

Plus précisément le volume consommé autorisé 365 jours diminue de 281 841 m3 soit 4,9% par rapport à 2023 et le volume mis en distribution de 215 214 m3 soit 3,1% par rapport à 2023. Les pertes en eaux s'élèvent donc à 1 288 235 m3 soit +5,5% par rapport à 2023.

Année	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Volume consommé autorisé 365 jours	5 317 956	5 729 743	5 780 964	5 871 725	6 018 411	6 140 230	6 258 247	5 774 344	5 492 503
Volume produit	6 726 288	7 086 385	6 923 193	6 826 703	7 041 810	7 009 551	7 279 919	6 995 952	6 780 738
Rendement	79,1%	80,9%	83,5%	86,0%	85,5%	87,6%	86,0%	82,5%	81,0%
Volumes pertes réseau	1 408 332	1 356 642	1 142 229	954 978	1 023 399	869 321	1 021 672	1 221 608	1 288 235
Variation N-1		-3,7%	-15,8%	-16,4%	7,2%	-15,1%	17,5%	19,6%	5,5%

Une analyse détaillée de l'Indice Linéaire de Pertes (ILP) et de l'Indice Linéaire de Volume Non Compté (INVNC), dans l'annexe complémentaire au RAD 2024, nous permet de comprendre l'évolution du rendement du réseau et de proposer un plan d'actions, notamment concernant la comptabilisation des vols d'eau sur les poteaux incendie. L'analyse de la baisse des volumes comptabilisés complète cette analyse et montre une importante baisse des volumes des compteurs verts d'arrosage.

L'intensification des recherches de fuites et une surveillance renforcée des débits minimums par secteur a été réalisée tout au long de l'année 2024. La détection des fuites est particulièrement difficile en raison de la nature des branchements en PEHD, des chaussées drainantes qui facilitent l'évacuation de l'eau, et des terrains sablonneux où les fuites peinent à remonter à la surface.

- **Augmentation des fuites branchements avec problématique cuivre**

Il faut noter que l'année 2024 est marquée par une recrudescence des fuites branchements, 16% d'augmentation par rapport à 2023
La hausse la plus importante apparaît sur la commune d'Arcachon avec +43% par rapport à 2023. Elle est principalement liée à l'apparition de fuite sur le matériau cuivre. La hausse importante constatée sur le PVC est à relativiser par rapport au nombre de fuites constatées.

Graphique Evolution des fuites branchements entre 2024 et 2023:

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

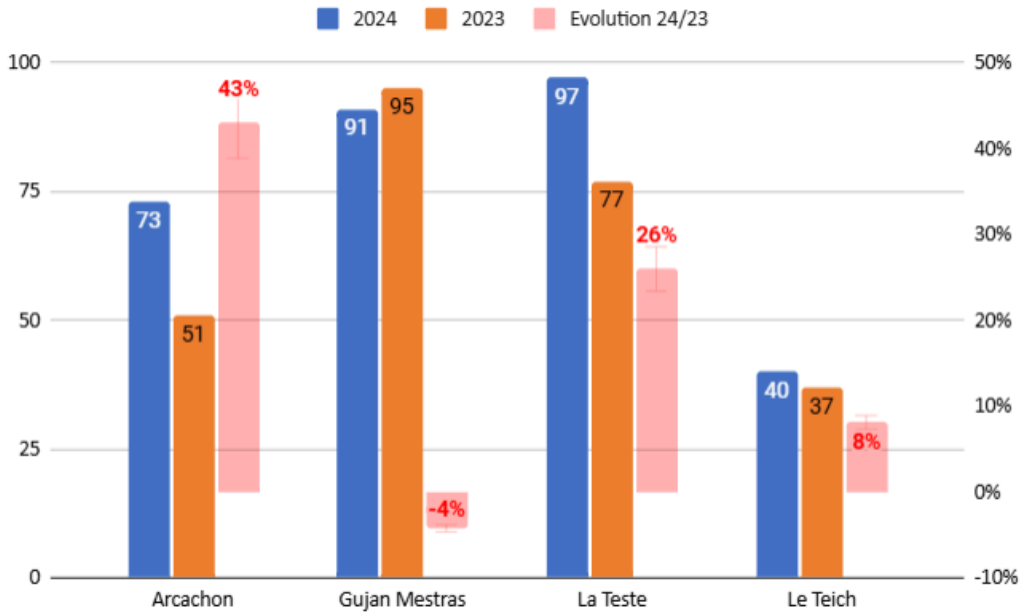

Graphique Evolution des fuites branchements en lien avec le MATÉRIAU entre 2024 et 2023:

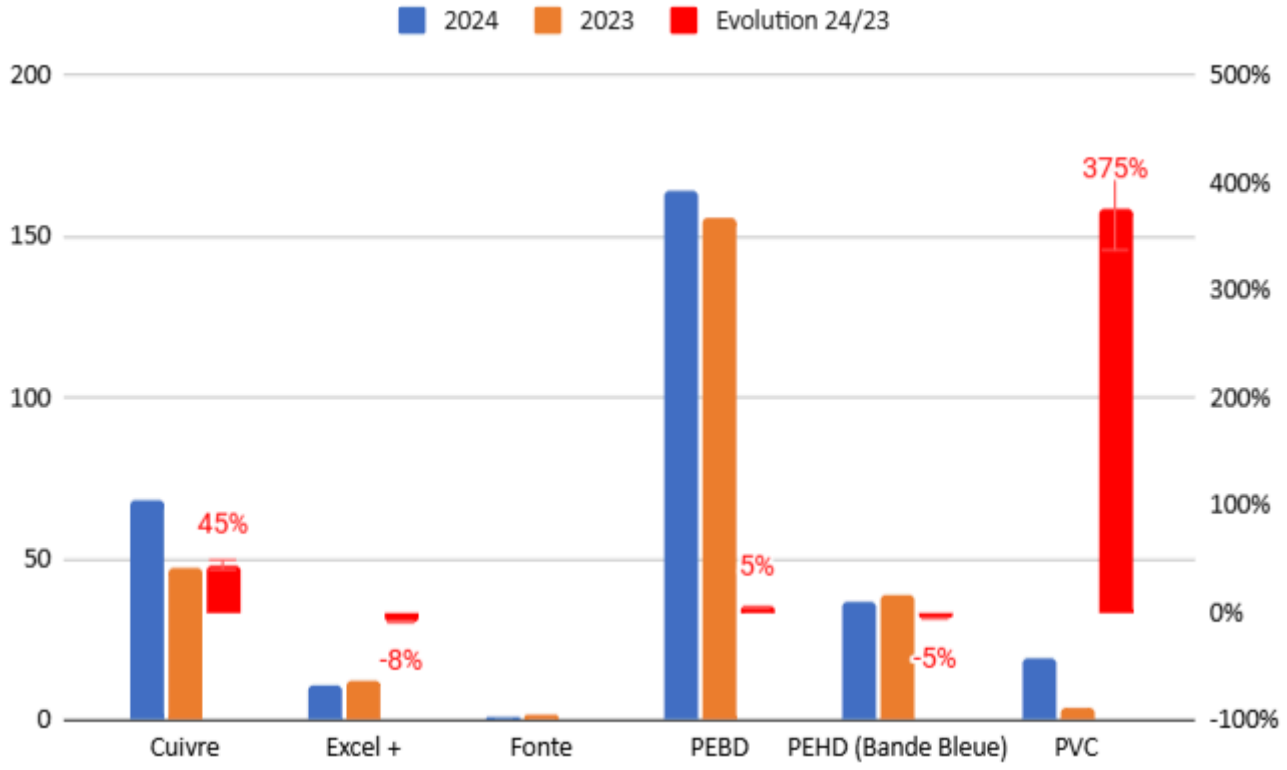

- **Les principales fuites sur l'année 2024:**

Boulevard de la Teste Fonte DN 200- Arcachon Rue du Haurat PVC DN 160+Fonte DN150 - Gujan Mestras

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Rue du Capitaine Alegre - Fonte DN200 - Arcachon Bd des Miquelots - Vanne DN100 La Teste de Buch



Rue du Port de Larros - Fonte DN100 - Gujan avenue des Chenes verts Vanne DN150 - Pyla sur Mer

Bd de l'industrie Fonte DN150 - La Teste de Buch

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

- **Avenant N°4 (renégociation quadriennale):**

Au cours de l'année 2024, en application de l'article 42 du contrat, les équipes de la SEEBAS et de la COBAS ont entrepris des négociations ayant pour objet de tirer les conséquences contractuelles de la période d'exploitation 2020-2023 et de définir les dispositions qui auront vocation à s'appliquer jusqu'au terme du contrat. Les dispositions de cet avenant quadriennal sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

2.4. Évolutions réglementaires de 2024 et à venir

Chaque année, une sélection des textes réglementaires les plus marquants de l'année vous est proposée, accompagnée des impacts susceptibles d'être significatifs pour votre service.

L'année 2024 a été marquée par la publication de textes législatifs et réglementaires particulièrement structurants, à court et moyen termes, pour les services d'eau. Vos interlocuteurs se tiennent à votre disposition pour répondre à vos différentes questions et échanger de manière approfondie sur leurs conséquences particulières pour votre service, notamment, les résultats d'analyses de qualité d'eau réalisées en 2024 sur votre service.

La Réforme des redevances des agences de l'eau

Cette réforme structurante a été adoptée dans la loi de finances de l'année 2024. Elle est effective à compter de l'année 2025 pour l'entrée en vigueur des douzièmes programmes des agences de l'eau (2025 - 2030). Plusieurs textes d'application ont été publiés en 2024 pour préciser ses modalités et son calendrier d'application.

Cette réforme supprime certaines redevances existantes : pollution non-domestique et modernisation des réseaux de collecte (usage domestique et non-domestique). De même, cette réforme acte la fin de la prime pour performance épuratoire et le doublement possible de la redevance de prélèvement sur la ressource en eau pour cause de maîtrise insuffisante des pertes en eau sur le réseau d'eau (doublement dit 'Grenelle', encadré par un décret de janvier 2012).

Dans le même temps, ces différentes suppressions s'accompagnent de nouvelles redevances :

- une redevance pour consommation d'eau potable dont devront s'acquitter les abonnés au service ;
- deux redevances auxquelles seront assujetties directement les autorités organisatrices des services publics d'eau et d'assainissement portant sur la performance des services.

Ces deux dernières redevances seront modulées au regard d'un certain nombre de critères de performance des services, à savoir :

- pour les services d'eau : le niveau des pertes en eau et la gestion du patrimoine ;
- pour les services d'assainissement : la conformité en équipement et en performance ainsi que l'effectivité de l'autosurveillance du système d'assainissement (réseau de collecte et stations d'épuration) et l'efficacité du système d'assainissement.

Les services, en tant qu'autorité organisatrice peuvent dès l'année 2025, et après délibération en 2024, reporter la contrepartie de ces deux redevances, assises sur la performance, sur une ligne spécifique de la facture des abonnés au service à travers un mécanisme de contre-valeur. Pour l'année 2025, cette

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

contre-valeur correspond au taux fixé par l'agence de l'eau multiplié par le coefficient de modulation par défaut de l'année 2025 (0,2 pour l'eau, 0,3 pour l'assainissement).

Les modulations sur performance indiquées plus haut deviendront pleinement effectives en 2026, sur la base des performances constatées au terme de l'année 2024.

Le décret 2024-787 du 9 juillet 2024 (JO du 10 juillet 2024), lui-même modifié par le décret 2025-66 du 24 janvier 2025 (JO du 25 janvier 2025), portant modifications des dispositions relatives aux redevances des agences de l'eau précise les dispositions essentielles de la réforme. Ce décret est complété par cinq arrêtés, à savoir :

- L'arrêté du 5 juillet 2024 (JO du 10 juillet 2024) modifiant l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d'eau et aux modalités de calcul de l'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau ;
- L'arrêté du 5 juillet 2024 (JO du 9 juillet 2024), lui-même modifié par l'arrêté du 20 décembre 2024 (JO du 26 décembre 2024), relatif aux modalités d'établissement de la redevance sur la consommation d'eau potable et des redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif ;
- L'arrêté du 5 juillet (JO du 7 juillet 2024) relatif au montant forfaitaire maximal de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif pris en compte pour l'application de la redevance d'eau potable et d'assainissement prévue à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales ;
- L'arrêté du 2 octobre 2024 (JO du 30 octobre 2024) modifiant l'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte et de traitement des eaux usées) ;
- L'arrêté du 23 décembre 2024 (JO du 26 décembre 2024) est venu modifier et mettre à jour l'arrêté du 13 décembre 2007 relatif aux modalités particulières de versement des redevances pour pollution d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte définies aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 du code de l'environnement pour le rendre compatible avec le nouveau cadre réglementaire encadrant désormais les redevances.

A noter qu'une instruction dédiée aux préfets, en date du 4 décembre 2024, est venue préciser les points essentiels de cette réforme des redevances sur lesquels les services de l'Etat et des collectivités locales se devaient de se mobiliser.

Enfin, cette réforme structurante des redevances s'accompagne d'une refonte des indicateurs de performance du Système d'Information des Services Publics d'Eau et d'Assainissement (SISPEA) qui était supposée aboutir durant l'année 2024.

LE REPÉRAGE DE L'AMIANTE AVANT TRAVAUX

L'arrêté du 4 juin 2024 (JO du 30 juin 2024) est venu préciser les modalités de réalisation du repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles autres que bâtis tels que les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers. Cet arrêté qui couvre les enrobés routiers et les réseaux entrera pleinement en application le 1er juillet 2026 afin de permettre au préalable la mise en œuvre des formations des opérateurs en charge de réaliser ces opérations de repérage, selon la norme NF X 46-102 de novembre 2020.
Les dispositions de cet arrêté précisent que le donneur d'ordre des travaux est tenu d'adresser au propriétaire de l'ouvrage une copie du rapport de repérage afin que ce dernier puisse mettre à jour le dossier de traçabilité.

L'arrêté précise également les conditions d'exemption de ce repérage : situation d'urgence ou lorsque les informations provenant des documents de traçabilité sont antérieurement connues.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

La prévention des endommagements de réseaux

Plusieurs fois refondue au gré des retours d'expérience, la réglementation "anti-endommagement", qui encadre depuis 2012 les travaux effectués à proximité des réseaux à risque aériens et enterrés, connaît une série d'ajustements à compter du 1er janvier 2025. A noter que le décret du 2024-1022 du 13 novembre 2024 (JO du 15 novembre 2024) et l'arrêté du 23 décembre 2024 (JO du 29/12/24) sont venus renforcer la sécurité des interventions sur les réseaux en modifiant certaines dispositions contenues dans plusieurs arrêtés relatifs à l'exécution des travaux à proximité des réseaux, notamment en matière de déclaration, d'entretien et de contrôle des infrastructures.

Les mesures à venir :

- En 2026 : Cartographie en classe A pour les réseaux sensibles : sont concernés tous les ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité implantés sur l'ensemble du territoire ainsi qu'aux ouvrages souterrains non-sensibles implantés dans des unités urbaines au sens de l'INSEE.
- En 2032 : Classe A pour la totalité des plans : sont concernés tous les ouvrages souterrains implantés sur l'ensemble du territoire.

Résilience des services et cybersécurité

Un projet de loi a débuté son parcours législatif au parlement à l'automne 2024. Ce projet inclut la transposition de deux directives européennes, à savoir, la directive européenne 2022/2557 du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques et la directive 2022/2555 du 14 décembre 2022 (dite NIS2 pour Network and Information Security). Ces deux directives modifient le champ des secteurs d'activité ou la taille des sites considérés comme entités critiques ou essentielles en y incluant notamment les services d'eau et d'assainissement.

Enfin, un rapport de l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI), publié fin novembre 2024, a pointé les risques particuliers qui pèsent sur les acteurs de l'eau et de l'assainissement en France, en recensant au moins 31 "compromissions" dans ce secteur depuis 2021.
Cette loi en cours d'adoption est donc susceptible d'impacts significatifs (financiers et/ou organisationnels) pour votre service.

Qualité de l'eau

La directive européenne 2020/2184 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (EDCH) entre désormais pleinement en vigueur.

La directive 2020/2184 du 16 décembre 2020 actualise celle de 1998. Elle "revalorise l'eau du robinet". Cette directive a été transposée en droit français à la toute fin de l'année 2022 à travers une ordonnance, deux décrets et une quinzaine d'arrêtés.

Ces textes législatifs et réglementaires ont été complétés par une note d'information de la Direction Générale de la Santé (DGS) aux ARS (note d'information N° DGS/EA4/2023/61 du 14 avril 2023, publiée le 28 avril 2023).

Cette note d'information réaffirme les points fondamentaux du cadre réglementaire promulgué fin décembre 2022 et pour partie effectif depuis le 1er janvier 2023. Notamment :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

- Elle renforce, dès le 1er janvier 2023, les normes de qualité exigées pour l'eau potable sur de nouveaux polluants, avec une obligation de résultats sur sept nouveaux paramètres qui couvrent différentes familles de substances (sous-produits de désinfection, perturbateurs endocriniens, l'uranium) et notamment la somme de 20 substances alkyl perfluorées (famille de substances communément nommées 'PFAS') à laquelle est associée une limite de qualité de 0,1 microgramme/L;
- Elle confirme que la vérification permanente de la qualité de l'eau relève de la responsabilité du service public d'eau, au travers la mise en œuvre d'un plan de surveillance conforme aux exigences de qualité en vigueur et aux vulnérabilités identifiées. Le contrôle sanitaire officiel opéré par les ARS présente un caractère strictement ponctuel et en aucun cas permanent. Ainsi, sur les sept nouveaux paramètres mentionnés plus haut, le contrôle sanitaire réalisé par les ARS sera opérationnel au plus tard le 1er janvier 2026 ;
- Elle instaure une approche de gestion préventive des risques sanitaires, qui rend obligatoires les plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) élaborés sous la responsabilité de la personne responsable de la production et de la distribution de l'eau (PRPDE). Cette approche passe par une meilleure maîtrise du patrimoine des services d'eau et la compréhension de leur vulnérabilité, avec pour objectif d'améliorer l'efficacité du plan de surveillance mentionné plus haut.

Ce nouvel enjeu de gestion préventive des risques et les dispositions qui s'y rattachent ont été rappelés dans un courrier du Directeur Général de la Santé, daté du 30 janvier 2024 adressé à l'Association des Maires de France, à Intercommunalités de France, à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) et à la Fédération Professionnelle des Entreprises de l'Eau (FP2E). Ce courrier réaffirme les échéances de juillet 2027 puis de janvier 2029 pour que les services d'eau élaborent, mettent en œuvre, évaluent et mettent à jour leur PGSSE, d'abord sur la ressource en eau puis sur la production et la distribution (seconde échéance citée).

Ce rappel survient alors **que les sujets des substances alkyl perfluorées (famille de substances communément nommées 'PFAS')**, **des métabolites de pesticide ou la présence de chlorure de vinyle monomère (instruction de la DGS aux ARS du 29 avril 2020 concernant les mesures correctives que les services doivent mettre en œuvre pour répondre à cet enjeu et, ce, sans attendre l'échéance du PGSSE "système de distribution" de janvier 2029)**, ont jalonné l'année 2024 : sur le plan législatif, réglementaire, institutionnel et, voire même, médiatique.

Ces trois sujets sont susceptibles d'évolutions majeures au cours de l'année 2025.

PFAS (ET AUTRES PARAMÈTRES NOUVELLEMENT RÉGLEMENTÉS)

Sur le plan réglementaire, l'instruction DGS/EA4/2024/30 du 12 mars 2024 (BO Santé du 29 mars 2024), est venue préciser les modalités de gestion des risques sanitaires liés à la présence de composés perfluorés (PFAS) dans les eaux destinées à la consommation humaine. Cette instruction de la DGS à destination des ARS et des Préfets précise les recommandations de gestion des situations locales de non conformités pour les PFAS dans les EDCH en réaffirmant l'obligation d'une information transparente des populations concernées (conformément à l'article R1321-30 du Code de la Santé Publique). Elle rappelle les incertitudes scientifiques concernant cette famille de substances et dresse l'état d'avancement des expertises sanitaires en cours, dont la campagne exploratoire de l'Anses sur les PFAS dans les eaux brutes et les eaux distribuées. Pour les PFAS, cette campagne exploratoire porte sur 34 composés, incluant les 20 composés dont la somme est soumise à une limite de qualité depuis le 1er janvier 2023 et des PFAS à chaîne dite "courte", aujourd'hui non réglementés en France, dont l'acide trifluoroacétique (communément nommé TFA).

Sur le plan européen, une communication de la Commission (C/2024/4910) publiée au JOUE du 7 août 2024 est venue préciser les lignes directrices techniques relatives aux méthodes d'analyse pour la surveillance des substances alkylées per- et polyfluorées (PFAS) dans les eaux destinées à la consommation humaine

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

MÉTABOLITES DE PESTICIDES : DES CRITÈRES DE GESTION TOUJOURS EN ÉVOLUTION

L'année 2024 a été marquée par la publication de trois avis de l'Anses :

- Dans deux avis publiés début mai 2024, l'Anses a confirmé le caractère pertinent du métabolite R417888 du chlorothalonil et a classé comme non-pertinent le métabolite R471811 du même chlorothalonil. Le métabolite R471811 se trouve dès lors affecté d'une norme sanitaire, considérée comme une valeur indicative, de 0,9 µg/L (et non plus une limite de qualité de 0,1 µg/L comme c'est encore le cas pour le métabolite R417888). A noter que la précédente campagne exploratoire menée par l'Anses, sous l'égide de la DGS, sur les polluants émergents susceptibles d'être présents dans les ressources en eau et les EDCH et publiée en avril 2023 avait montré la détection très fréquente du métabolite Chlorothalonil R471811 dans les eaux brutes et distribuées.
- Dans un avis publié début août 2024, l'Anses fixe les valeurs sanitaires maximales de la desphényl-chloridazone et de la méthyldesphényl-chloridazone, deux métabolites de la chloridazone confirmés comme pertinents dans deux avis de 2023 de l'Anses. Ces valeurs sanitaires maximales sont respectivement de 11 µg/L et 110 µg/L. S'agissant de deux métabolites pertinents, ils sont tous deux soumis à une limite de qualité de 0,1 µg/L qui fixe la conformité de l'eau à atteindre, le cas échéant, après une période dérogatoire de trois ans, renouvelable une fois.

Fin novembre 2024, la publication d'un rapport mené par trois inspections ministérielles (IGEDD, CGAAER et IGAS) sur la gestion des aires d'alimentation des captages a dressé un constat sévère sur la fréquence de détection des pesticides et de leurs métabolites dans les ressources en eau en proposant différentes dispositions pour la reconquête de leur qualité dont l'harmonisation européenne du classement de la pertinence / non-pertinence des métabolites de pesticide. Cette disposition a été initiée en 2024 par la Commission avec l'appui scientifique de l'OMS dont les travaux sont attendus en 2025.

Enfin, dans le cadre de la transposition de la directive européenne sur la qualité des EDCH, il est prévu qu'un arrêté interministériel vienne préciser la définition des captages sensibles aux pollutions diffuses d'origine agricole ou industrielle. Pour les captages qui seront considérés comme sensibles, les services en charge de la production de l'eau devront assumer de facto la compétence de préservation de la ressource en eau et bénéficieront pour cela du soutien des autorités publiques (préfets) afin de mettre en œuvre des plans d'actions adaptés. La publication de ce texte réglementaire très attendu par de nombreux services d'eau est susceptible de survenir durant l'année 2025.

2.5. INCONTOURNABLES POUR 2025

2.5.1. PROPOSITIONS ET AMÉLIORATIONS ATTENDUES

Le tableau ci-joint liste les propositions et améliorations à mettre en œuvre sur le service de la COBAS concernant le patrimoine et l'exploitation des ouvrages :

Nom Installation	Constat et Appréciation	Propositions d'amélioration	Commentaires
CABARET DES PINS	Le bâtiment du forage n'est pas étanche, et nécessite une sécurisation plus appropriée	Mettre un capotage coulissant	La mise en place d'un caisson coulissant, déjà installé sur d'autres sites de la COBAS permettrait de résoudre cette problématique.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

CABARET DES PINS	4 des 6 pompes de la bâche 1000 de type forage permettant le refoulement de l'eau distribuée vers les 3 réservoirs de tête ne peuvent pas être remplacées sans vidange de la bâche 1000.	Sortir les pompes de l'ouvrage et réaliser un bâtiment annexe.	Ces travaux structurants ont été intégrés dans le fond de sécurisation "travaux bâche 1000" par avenant. Ils sont planifiés à partir du second semestre 2025 et 1er trimestre 2026
CABARET DES PINS	L'étanchéité intérieure de la bâche 1000 est dégradée	Refaire l'étanchéité de l'ouvrage Modifier le système de pompage	Ces travaux structurants ont été intégrés dans le fond de sécurisation "travaux bâche 1000" par avenant. Ils sont planifiés à partir du second semestre 2025 et 1er trimestre 2026
CABARET DES PINS	Sécurisation des armoires électriques, locaux présentant un risque inflammable.	Installations de détecteurs incendie sur sites de production et paramétrage alarmes dans la télégestion (présence de détecteurs à minima sur sites avec armoires électriques, produits inflammables,)	A prévoir à court terme par la collectivité
CABARET DES PINS	Renforcer la sûreté des sites de production et de stockage,	Installation de clés électroniques, vidéoprotection avec barrières infrarouges, clôtures rigides	A prévoir à moyen terme par la collectivité (vigipirate renforcé) et face à la multiplication des actes de malveillance sur les installations de production (graffitis, vols) présentés dans les faits marquants du Rad 2023
CABARET DES PINS	Mise en place de 6 variateurs de vitesse sur les pompes de reprise et d'un variateur sur la pompe de forage		Ces travaux structurants ont été intégrés dans le fond de sécurisation "travaux bâche 1000" par avenant. Ils sont planifiés à partir du second semestre 2025 et 1er trimestre 2026
EXHAURE CAZAUX LAC	Absence de détecteurs fumée et système d'extinction automatique	Mise en place de détecteurs incendie + système d'extinction incendie par gaz et système d'aspersion autour du bâtiment	A prévoir à moyen terme par la collectivité en lien avec le retex incendie de 2022
GOLF	Fissures et cloques apparentes sur le toit de la bâche 5000 ainsi que sur le revêtement intérieur	Refaire l'étanchéité	Un diagnostic de l'étanchéité du toit serait à réaliser pour évaluer les travaux à entreprendre
PISSENS	Traces humidité suite à réfection sur les bâches 5000 et 2x500	Réalisation d'un diagnostic de l'état des revêtements intérieurs	Travaux à la charge de la COBAS sauf si la garantie décennale de l'entreprise en charge des travaux peut être mise en jeu
PISTE 214	Fissure apparente sur la poutre de soutènement	Renfort de la poutre à faire	Un diagnostic plus précis serait à faire de l'état de cette poutre et des raisons

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

	local électrique => risque affaissement		de cette fêlure, afin de déterminer les travaux à prévoir et leur prise en charge
PISTE 214	Régulation instable et nombreux démarrage des pompes	Mise en place d'un ballon de régulation	le ballon neuf en 2022 correspond au remplacement à l'identique, dans l'attente d'une étude plus poussée pour un redimensionnement complet de l'installation
HAMEAUX DES BARONS	Régulation instable et nombreux démarrage des pompes	Mise en place d'un ballon de régulation	dans le cadre d'une amélioration du système de pompage, l'ajout d'un ballon éviterait le vieillissement prématuré des réseaux d'eau potable. moins de risque de coup de bélier lors des démarrages des pompes surpressées). A ce stade, pas de recrudescence de fuites sur ce secteur
LA HUME	Mise en place de 4 variateurs de vitesse sur les pompes de reprise et de 2 variateurs sur les pompes de forage		La mise en place de variateurs sur les pompes n'ont pas été intégrés dans l'avenant 4. Il est prévu de renouveler 2 pompes de forage et 1 pompe sur la distribution jusqu'à la fin du contrat dans le cadre du renouvellement. L'ajout de variateurs dans le cadre d'amélioration hydraulique et énergétique de ce site sur les pompes de distribution reste en suspens et devra être étudié avec les services de la COBAS;
LA HUME	Nombreux démarrages des pompes de transfert vers Passerelle et La Teste avec à-coups hydrauliques	Mise en place de démarreurs ou variateurs sur chaque départ	La mise en place de variateurs sur les pompes n'ont pas été intégrés dans l'avenant 4. Il est prévu de renouveler 2 pompes de forage et 1 pompe sur la distribution jusqu'à la fin du contrat dans le cadre du renouvellement. L'ajout de variateurs dans le cadre d'amélioration hydraulique et énergétique de ce site sur les pompes de distribution reste en suspens et devra être étudié avec les services de la COBAS;
CAPLANDE	Arrêt total du site à chaque opération de manutention car forage 1 sous ligne 20 kV et obligation de coupure	Demander à EDF de déplacer la ligne	Dans le cadre de travaux sur la pompe de forage1, la présence d'une ligne de 20000 V nécessite l'arrêt de la ligne RTE nécessitant une programmation des travaux en lien avec RTE; impacts sur les travaux d'urgence
CAPLANDE	Mise en place de 2 variateurs de vitesse sur les pompes de reprise		La mise en place de variateurs sur les pompes n'a pas été intégré dans l'avenant 4. Il est prévu de renouveler 1 pompe sur la distribution jusqu'à la fin du contrat dans le cadre du renouvellement. L'ajout de variateurs dans le cadre d'amélioration hydraulique et énergétique de ce site sur les pompes de distribution reste en suspens et devra être étudié avec les services de la COBAS;
LIBERATION		Pose d'un lambris pour terminer cette réhabilitation	Les travaux du plafond n'ont jamais été réalisés (laine de verre apparente).

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

LIBERATION	Clôture souple endommagée derrière local désinfection	Remplacement par clôture rigide	Dans le cadre de l'amélioration de la protection des sites de production, les clôtures devraient être conformes aux recommandations de l'ARS;
DESBIEY	Arrivée d'eaux pluviales dans l'ouvrage lors de fortes précipitations et impossibilité de vider le puisard	Reprendre exutoire du puisard	Depuis la création des résidences à proximité, nécessité de faire un puisard pour supprimer le risque de détérioration des conduites et équipements lors de fortes précipitations ; vu avec les services de la COBAS et promoteur
DESBIEY	Génie Civil à reprendre	Démolir le génie civil actuel et mettre un capotage avec petit local comprenant l'armoire électrique et variateur	Embellissement du site, qui se trouve au milieu de la résidence. Plainte du syndic. Services de la COBAS informés avec réunion sur site avec le promoteur
CAONE	Joint de dilatation extérieur entre la bâche et le local pompe non étanche et dégradation prématurée des équipements liés à l'atmosphère	Joints à refaire	Travaux débutés en 2024, déplacement fuite derrière armoire électrique, dans le cadre de la décennale et suivi par la COBAS
VILLEMARIE	Apparition de cloques au niveau du revêtement intérieur du réservoir malgré une réfection récente	Reprise étanchéité, garantie décennale	Apparition de cloques au niveau du revêtement intérieur du réservoir malgré une réfection récente

Certaines opérations, en particulier sur l'unité de Cabaret (bâche 1000), ont été planifiées au second semestre 2025.

- **Plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau :**

L'élaboration du Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire de l'Eau (PGSSE) doit être lancé en 2025 en complément du schéma directeur afin d'identifier, d'évaluer et de maîtriser les risques sanitaires liés à la production et à la distribution d'eau potable

Il sert à :
1) Garantir la qualité de l'eau du captage jusqu'au robinet du consommateur,
2) Prévenir les contaminations et incidents potentiels,
3) Mettre en place des mesures de surveillance et de contrôle,
4) Définir des actions correctives en cas de problème,
5) Améliorer en continu le système de production et de distribution d'eau,
6) Assurer une meilleure transparence vis-à-vis des usagers. C'est une démarche préventive qui vise à sécuriser l'approvisionnement en eau potable.

- **La réforme des redevances des agences de l'eau**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

La réforme des redevances des agences de l'eau qui entre en vigueur en 2025 se traduit par la mise en place d'une redevance de performance des réseaux d'eau potable à laquelle la collectivité est assujettie, et dont le montant pourra être largement minoré (jusqu'à 80%) en fonction de la performance de vos réseaux.
L'introduction du critère de performance sera progressive :

- Pour la redevance 2025 qui fera l'objet d'une déclaration et d'un paiement en 2026, le coefficient de modulation a été fixé forfaitairement par voie réglementaire à 0,2;
- à partir de la redevance 2026 qui sera déclarée et payée en 2027, le coefficient de modulation réel sera pris en compte, sur la base des données techniques 2024.

La performance prise en compte dans le calcul de la redevance porte sur deux domaines principaux : la performance du réseau (réduction des pertes) et la connaissance du patrimoine.

Dans ce cadre, certains tronçons sont assez dégradés et génèrent régulièrement des fuites qui peuvent pénaliser la bonne distribution de l'eau aux usagers.

Il est nécessaire de procéder à certains renouvellements avec des niveaux de priorités.

Commune	Propositions d'amélioration sur le réseau
Gujan-Mestras	Renouvellement conduite et branchements à court terme : ***Priorité 1*** - Port de Larros (conduite fonte DN 100) Allée de la Pelouse - Allée des Fauvettes
La Teste de Buch	Renouvellement conduite et branchements à court terme : - Rue du pdt coty
Arcachon	Renouvellement conduite et branchements à court terme : ***Priorité 1*** - Av Général Berdoulat - Rue Fustel de Coulange - Antenne alimentant le cabinet médical - Arcachon Marine (Présence de fer)
COBAS	Renouvellement des réseaux amiantés: ***Priorité 2***
Réseaux structurants en DN 500	Matériaux fragiles et difficilement réparable : ***Priorité 2*** - (Bonna et fonte grise)

Nous nous rapprocherons de vos services afin d'étudier les projets, travaux, ou prestations qui vous permettront dans la durée de sécuriser le meilleur niveau de performance permettant de minorer le montant de la redevance à laquelle vous serez assujettis.

2.5.2. Focus sur la sécurité opérationnelle

La sécurité de nos personnels, des riverains et d'éventuels visiteurs des installations est une absolue nécessité pour votre service d'eau.

SEEBAS dispose d'une culture Sécurité forte, animée et organisée autour de Standards Sécurité, qui nous permettent de hiérarchiser les axes de travail.
Notre politique de prévention nous amène donc à régulièrement réévaluer le niveau de sécurité des installations que vous nous avez confiées, vérifier leur adéquation à la réglementation, et prendre en compte les retours d'expérience que nous avons sur d'autres installations. Cette politique permet de répondre à toute intervention possible de l'Inspection du Travail qui mettrait en évidence le caractère accidentogène de vos installations, et en chercherait alors la responsabilité.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

La sécurisation des installations signalées non conformes suite à des audits, contrôles réglementaires ou par nos équipes d'interventions ou managers peut nécessiter des remises à niveau qui relèvent de votre responsabilité de Maître d'Ouvrage.

Les non-conformités identifiées sur vos installations sont les suivantes :

Nom Installation	Constat et Appréciation	Propositions d'amélioration	Commentaires
LIBERATION	Les marches de l'escalier d'accès au haut de la cuve sont dangereuses (non conforme)	Remplacement de l'escalier	L'escalier présent montre des points de corrosion avec des marches non réglementaires nécessitant son renouvellement complet.
PASSERELLE	Dégradation du revêtement extérieure du réservoir	Etude de structure à réaliser et sécuriser autour du site.	Les chutes de crépis sont toujours d'actualité, pouvant entraîner un risque important pour le personnel d'exploitation et pour toute personne située à proximité sur l'espace publique

A noter qu'en 2021, des fissures extérieures avec chutes de crépis sur le réservoir de Passerelle ont été constatées. Cette situation perdure et nécessite des travaux de réfection à court terme.

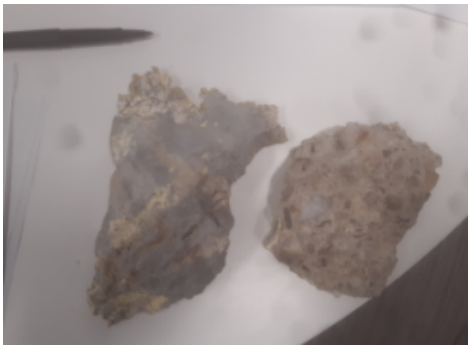

Nous sommes à votre disposition pour vous exposer les travaux à réaliser destinés à réduire les risques au sein de ces installations, et nous nous rapprocherons de vous pour la planification de ces travaux.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

3. BILAN ET PERSPECTIVES DU SERVICE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Ce chapitre vous présente une synthèse du bilan de l'activité de l'année 2024 et des perspectives de votre contrat.

L'ensemble des données chiffrées et factuelles pour évaluer la qualité et la performance du service rendu sont disponibles en partie 5 – Données détaillées.

3.1. Bilan hydraulique

3.1.1. Evolution des volumes vendus

	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
Volume vendu selon le décret (m3)	**5 678 068**	**5 745 269**	**5 941 077**	**5 492 710**	**5 268 740**	**-4,1%**
Sous-total volume vendu aux abonnés du service	**5 678 068**	**5 745 269**	**5 941 077**	**5 492 710**	**5 268 740**	**-4,1%**
domestiques ou assimilés	5 675 949	5 743 330	5 938 981	5 490 710	5 266 525	-4,1%
non domestiques	2 119	1 939	2 096	2 000	2 215	10,8%
Volume vendu à d'autres services d'eau potable	**0**	**0**	**0**	0	0	0

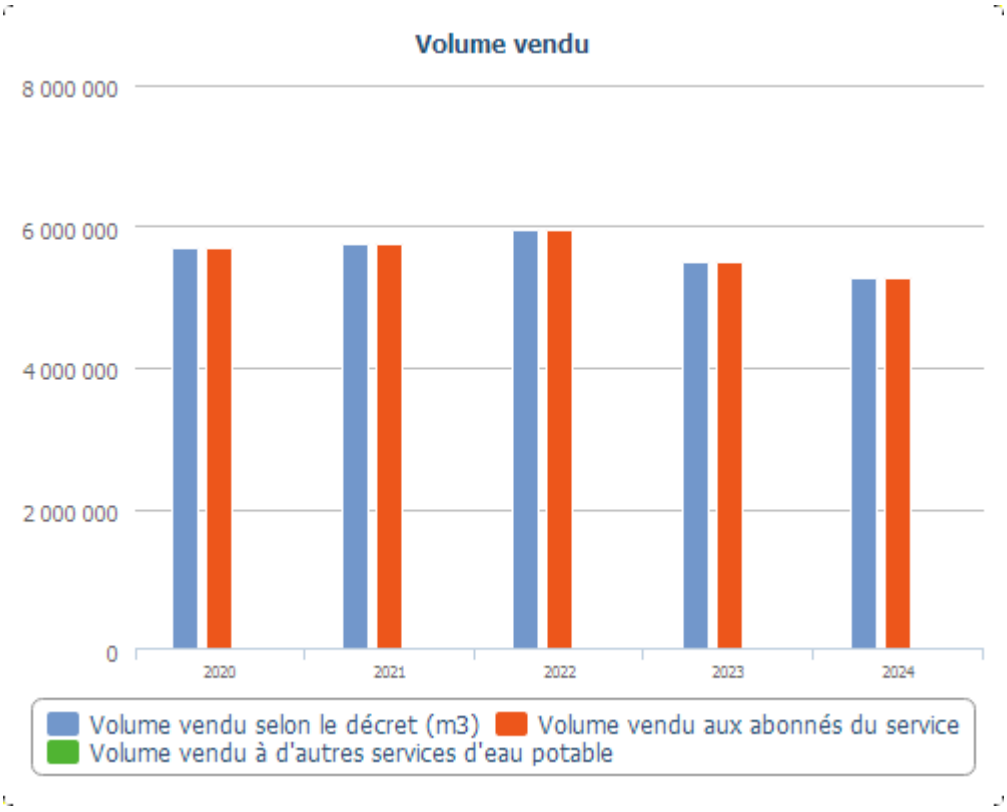

3.1.2. Performance du réseau

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

RENDEMENT RÉSEAU

→ Synthèse des flux de volumes

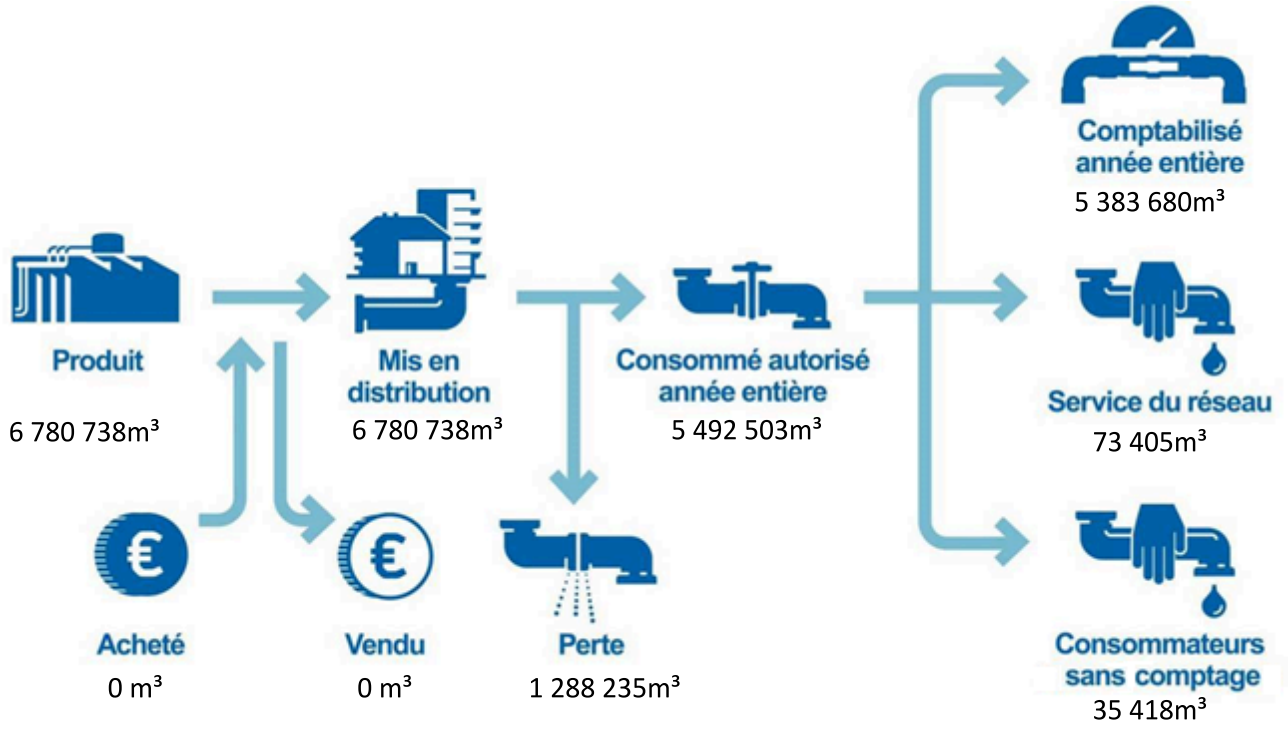

Année	Rdt (%)	Objectif Rdt Grenelle 2 (%)	ILP (m³/j/km)	ILVNC (m³/j/km)	ILC (m³/j/km)
2024	81,0	69,43	5,19	5,63	22,14

	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
Rendement du réseau de distribution (%) (A+B)/(C+D)	**85,5 %**	**87,6 %**	**86,0 %**	**82,5 %**	**81,0 %**	**-1,8%**
Volume consommé autorisé 365 jours (m3) . . . . A	6 018 411	6 140 230	6 258 247	5 774 344	5 492 503	-4,9%
Volume vendu à d'autres services (m3) . . . . B	0	0	0	0	0	
Volume produit (m3) C	7 041 810	7 009 551	7 279 919	6 995 952	6 780 738	-3,1%
Volume acheté à d'autres services (m3) . . . . D	0	0	0	0	0	

Selon les prestations assurées dans le cadre du contrat, certains termes de la formule peuvent être sans objet. Ils ne sont alors pas affichés dans le tableau
(A = Volume consommé autorisé 365 jours ; B = Volume vendu à d'autres services ; C = Volume produit ; D = Volume acheté à d'autres services)
Calcul effectué selon la circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

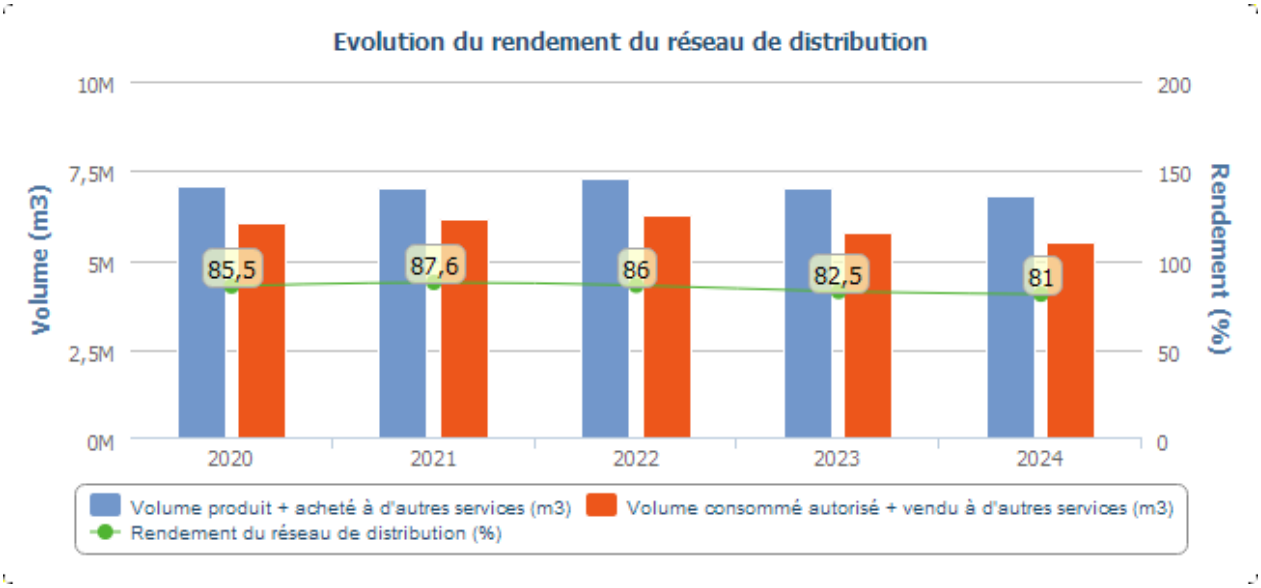

L'annexe complémentaire au RAD analyse l'évolution du rendement de réseaux afin de mettre en place un plan d'actions.

TRAVAUX RÉALISÉS

La COBAS a renouvelé 3 890 ml de canalisation et 146 branchements au cours de l'année 2024.

COMMUNE	RUE	NATURE DES TRAVAUX	linéaire	branchements
Arcachon	Rue Grenier	Renouvellement de 80 ml de canalisation en fonte DN 100 mm et réhabilitation d'1 branchement DN 40	80	1
Arcachon	Rue Jules Verne	Renouvellement de 210 ml de canalisation en PVC DN 110 mm et réhabilitation de 24 branchements DN 25	210	24
Arcachon	Rue Raymon Lacau	Renouvellement de 65 ml de canalisation en PVC DN 200 mm et réhabilitation de 1 branchements DN 50	65	1
Gujan Mestras	Rue Edmond Daubric	Renouvellement de 340 ml de canalisation en fonte DN 100 et réhabilitation de 14 branchements DN 25, 1 branchement DN 32, 3 branchements DN 40 et 3 branchements DN 50	340	21
Gujan Mestras	Allée de la Mule	Renouvellement de 340 ml de canalisation en fonte DN 100 et réhabilitation de 8 branchements DN 25 et 2 branchements DN 32	340	10
Gujan Mestras	Avenue Sainte Marie	Renouvellement de 460 ml de canalisation en fonte DN 100 et reprise des branchements existants précédement réhabilités	460	0
Gujan Mestras	Allée Marc Nouaux	Renouvellement de 280 ml de canalisation en PVC DN 110 et reprise des branchements existants précédement réhabilités	280	0
Gujan Mestras	Route des Lacs	Renouvellement de 580 ml de canalisation en fonte DN 150 et réhabilitation de 39 branchements DN 25 et 6 branchements DN 32	580	45
Gujan Mestras	Avenue de la Gare / Allée des Fauvettes	Renouvellement de 450 ml de canalisation en fonte DN 100 et réhabilitation de 13 branchements DN 25, 1 branchement DN 32, 2 branchements DN 40 et 1 branchement DN 50	450	17
La teste de Buch	Allée Ventose	Renouvellement de 100 ml de canalisation en PVC DN 110 mm et réhabilitation de 1 branchement DN 25 et 2 branchements DN 32	100	3
La teste de Buch	Rue du Président Carnot	Renouvellement de 495 ml de canalisation en fonte DN 150. La réhabilitation des branchements est réalisée sur l'excercice 2025.	495	0
La teste de Buch	Place Jean Hameau	Renouvellement de 85 ml de canalisation en fonte DN 150 et réhabilitation de 5 branchements DN 25 et 3 branchements DN 32	85	8
La teste de Buch	Allée du Bois de Rome	Renouvellement de 250 ml de canalisation en PVC DN 110 mm et réhabilitation de 16 branchements DN 25	250	16
Le Teich	Chemin de Guignol	Renouvellement de 155 ml de canalisation en PVC DN 110 mm	155	0

Dans le cadre contractuel, la SEEBAS a renouvelé 482 branchements dont 58 suite à fuite en lien avec les opérations de voirie des quatre communes :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

3.1.3. SUJETS À ENGAGER PENDANT LE CONTRAT

La préservation de la ressource en eau passe par la bonne performance de vos réseaux, qui est désormais un critère incitatif dans le calcul des nouvelles redevances performance des réseaux d'eau potable introduites en 2025 et auxquelles les collectivités sont assujetties.

SEEBAS vous propose des solutions adaptées pour mieux répondre à ces défis, que ce soit notamment dans le domaine du comptage des eaux actuellement non comptées, ou dans l'équipement des réseaux de solutions de surveillance (capteurs de fuite ou de phénomènes transitoires) ou de réduction de la pression.

SOLUTIONS DE MESURE DES EAUX ACTUELLEMENT CONSOMMÉES SANS COMPTAGE

L'optimisation du montant de la redevance de performance des réseaux d'eau potable à laquelle vous serez assujettis à partir de 2025 passera notamment par un comptage des eaux actuellement non comptées.

Comptage des eaux utilisées pour les chantiers : Mobil'Eau

Ce dispositif innovant de comptage mobile, mis au point en exclusivité par Veolia, permet la régularisation d'un approvisionnement temporaire en eau (chantiers...).

Mobil'eau permet de :

- comptabiliser et enregistrer la consommation d'eau ;
- utiliser les données pour la facturation ou le service.

Les entreprises récupèrent les mallettes directement dans nos locaux avant le démarrage de leur chantier, et les restituent en fin de chantier. A chaque fois qu'ils croisent une entreprise de travaux, les techniciens communiquent sur Mobil'eau pour mieux faire connaître le dispositif.

La SEEBAS va généraliser l'utilisation de ces Mobil'eau sur l'ensemble des chantiers sur le territoire, en particulier tous les travaux de voirie nécessitant une prise d'eau. Une communication auprès des donneurs d'ordre va être effectuée en 2025 accompagnée d'un volet répressif pour tout vol d'eau.

La surveillance des volumes Incendie : Apilink

Les poteaux incendie du territoire présentent un double risque pour le service :

- la **non-comptabilisation des volumes utilisés** : en effet, ils ne disposent pas de systèmes de comptage, bien qu'étant sous pression d'eau permanente et alimentés par le réseau d'eau public ;
- des **impacts potentiellement sévères sur les réseaux en cas d'utilisation illicite** par des personnes non compétentes :
  - fragilisation des canalisations par la génération de phénomènes transitoires, notamment lors des opérations de fermetures brusques des poteaux ;
  - pollution des réseaux : les poteaux incendie n'ont pas de clapet anti-retour ;
  - dégradation de la qualité de l'eau, les survitesses engendrées par les tirages favorisant le décrochage et la mise en suspension de particules en réseau.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Ces dispositifs de surveillance connectés détectent l'ouverture et la fermeture des poteaux, et calculent les volumes consommés.

Grâce à APILINK, la collectivité bénéficie d'une meilleure connaissance du patrimoine et des comportements.

300 Apilink sont déployés sur le territoire de la COBAS soit 20% du parc incendie.

Les résultats montrent une utilisation très importante sur certains hydrants avec des volumes non négligeables.

SEEBAS est à la disposition de la COBAS pour augmenter le parc d'APILINK . Une sensibilisation des collectivité sera menée en 2025 pour limiter ces prises d'eau non comptabilisées sur les PI et BI non équipés.

Exemple de prises d'eau sur Arcachon :

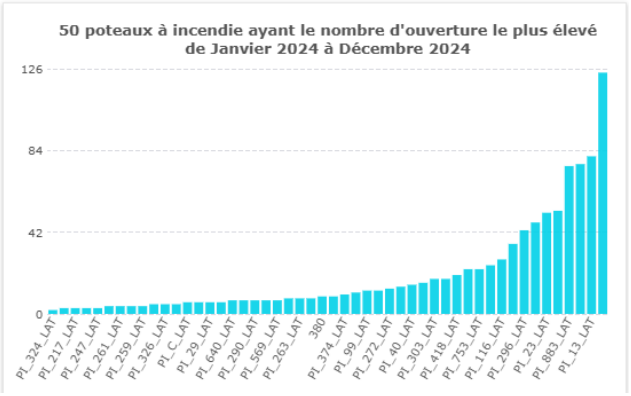

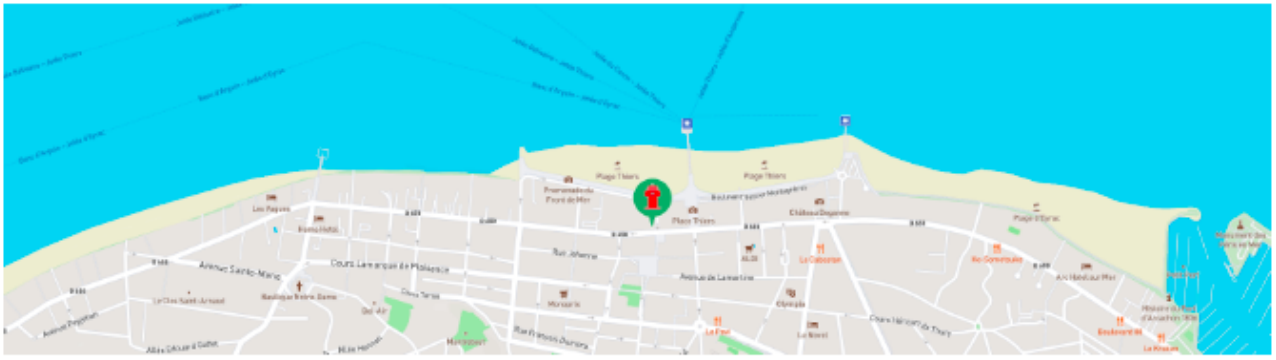

246 OUVERTURES / Bd promenade Marcel Gounouillou 25 m3/mois avec un pic en avril de 65 m3/mois en avril

SURVEILLANCE DES RÉSEAUX POUR PRÉSERVER LA RESSOURCE ET LE PATRIMOINE

Pilotage par la réduction de la pression de distribution

La modulation des pressions constitue un moyen d'action imparable pour protéger les réseaux.
L'enjeu est de maintenir la pression la plus basse possible dans le temps sans jamais impacter l'usager.
Plus le pilotage est fin, plus les économies réalisées sont importantes, grâce à la baisse des fuites.
En réduisant la pression interne des canalisations, la durée de vie du patrimoine est très nettement augmentée.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

- Une expérimentation a été testée sur le réseau surpressé du Pyla en période hivernale 2024, avec une baisse sensible des débits min des deux secteurs surpressés.

Mieux détecter les fuites

Pour améliorer la performance du réseau, il est essentiel de réduire au maximum le délai entre l'apparition et la détection des fuites.
Pour ce faire, SEEBAS vous propose de déployer à titre expérimental sur une zone la plus fuyarde, un nouveau type de compteurs à ultrasons innovants **Kamstrup**. Ils détectent les fuites sur le branchement en amont du compteur.

Cette solution révolutionnaire offre une mise sous surveillance des branchements optimisant ainsi le programme de renouvellement.

Avec la capacité de détecter les fuites sur les branchements dès leur apparition, la politique de renouvellement devient plus fine et plus crédible.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

3.2. Bilan qualité de l'eau

La transposition, fin 2022, de la nouvelle directive européenne sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine a renforcé la responsabilité des collectivités, notamment dans la gestion préventive des risques. Ceci se traduit par l'obligation de réaliser un PGSSE et de mettre en œuvre une surveillance de la qualité de l'eau depuis la ressource jusqu'au robinet du consommateur. Par ailleurs, quelques seuils réglementaires ont été modifiés et de nouveaux paramètres ont été ajoutés (dont les paramètres de vigilance et les PFAS) qui intégreront le programme d'analyses réalisé dans le cadre du contrôle sanitaire en 2026.

C'est dans cet esprit que nous vous avons incité, dès 2023, à mesurer de nouveaux paramètres sujets à caution, pour lesquels des laboratoires proposent des analyses COFRAC, tels que des métabolites de pesticides (chlorothalonil R471811 et R417888) et les nouveaux paramètres réglementés (somme de 20 PFAS, chlorates, somme de 5 acides haloacétiques, 17-bêta-estradiol, bisphénol A, uranium). Ceci, en complément des analyses déjà réalisées dans le cadre du contrôle réglementaire exercé par l'Agence Régionale de Santé et de la surveillance réalisée par l'exploitant.

Le métabolite du chlorothalonil, R471811, a changé de statut en début d'année 2024, il a été déclaré non pertinent par l'autorité sanitaire. A ce titre, il n'est donc plus considéré comme une limite de qualité mais comme une valeur indicative. Dans les tableaux précédents, sa conformité a été évaluée par rapport au seuil de 0,9 µg/L (valeur indicative) pour l'ensemble de l'année.

Focus CVM : A ces campagnes d'analyses peuvent s'ajouter la recherche ponctuelle de chlorure de vinyle monomère (CVM), un composé cancérigène, contenu dans les parois de certaines canalisations en PVC produites avant 1980. Cette recherche, dont la responsabilité a été transférée à la collectivité dans l'instruction de la Direction Générale de la santé DGS/EA4/2020/67, intervient sur les canalisations ayant été identifiées comme "à risque" lors de l'étape de repérage selon les critères de cette instruction.

14 prélèvements ont été réalisés en 2024 pour mesurer les CVM et toutes les mesures sont très inférieures au seuil de 0.5 µg/L. La répartition par commune est détaillée dans le tableau ci-dessous.

	2024
Nombre de prélèvements CVM	
Arcachon	**3**
Gujan Mestras	3
La Teste de Buch	5
Le Teich	3

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Vous trouverez ci-dessous, un bilan synthétique de la qualité de l'eau de votre commune évaluée au regard des seuils réglementaires de qualité :

- **limites de qualité :** paramètres susceptibles de générer des risques immédiats ou à plus long terme sur la santé du consommateur ;
- **références de qualité :** valeurs cibles établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau potable. Un dépassement ne traduit pas forcément un risque sanitaire pour le consommateur mais, néanmoins, implique aussi la mise en œuvre d'actions correctives ;
- **valeur de vigilance :** substances qui pourraient poser un risque pour la santé selon une liste établie sur le plan européen ;
- **valeur indicative :** seuils d'action établis pour permettre la gestion de substances présentes dans l'eau, ils ne concernent, à ce jour, que des métabolites de pesticides ayant été déclarés non pertinents.

Des résultats plus détaillés sont proposés en partie 5.3 de ce document.

Tableau synthétique de la conformité des prélèvements

Limite de qualité	Contrôle Sanitaire		Surveillance du Délégataire		Contrôle sanitaire et surveillance du délégataire	
	Nb PLV total	Nb PLV conformes	Nb PLV total	Nb PLV conformes	Nb PLV total	Nb PLV conformes
Microbiologique	227	227	166	166	393	393
Physico-chimie	62	62	88	88	150	150

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

Tableau de conformité des paramètres analytiques

	Contrôle sanitaire		Surveillance par le délégataire	
	Nb total de résultats d'analyses	Conformité aux limites / Respect des Références	Nb total de résultats d'analyses	Conformité aux limites / Respect des Références
Paramètres soumis à Limite de Qualité				
Microbiologique	454	454	330	330
Physico-chimique	3417	3417	858	858
Paramètres soumis à Référence de Qualité				
Microbiologique	843	841	662	651
Physico-chimique	2500	2460	1507	1476
Paramètres soumis à une valeur de vigilance				
Physico-chimique			10	10
Paramètres soumis à une valeur indicative				
Physico-chimique	113	113	48	48
Autres paramètres analysés				
Microbiologique				

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Physico-chimique			10	

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

VERS UN RENFORCEMENT DE LA QUALITÉ DE L'EAU

En tant que personne responsable de la production et distribution de l'eau (PRPDE), il vous revient de procéder au plus vite à la remise en conformité de la qualité de l'eau potable auprès de la population.

Les solutions de réduction de la pollution à la source sont, de toute évidence, les plus pertinentes à long terme, nous les mettons déjà en œuvre sur plusieurs territoires en France. Nous sommes à votre disposition pour vous en parler pour un déploiement sur votre territoire, cependant, ces solutions de réduction à la source sont inefficaces sur le court-moyen terme.

Afin de vous accompagner pour instaurer le retour à la conformité dans les plus brefs délais, nous vous proposons d'étudier au plus vite la capacité de traitement de ces paramètres non conformes au travers d'une étude Diabolo®. Cette étude vous permettra de trouver le meilleur compromis technico-économique pour éliminer ces composés de votre ressource en prenant en compte ses caractéristiques propres. Un résultat personnalisé peut ainsi être proposé dans les 2 mois.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

3.3. Bilan énergie

3.3.1. Consommation d'énergie à l'échelle du service

	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)	**4 457 957**	**4 321 783**	**4 547 679**	**4 361 162**	**4 034 264**	**-7,5%**
Surpresseur	180 969	158 665	158 754	144 998	146 053	0,7%
Installation de reprise	129 485	149 594	141 635	125 417	52 435	-58,2%
Installation de captage	395 213	384 962	399 046	419 494	434 811	3,7%
Installation de production	3 752 290	3 628 562	3 848 244	3 671 253	3 400 965	-7,4%

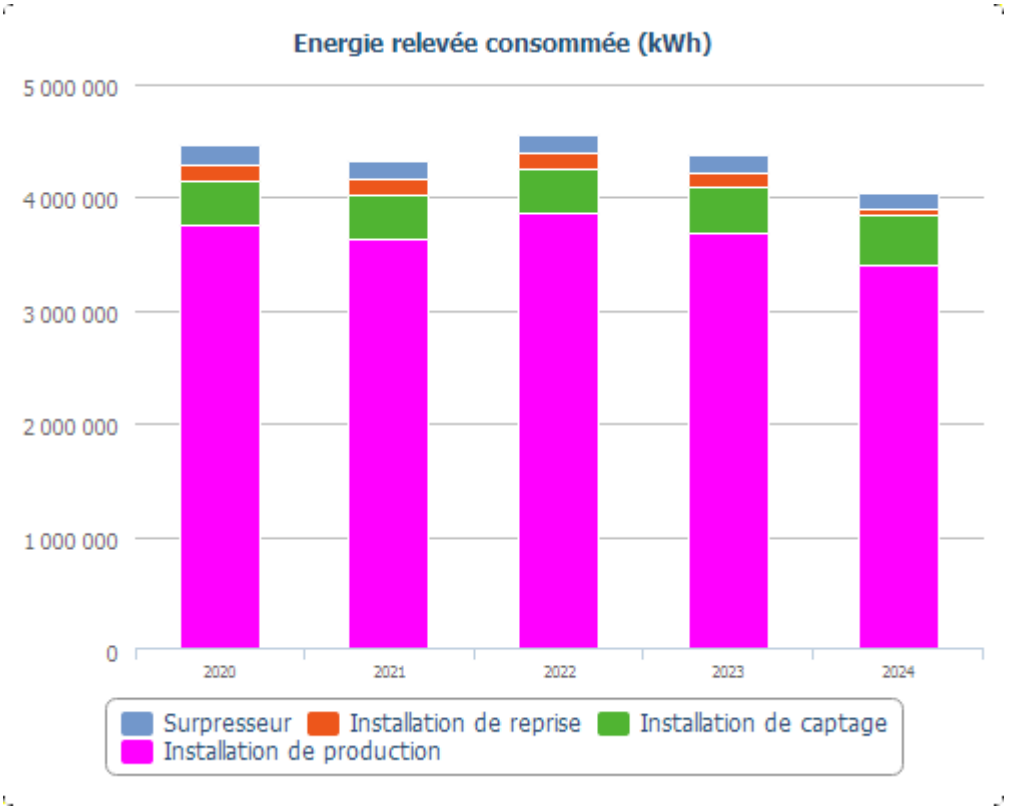

3.3.2. Sujets à engager pendant le contrat

L'amélioration du bilan énergétique du service passe soit par la réduction des consommations, soit par la production locale d'énergie.

Réduire ses consommations énergétiques

Veolia Eau France est certifiée ISO 50 001 pour son système de management de l'énergie.
Dans ce cadre, un plan d'actions national 2024-2027 fixe des objectifs de gains énergétiques en fonction de différents leviers actionnables.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Ainsi, après étude de chacun de ces leviers, des actions sont menées si elles s'avèrent utiles et favorables à l'environnement. Cela peut concerner le renouvellement de pompes ou des optimisations de pilotage des installations.
Les actions menées pour l'amélioration du rendement de réseau permettant également de réduire les consommations énergétiques.

Au-delà des actions classiques d'optimisation énergétique, le marché de l'électricité est de plus en plus dynamique et volatile.

Votre contrat bénéficie de tarifs négociés par nos services, de notre expertise sur la flexibilité électrique.

PRODUIRE DES ÉNERGIES LOCALES POUR MAÎTRISER SES COÛTS D'ÉNERGIE ET RÉDUIRE SON EMPREINTE CARBONE

Comme pour la réduction des consommations énergétiques, Veolia Eau France est votre partenaire pour saisir les opportunités de production d'énergies renouvelables et locales.

La mise en place d'une centrale solaire, c'est une énergie :

- compétitive sans subvention partout en France ;
- locale, bas carbone et décentralisée ;
- qui réduit le risque d'exposition au marché de gros et rend le service plus résilient et indépendant des énergies fossiles.

C'est un projet concret et exemplaire qui s'inscrit dans les ambitions de transition énergétique portées dans le PCAET.

Une centrale solaire couplée à un fonctionnement sur les heures solaires (8h - 18h) permet de produire jusqu'à 25% de la consommation des sites. Veolia vous accompagne sur l'ensemble de cette chaîne de valeur.

TRAVAUX DE SÉCURISATION DE L'APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE

Le groupe électrogène prévu sur l'usine de Cabaret dans le fond de sécurisation devra être reprogrammé à moyen terme. L'avenant 4 a modifié les dépenses du fonds de sécurisation pour intégrer en priorité les travaux de la bâche 100.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

3.4. Gestion de votre patrimoine

3.4.1. Bilan

Evolution du périmètre du contrat

En 2024, il n'y a pas eu d'évolution de périmètre sur le contrat de la COBAS .

Principales interventions / opérations de renouvellement effectuées

Les principales opérations de renouvellement en 2024 concernent le comptage (compteurs abonnés, débitmètre de sectorisation et d'eau traitée sur les départs usine (Golf, Étoile et Pissens), le process de l'usine de Cabaret avec le renouvellement des filtres bi-couches de CAG et la poursuite des renouvellements de branchements en lien avec les opérations de voirie.

3.4.2. Sujets à engager pendant le contrat

Réforme des redevances

Le montant de la redevance de performance des réseaux d'eau potable à laquelle vous serez assujettis à partir de 2025 prend également en compte un indicateur de gestion patrimoniale.

Les paramètres pris en compte dans le calcul de cet indicateur concernent tant :

- la connaissance du patrimoine et sa mise à jour (existence de plan de réseau mis à jour régulièrement, connaissance des matériaux, diamètres et dates de pose notamment, présence d'information sur les fuites dans le SIG) ;
- que la mise en place et la réalisation de plans d'actions de recherche de fuites et de renouvellement de canalisations.

Nous sommes à votre disposition pour étudier les solutions les mieux adaptées afin d'optimiser l'impact de cet indicateur sur la redevance de performance des réseaux d'eau potable.

Méthode d'établissement des plans de renouvellement par analyse critique

L'évolution du contexte et des enjeux (contractuels, énergétiques, financiers, etc.) et un besoin partagé d'initier une démarche transparente et co-construite dans la gestion patrimoniale des installations d'eau potable que nous opérons, nous incitent à élaborer ou à ajuster les plans de renouvellement sur la base d'éléments objectifs, documentés et partagés.

Ainsi, nous proposons de déployer des analyses de risques afin de disposer d'éléments objectifs d'arbitrage et d'évolutions des pratiques de maintenance et renouvellement.
Ces analyses de risques, menées avec les équipes opérationnelles, proposent d'estimer pour chaque équipement : l'impact d'une défaillance (gravité) et l'état (vétusté, performance, obsolescence).

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Nous disposons alors d'une matrice d'exposition des risques (cf. schéma ci-après) pour votre contrat qui propose une stratégie de maintenance et de renouvellement selon 4 niveaux.

Les bénéfices pour votre collectivité :

- meilleure maîtrise des risques ;
- justification objective et transparente des choix de renouvellement ;
- maîtrise des dépenses de renouvellement ;
- partage et codécision dans les arbitrages de gestion patrimoniale.

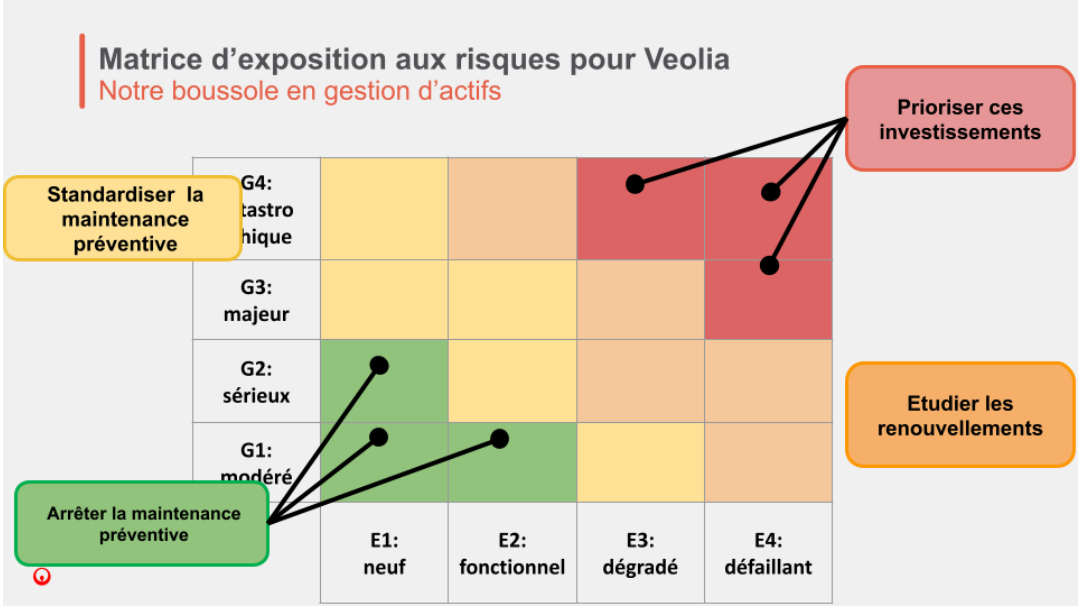

ABANDON DES TECHNOLOGIES RTC, 2G ET 3G

Les installations d'eau de tous types utilisent des équipements destinés à communiquer et partager des informations sur le fonctionnement des ouvrages et alerter en cas de dysfonctionnement. Ces données transitent sur des réseaux téléphoniques filaires de type RTC ou des réseaux sans fil.
A la résiliation automatique des services RTC, 2G et 3G les informations des ouvrages d'eau potable concernés par ces réseaux ne pourront plus parvenir aux délégataires et collectivités. Plus aucune alerte ne parviendra pour prévenir d'un manque d'eau par exemple.

L'abandon des technologies cuivre (RTC), 2G et 3G nécessite un remplacement par les équipes Veolia des équipements concernés afin de les basculer sur les nouveaux supports de communication (4G/5G).

A date, l'extinction des services 2G interviendra dès la fin 2025, tandis que la 3G prendra fin en 2028.
La fin des lignes RTC est programmée par zones géographiques, avec des échéances échelonnées jusqu'à 2030.

Nous reviendrons vers vous rapidement pour vous présenter le plan d'actions de remplacement des équipements concernés ainsi que le devis associé.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

3.5. A L'ÉCOUTE DES CONSOMMATEURS

3.5.1. L'ANCRAGE LOCAL DE NOS CENTRES DE RELATION CLIENT

L'engagement de Veolia en faveur d'un service consommateurs de proximité et de grande qualité, s'appuyant sur la densité de son ancrage territorial, a permis à Veolia de devenir le premier opérateur de services d'eau et d'assainissement à obtenir l'attestation "Relation Client 100% France".
Veolia dispose de **11 centres de Relation Client implantés en France et répartis sur le territoire** : Liévin, Vaulx en Velin, Toulouse, Le Mans, Caen, Metz, Maxéville, Blagnac, Lyon, Montpellier, Saint Maurice.

VOTRE LIEU D'ACCUEIL SUR LE TERRITOIRE DE LA COBAS

Ouvert au public du lundi au vendredi

Accueil téléphonique 24h/24 & 7j/7

☎ - **05 57 16 56 06** - ***Prix d'un appel local***

Les consommateurs de la So'Bass ont 2 points d'accueil ouverts toute l'année avec la possibilité de prendre des RDV pour la gestion des cas les plus complexes.

	18 RUE JEHENNE À ARCACHON **OUVERT DE 8H30 À 12H** **SUR RDV DE 13H À 16H**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

2 RUE COPERNIC AU TEICH

SUR RDV DE 8H30 À 12H

OUVERT DE 13H À 16H

TOUTES VOS DÉMARCHES SANS VOUS DÉPLACER

Pour toutes les démarches en lien avec vos abonnements aux services d'eau, vous pouvez nous contacter via plusieurs canaux mis à disposition.

NOTRE SERVICE CLIENT EN LIGNE :

- ✓ Sur internet **: www.sobass.fr** où vous pouvez envoyer un message à notre Eco-Conseiller ou signaler un dysfonctionnement
- ✓ Sur votre smartphone via nos applications iOS et Android : **So'Bass & moi**
- ✓ Notre Centre Service Client : **05 57 16 56 06**
- ✓ **Service pour les sourds ou malentendants** accessible depuis notre site internet
- ✓ **Courriers** : TSA 40118, 37911 Tours Cedex 9

VOS URGENCES **7 JOURS SUR 7, 24H SUR 24**

Pour toute fuite, incident concernant la qualité de l'eau ou fait anormal touchant le réseau, un branchement, une installation de stockage ou de production d'eau, nous intervenons jour et nuit.

L'exploitation est optimisée de manière à perturber le moins possible les usagers de services.

05 57 16 56 06

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

3.5.2. VOLUMÉTRIE ET NATURE DES CONTACTS AVEC NOS ABONNÉS

CANAUX DE COMMUNICATION UTILISÉS PAR LES CONSOMMATEURS

Canal du contact	Nombre de demandes*
Téléphone	26 706
Internet	7 374
Courrier	1 248
Visite en Agence	2 032
Terrain	319

Les consommateurs privilégient le contact téléphonique : près de 71% des contacts se passent par téléphone.

Par rapport à 2023, nous notons une baisse d'un peu plus de 2 points sur le canal téléphone au profit du canal internet.

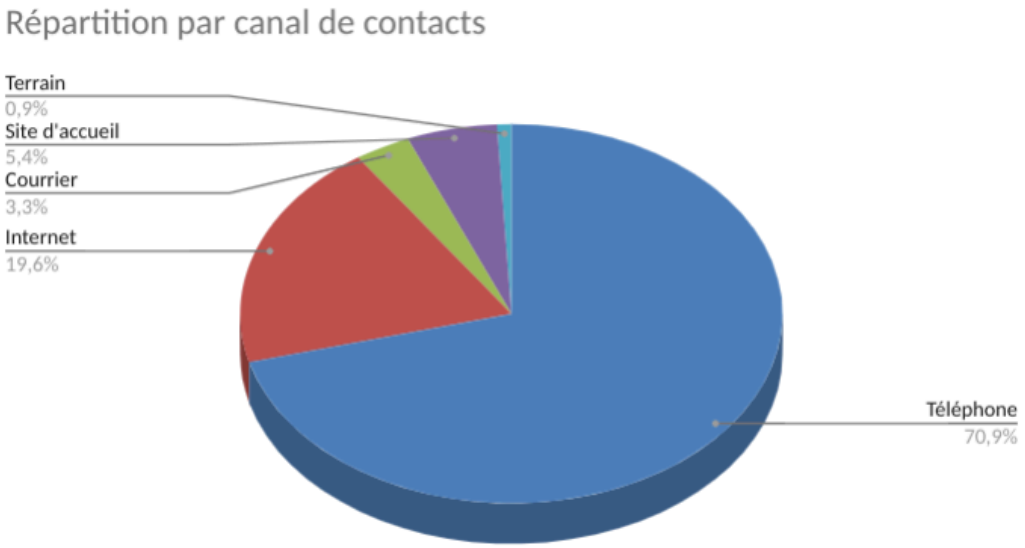

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

OBJET DES DEMANDES DES CONSOMMATEURS

Motif de la demande	Nombre de demandes traitées*
Abonnement et Résiliation	11 548
Facture et Paiement	14 631
Qualité de l'eau	223
Intervention	8 137
Branchement	998
Service et divers	2 397

Les deux principaux motifs de contacts sont les demandes d'abonnement et de résiliation et tous les sujets qui concernent la facturation : demandes d'explications, de modalités et moyens de paiement, d'échéanciers par exemple.

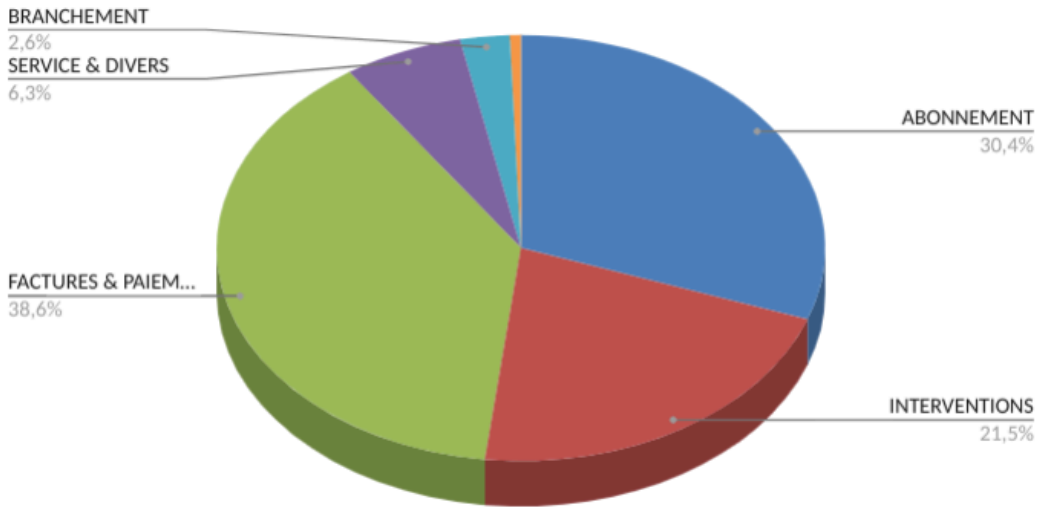

CONSOMMATEURS ABONNÉS DU SERVICE

	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
Nombre total d'abonnés (clients)	**45 373**	**46 204**	**46 880**	**47 358**	**47 778**	**0,9%**
domestiques ou assimilés	45 372	46 203	46 879	47 357	47 777	0,9%
non domestiques	1	1	1	1	1	0,0%
autres services d'eau potable						0,0%

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

L'abonné «*non domestique*» référencé sur la COBAS est l'Esturgeonnière, Route de Mios, Balanos, 33470 Le Teich dont la consommation est de 2 215 m3 en 2024.

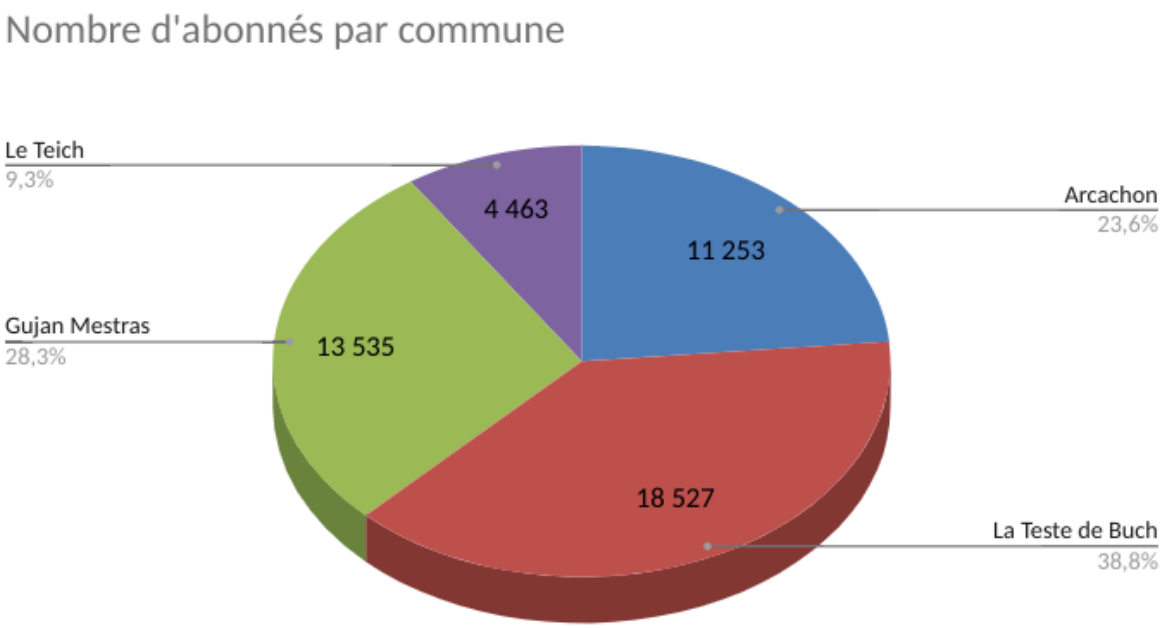

	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
Nombre annuel de demandes d'abonnement	4 082	4 011	3 855	3 262	3 398	4,2%
Taux de clients mensualisés	40,0 %	40,9 %	42,4 %	44,0 %	45,5 %	3,4%
Taux de clients prélevés hors mensualisation	29,4 %	29,5 %	30,1 %	30,4 %	30,6 %	0,7%
Taux de mutation	9,1 %	8,8 %	8,3 %	7,0 %	7,2 %	2,9%

Les indicateurs So'Bass au niveau du Centre de Relation Client

- Historique des indicateurs :

Ci-dessous une compilation des indicateurs depuis le début du contrat :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Urgences	1909	3878	4840	5028	5802	7373	6689	6418	5831
	Abo-Résil	2694	6027	7602	7838	6421	6724	5695	6476	5222
	Facturation	6089	9206	9217	9421	8261	8973	8039	6526	7075
	Autres	6579	12335	12092	13673	12109	13277	13870	12245	10591
Appels entrants	**Appels entrants**	**17271**	**31446**	**33751**	**35960**	**32593**	**36347**	**34293**	**31665**	**28719**
	Urgences	1854	3727	4524	4918	5710	7228	6526	6327	5713
	Abo-Résil	2640	5714	6806	7360	6126	6384	5369	6169	4718
	Facturation	6000	8537	8277	9182	8005	8799	7816	6378	6451
	Autres	6385	11050	10868	12908	11743	12966	13321	11857	9824
Appels traités	**Appels traités**	**16879**	**29028**	**30475**	**34368**	**31584**	**35377**	**33032**	**30731**	**26706**
	Urgences	98,0%	96,1%	93,5%	97,8%	98,4%	98,0%	97,6%	99,1%	98,6%
	Abo-Résil	98,4%	94,8%	89,5%	93,9%	95,4%	94,9%	94,3%	96,4%	91,9%
	Facturation	98,6%	92,7%	89,8%	97,5%	96,9%	98,1%	97,2%	98,4%	93,5%
	Autres	97,7%	89,6%	89,9%	97,0%	97,0%	97,7%	96,5%	97,8%	94,0%
Taux de décroché (QS)	**QS**	**98,1%**	**92,3%**	**90,3%**	**95,6%**	**96,9%**	**97,3%**	**96,5%**	**97,9%**	**94,4%**
	Urgences	95,5%	91,4%	83,3%	98,9%	97,3%	95,1%	97,5%	98,1%	96,6%
	Abo-Résil	96,9%	86,9%	75,2%	80,6%	83,8%	78,7%	94,3%	84,4%	72,3%
	Facturation	96,7%	85,5%	80,0%	97,1%	92,0%	94,3%	97,2%	95,1%	82,8%
	Autres	96,1%	80,0%	80,8%	96,8%	91,6%	94,4%	96,5%	94,0%	86,6%
QS < 180 s	**QS < 180 s**	**96,4%**	**85,8%**	**79,9%**	**93,8%**	**91,6%**	**91,5%**	**96,5%**	**93,1%**	**85,3%**
	Courriers traités (nbre)	**2359**	**1967**	**1732**	**1898**	**1548**	**1262**	**1152**	**706**	**666**
Courriers	Délai traitement (jr)	12	41,9	7,7	6,2	11,2	8,39	7,15	4,2	6
	Emails traités (nbre)	6660	7382	10204	16221	31488	8152	4971	4529	4884
	Emails traités > 8j (nbre)	11	418	338	856	3494	716	32	83	183
Emails	**Emails traités < 8j (%)**	**98,1%**	**94,3%**	**96,7%**	**94,7%**	**88,9%**	**91,2%**	**99,4%**	**98,0%**	**96,0%**

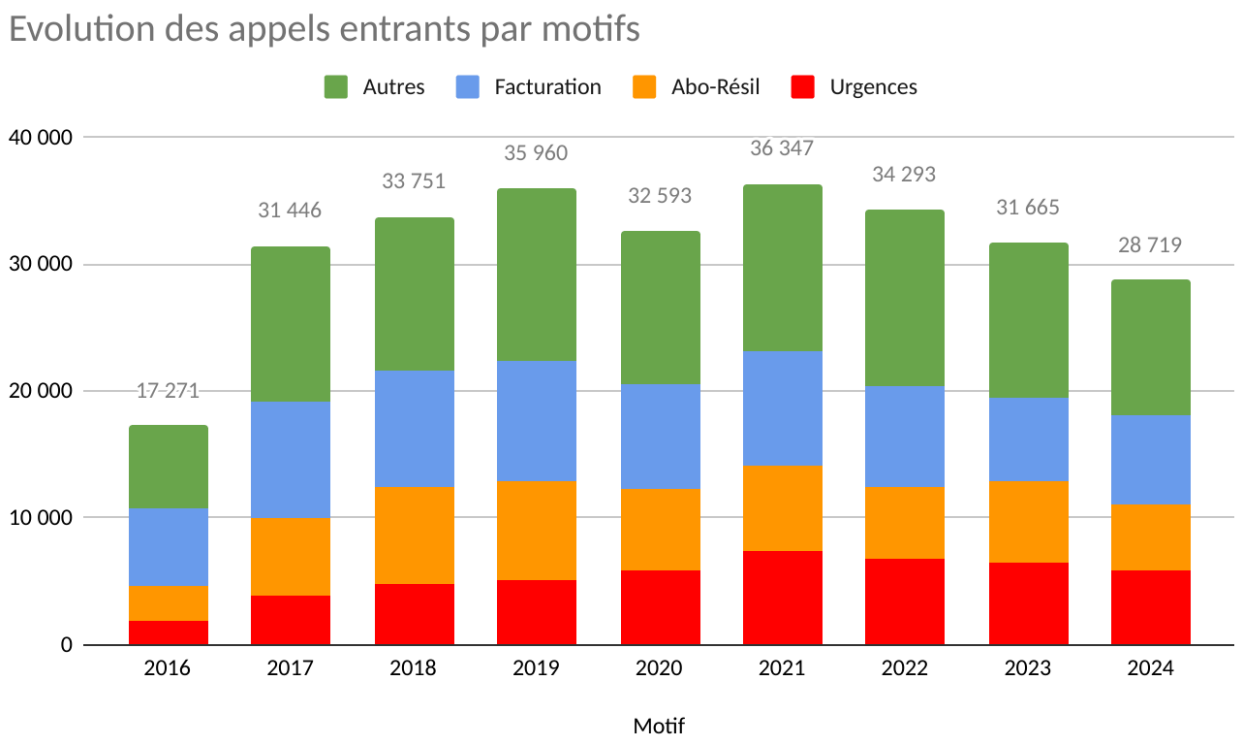

Nous notons une diminution constante du volume d'appels sur les quatre dernières années, avec une baisse significative de 9% versus 2023 et une baisse cumulée dépassant 20% depuis 2021.

Cette évolution positive témoigne d'une amélioration notable de la performance des équipes dans la gestion du contrat. Cette progression s'explique notamment par deux facteurs clés : la capacité croissante à apporter une réponse pertinente dès le premier contact et la mise en place de mesures efficaces visant à minimiser les appels réitérés.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

INDICATEURS TÉLÉPHONIQUES 2024 DÉTAILLÉS MOIS PAR MOIS :

Date - Mois	Qualité de Service	Appels traités	Volume appel reçu	Taux de répondus <3min
janvier	98,0 %	3429	3537	92,4 %
février	97,6 %	2561	2650	90,4 %
mars	97,1 %	2175	2255	90,9 %
avril	97,7 %	1936	1989	92,7 %
mai	94,4 %	1704	1843	87,3 %
juin	94,3 %	2486	2679	86,8 %
juillet	95,8 %	2911	3085	85,0 %
août	95,0 %	2105	2241	85,1 %
septembre	93,8 %	1720	1860	85,6 %
octobre	90,6 %	1569	1750	78,3 %
novembre	88,0 %	1743	2025	74,0 %
décembre	87,9 %	2367	2805	68,6 %
Total	**94,4 %**	**26706**	**28719**	**85,3 %**

Une augmentation du délai moyen d'attente a été observée, passant de 2 minutes à 3 minutes 30 secondes durant les mois de novembre et décembre. Bien qu'une proportion des appels dépasse désormais le seuil des 180 secondes d'attente, la prise en charge et le traitement des demandes restent effectifs.

Pour optimiser l'expérience client et gérer ce temps d'attente, un service de rappel automatique (“call back”) a été mis en place depuis septembre 2024. Cette solution permet aux consommateurs de solliciter un rappel, effectué dans l'heure qui suit leur demande. Grâce à ce dispositif, nous maintenons un taux de joignabilité optimal de 100%, garantissant ainsi la satisfaction de l'ensemble des demandes clients.

Nous avons enregistré 66 demandes de “call back” depuis septembre 2024. 100% ont été rappelés dans la journée.

LA FRÉQUENTATION DE NOS ACCUEILS CLIENTS :

Le graphique ci-dessous illustre la fréquentation au niveau des 2 accueils clients sur l’année 2024, soit **2 032** visites, en légère hausse par rapport à 2023 (1 936 visites).

La fréquentation des accueils est à mettre en parallèle avec la période de facturation (juin-juillet et décembre-janvier).

En décembre 2024, nous observons une augmentation des visites due à la facturation anticipée de 3 lots (représentant 11 000 clients). Cette facturation, initialement prévue en janvier 2025, a été avancée à la demande de la COBAS afin d'assurer une équité de traitement dans le cadre de la mise en place de la nouvelle redevance de l'agence de l'eau. 350 visites en décembre 2024 versus 275 en décembre 2023.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

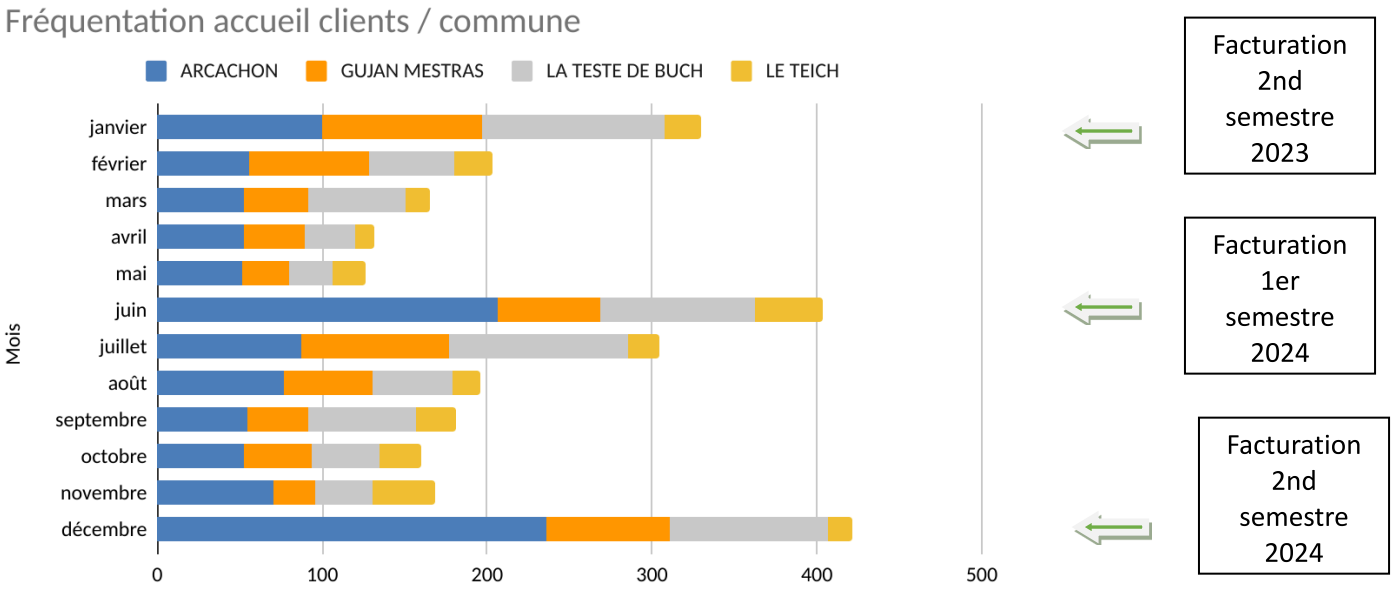

Comme évoqué précédemment, les deux principaux motifs de contacts (et donc de déplacements en agence) sont les demandes d'abonnement et de résiliation et tous les sujets qui gravitent autour de la facturation (explications, échéanciers, dégrèvements)

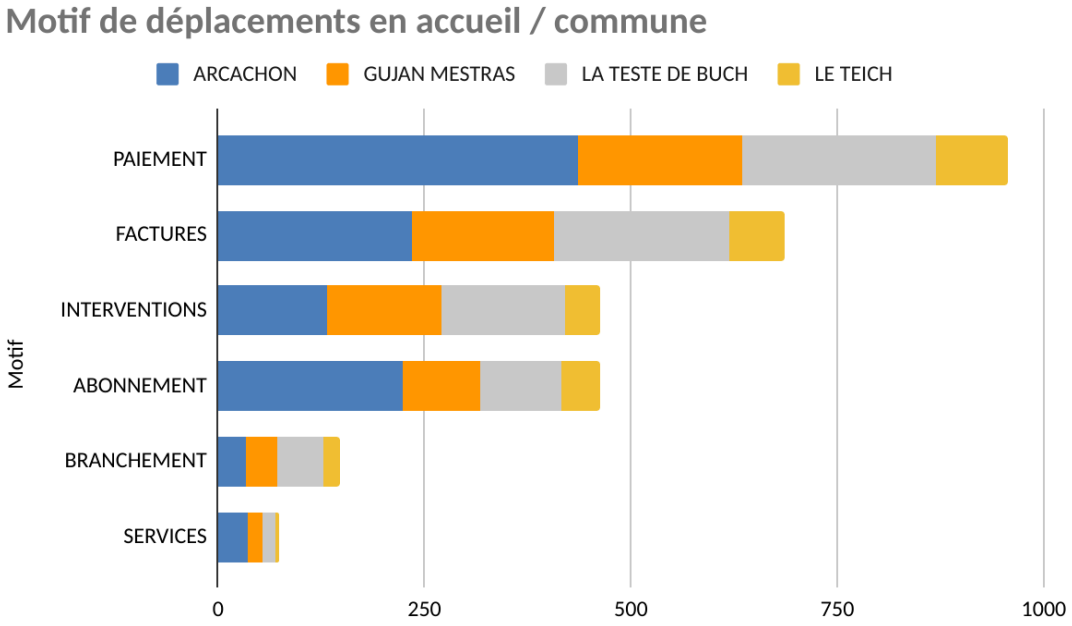

3.5.3. SATISFACTION DES CONSOMMATEURS

Satisfaire les consommateurs des services que nous exploitons commence par recueillir régulièrement le jugement qu'ils portent sur ces services.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Le baromètre de satisfaction réalisé par Veolia porte sur les principaux critères d'appréciation de nos prestations.

LES ENQUÊTES DE SATISFACTION MENÉES PAR UN ORGANISME EXTERNE (IPSOS) AUPRÈS D'UN ÉCHANTILLON DE CONSOMMATEURS :

Le tableau ci-dessous présente les taux de satisfaction à l'échelle nationale.

	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
Satisfaction globale	90	77	81	83	80	-3
La continuité de service	95	93	94	91	91	0
La qualité de l'eau distribuée	82	79	84	79	79	0
Le niveau de prix facturé	66	53	61	61	56	-5
La qualité du service client offert aux abonnés	86	75	74	77	76	-1
Le traitement des nouveaux abonnements	92	80	77	83	70	-13
L'information délivrée aux abonnés	74	71	71	74	74	0

LES ENQUÊTES DE SATISFACTION MENÉES PAR VEOLIA

- Enquêtes post-contact : 3 310 réponses sur 14 029 enquêtes envoyées (taux de réponse de 23.5 %)

Elles concernent les enquêtes envoyées par mail par Veolia après chaque contact, quel que soit le motif de la demande du client (hormis les interventions sur le terrain) : abonnement, résiliation, renseignements, facture, paiement, services, réclamation.

Niveau global de satisfaction : 82.69 %

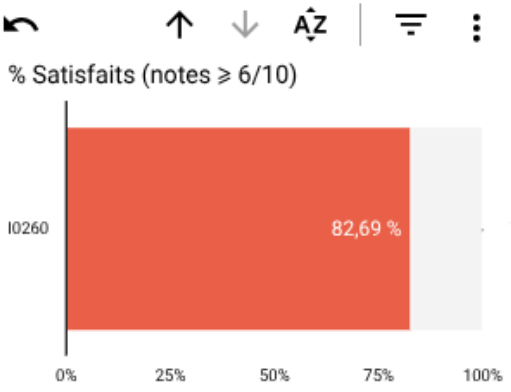

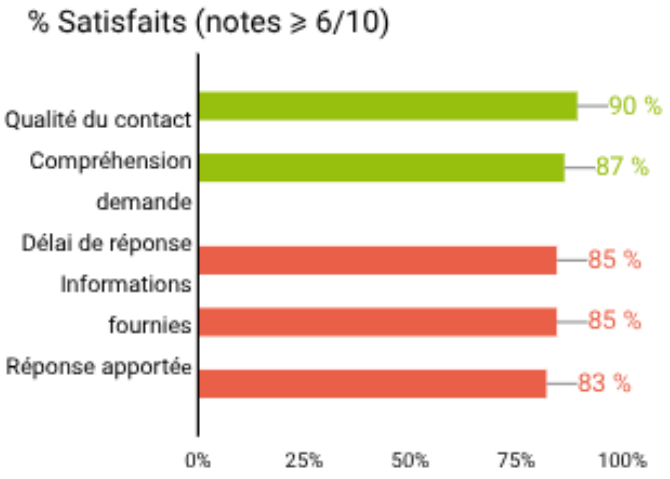

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Niveau de satisfaction détaillé par motif de contacts :

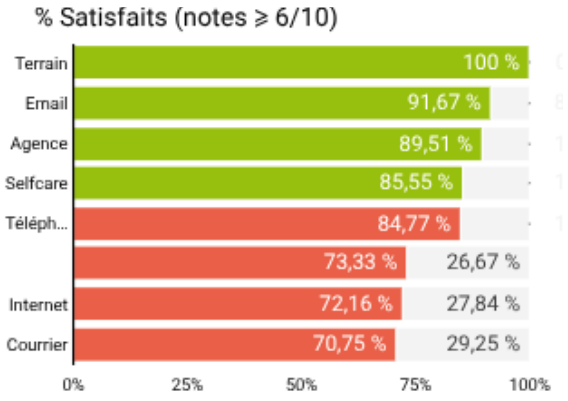

Nombre de répondants :
Agence : 239
Tél : 1 837
Internet : 407
Courrier : 75

Le taux de satisfaction doit être analysé en tenant compte du nombre de répondants pour garantir une représentativité statistique fiable.

- Enquêtes post-intervention terrain : 1 002 réponses sur 4 150 enquêtes envoyées (taux de réponse de 24 %)

Elles concernent les enquêtes envoyées par mail par Veolia après une intervention au domicile du consommateur : changement de compteurs, et interventions techniques.

N.B : Les enquêtes liées aux demandes de branchements neufs n'ont commencé qu'au début de l'année 2024.

Niveau global de satisfaction : 91.32 %

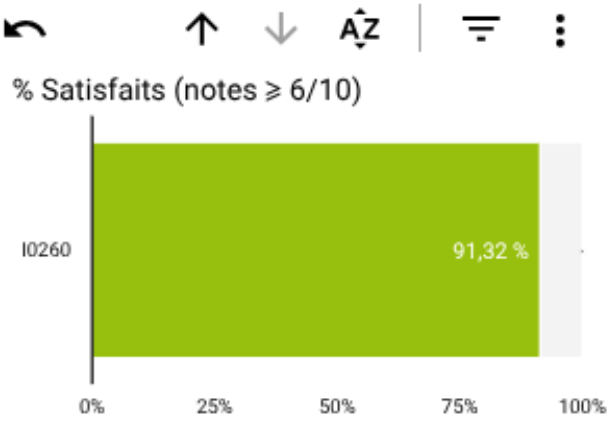

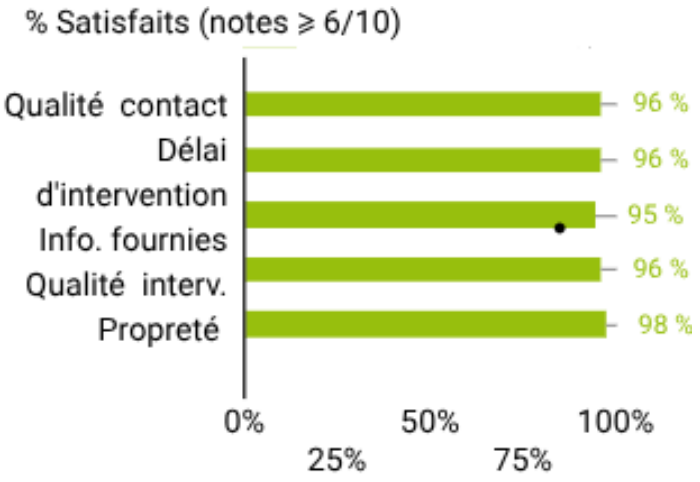

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Niveau de satisfaction détaillé par motif d'intervention technique :

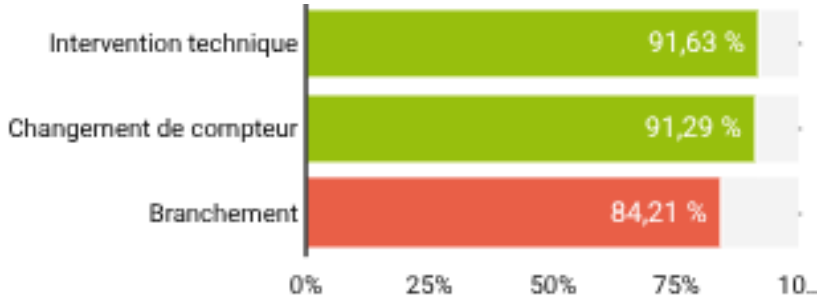

Nombre de répondants :
416
482
16

- **La boucle retour de l'expérience consommateurs :**

Nous accordons une importance particulière au suivi des retours négatifs en contactant systématiquement les clients ayant exprimé leur insatisfaction lors des enquêtes. Une réclamation n'est considérée comme résolue qu'après confirmation de la satisfaction du client.

Depuis 2 ans, la personne chargée de la médiation rappelle les clients qui ont mis une note de satisfaction globale comprise entre 0 et 4 (sur 10) lors de leur réponse aux enquêtes.

Le non rappel peut être lié au fait qu'une action a été faite par ailleurs en parallèle à leur retour d'enquête, répondant à l'attente du client (action de la plateforme téléphonique ou déplacement en agence clientèle par exemple)

	Nbre clients note entre 0 et 4	Nbre clients rappelés	Taux de rappels
JANVIER	76	59	78%
FEVRIER	41	32	78%
MARS	24	18	75%
AVRIL	27	19	70%
MAI	14	12	86%
JUIN	24	19	79%
JUILLET	43	39	91%
AOÛT	32	27	84%
SEPTEMBRE	24	19	79%
OCTOBRE	23	19	83%
NOVEMBRE	20	18	90%
DÉCEMBRE	26	18	69%

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

LE TAUX DE RÉCLAMATIONS :

Le nombre de réclamations abonnés est de 1,13 u/1000 abonnés. Cela correspond à **54** réclamations pour 2024 (versus 68 en 2023, soit une baisse de 20% du nombre de réclamations).

Motif	Nbre de réclamations
FACTURES	14
INTERVENTIONS	13
PAIEMENT	10
SERVICES	6
ABONNEMENT	6
BRANCHEMENT	3
QUALITE EAU	2
Total général	54

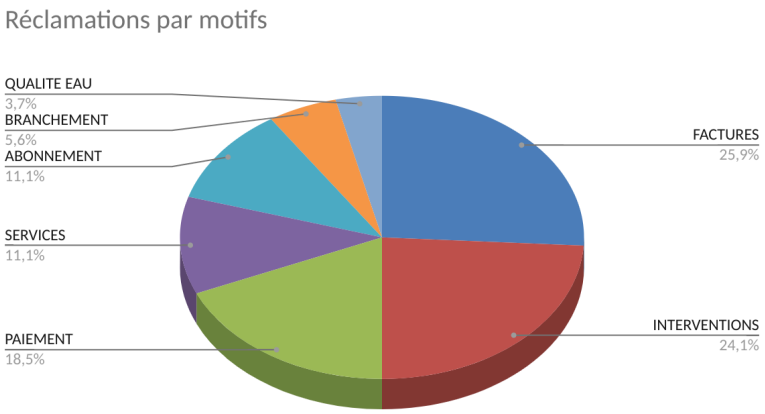

ENGAGEMENTS DE SERVICE

Nos 8 engagements témoignent de notre mobilisation quotidienne pour la qualité de l'eau et de celle de tous les services qu'attendent les consommateurs. Qu'il s'agisse d'intervenir quand ils ont besoin de nous, de les aider à gérer leurs budgets eau, de les accompagner dans l'adaptation à la transition écologique ou de mettre à leur disposition tous les canaux d'échanges dont ils souhaitent disposer.

Ces engagements sont détaillés sur le site internet eau.veolia.fr.

3.5.4. MISE EN PLACE DES COMPTEURS TÉLÉRELEVÉS

Grâce aux compteurs télérelevés déployés sur votre territoire, les consommateurs ont désormais la possibilité de suivre très régulièrement leur consommation. Ils reçoivent des alertes en cas de fuites, leur permettant de faire des économies et, in fine, de participer directement et concrètement à la préservation de la ressource.

Nombre de fuites détectées et stoppées suite à l'envoi d'une communication client	3 133
M³ économisés	82 549

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

3.6. Résilience du territoire

3.6.1. Sécurité et gestion de crise

Exercice de crise réalisé

Un exercice de crise s'est déroulé le 06 mars 2024 sur l'usine de Cabaret selon le scénario suivant :

- Incendie sur un véhicule poids lourds à proximité de la cuve de CO2, générant une fuite de chlore, un blessé et un déversement accidentel dans le pluvial.

Présents: Cellule de crise avec installation PC crise sur site (SDIS 33, élus, COBAS,...)

La cybersécurité de vos installations

La cybersécurité est, depuis plusieurs années déjà, un enjeu pour les entreprises et organisations. En effet, la transformation numérique, la multiplication des objets connectés, et l'interconnexion des réseaux avec de nombreux partenaires augmentent l'exposition des systèmes aux risques cyber.
Par ailleurs, l'évolution réglementaire avec la transposition de la Directive Européenne NIS2 en droit français va renforcer les obligations de sécurisation sur les installations d'eau et d'assainissement.

Nous avons lancé en 2024 un **premier diagnostic**, étape indispensable qui permettra d'établir une liste d'actions à lancer, classées en plusieurs niveaux de priorité.

Ce diagnostic sera présenté en 2025 auprès des services de la COBAS :

- une évaluation du niveau de maturité de cybersécurité de vos installations ;
- la définition du plan d'action de sécurisation spécifique à votre périmètre, afin de **garantir la continuité de service en cas d'attaque** ;
- et une évaluation des coûts nécessaires à la mise en place des actions de sécurisation et à la mise en conformité réglementaire.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

ÉVALUER ET GÉRER LES RISQUES : LE PGSSE

Le Plan de Gestion de Sécurité Sanitaire de l'Eau (PGSSE), rendu obligatoire par la réglementation d'ici 2027, impose d'évaluer les risques inhérents au service de distribution d'eau potable afin de mieux les anticiper pour mieux les gérer.
Outre les risques d'exploitation courants, il doit intégrer les risques externes (accident, intrusion, malveillance…), les risques futurs (baisse des ressources, évolution des volumes…) ainsi que tous les risques associés au changement climatique (sécheresse, précipitations, tempête, hausse du niveau des mers…).

Fort de notre expérience dans tous ces domaines et en tant que partenaire de la réflexion globale de l'État dans le cadre du Plan National d'Adaptation au Changement Climatique, nous pouvons vous accompagner dans la réalisation et le suivi de cette démarche.
Celle-ci doit être engagée dès 2025 pour prendre le temps de mener à bien toutes les études et réflexions utiles nécessaires à son élaboration sereine.

La première étape consiste à l'élaboration d'une étude de danger exhaustive afin d'élaborer le programme de suivi analytique de la qualité de l'eau.
En tant que PRPDE (Personne Responsable de la Production et de la Distribution de l'Eau), la collectivité doit mener à bien cette étude au plus vite pour une présentation à l'ARS chaque début d'année. Nous nous engagerons à vos côtés pour la réalisation de cette étude et l'élaboration du programme de suivi.

Pour information, près de 20% des services d'eau potable de France ont d'ores et déjà engagé ces études (et à fin 2023, plus de 50% sur les métropoles, agglomérations et gros syndicats d'eau) ce qui leur permet de pleinement bénéficier des subventions disponibles, et d'être mieux accompagnés pour construire leur plan. Le rapprochement de la date d'échéance va mettre en tension le marché des bureaux d'étude et sans doute faire augmenter les tarifs de réalisation de ces études obligatoires.

3.6.2. ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

L'OUTIL RESILI'EAU, LA SCORE CARD RÉSILIENCE DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT ET EAU POTABLE

Pour faire face aux changements climatiques, 2 volets indissociables se présentent :

- l'**atténuation** : énergies renouvelables, économie de réactifs, valorisation des déchets, boues, mobilité durable, etc ;
- l'**adaptation** : les services d'eau vont devoir s'adapter à ce changement climatique à court et moyen terme.

Dans le cadre de l'adaptation, le Plan Eau du gouvernement a lancé 53 mesures.

L'outil Resili'Eau répond à la mesure 52 visant à mettre à disposition des collectivités territoriales un outil d'accompagnement à la prise de décision pour prendre la trajectoire d'adaptation des services d'eaux au changement climatique. C'est un outil simple, pédagogique, facile de mise en œuvre qui a été co-construit par Cerema et Veolia.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Il permet une évaluation du niveau de résilience des services d'eau et d'assainissement et identifie les actions à consolider ou réorienter dans le cadre d'une trajectoire de progrès. L'outil permet de faire une analyse 360° des services, en tenant compte des projections climatiques et des projets de territoires, et il permet de définir des solutions d'adaptation des plus opérationnelles aux plus innovantes, organisationnelles ou techniques. L'utilisation de cet outil se fait en proche partenariat avec la collectivité.

L'outil est porté par Cerema et Veolia et est apprécié des Agences de l'Eau.

Les bénéfices pour votre collectivité :

- analyse de situation à date dans une vision 360° (ressources et milieux, systèmes, organisation, crises, stratégie) ;
- identification des actions sans regret à poursuivre et des vulnérabilités à réduire ;
- accompagnement au plan d'actions en fonction du niveau de résilience des services par thématique ;
- aide au confortement de la prise de décision ;
- valorisation des actions engagées auprès des agences de l'eau, des habitants, des services.

Surveillance de la Ressource en Eau : Hubgrade Ressource

La tension sur la ressource en eau est de plus en plus prégnante chaque année sur les territoires. Outre les actions qui peuvent être menées sur la sobriété des usages, la surveillance des ressources en eau afin **d'anticiper les décisions à prendre** est devenue un enjeu capital.
C'est ce que permet Hubgrade Ressource.

Hubgrade Ressource c'est pour vous :

- plus de connaissance par une vue globale et détaillée de l'évolution de chaque ressource en eau ;
- plus de sérénité au quotidien sur l'état réel de la situation à l'aide d'outils simples et compréhensibles pour des non-experts ;
- plus d'anticipation sur une éventuelle situation de crise grâce à la prédiction de la situation jusqu'à 6 mois à l'avance grâce à PrediNappes, notre solution unique co-conçue avec le BRGM.
-

Cet outil a été lancé fin 2024 sur la COBAS et déployé au cours du premier semestre 2025 sur l'ensemble des ressources de la COBAS;

Sécuriser la production et la distribution d'eau grâce aux Unités Mobiles de Traitement

L'évolution rapide de la situation sur de nombreux sujets de quantité ou de qualité de l'eau nécessite parfois **des interventions rapides** au détriment d'une réflexion approfondie.
Pour éviter cette situation de stress, Veolia dispose d'**Unités Mobiles de Traitement** pour répondre à ces différentes problématiques.

Ainsi ces équipements peuvent utilement permettre :

- de pérenniser l'alimentation en eau et la résilience du territoire ;
- une action rapide à mettre en place en cas de crise ;
- une optimisation des investissements en toute sérénité.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Nous mettons ces équipements à votre disposition si nécessaire afin de faciliter une éventuelle gestion de crise ou une prise de décision en toute sérénité.

SOBRIÉTÉ DES USAGES

Afin de faire face aux conséquences du dérèglement climatique, le Gouvernement a annoncé, dans le cadre du Plan Eau de mars 2023, une série de mesures visant un objectif global de réduction de 10% des prélèvements d'eau dans le milieu naturel pour les prochaines années afin de préserver les ressources. Cet objectif général est décliné dans les programmes d'adaptation de chaque Agence de Bassin et vise en particulier les prélèvements réalisés pour produire l'eau potable.

Parmi les différentes mesures annoncées figure notamment l'incitation à des économies d'eau et à la sobriété pour l'ensemble des catégories de consommateurs, qui viendra renforcer la **baisse structurelle des volumes d'eau consommés.** Il est donc nécessaire de définir la trajectoire que souhaite prendre votre collectivité pour l'accompagner et y faire face.

L'incitation et l'accompagnement à la baisse des volumes de consommation peuvent s'établir sur différents axes de travail, sans se limiter aux actions réalisées pour limiter les fuites sur le réseau de distribution :

- l'amélioration de la connaissance des consommations avec la remontée de données télé relevées et la mise à disposition des données de l'observatoire des usages établi par Veolia ;
- la création de **supports de sensibilisation** à destination de l'ensemble des parties prenantes s'appuyant sur les sciences comportementales ;
- la réalisation d'**audits de consommation en eau** pour les grands équipements et bâtiments industriels du territoire et la mise en place de **conventions de sobriété hydrique** ;
- l'accompagnement à l'**équipement en dispositifs hydro-économes** auprès des consommateurs domestiques et bâtiments publics ;
- le développement d'une **ingénierie tarifaire** qui permet de responsabiliser les plus grands consommateurs du territoire.

Sur ce dernier point, il faut aussi anticiper les impacts de la baisse des consommations sur l'équilibre économique du service de l'eau potable (et pour la partie assainissement). **La baisse des volumes engendre une baisse des recettes, ce qui nécessite des ajustements tarifaires, à la fois incitatifs à la baisse des consommations mais aussi préservant une solidarité tarifaire avec les ménages les moins aisés.**

A cet effet, l'observatoire des usages travaille à l'analyse des données de consommation des territoires en général et du **vôtre en particulier**. Les données sont analysées **pour différents segments de consommateurs** (particuliers, habitat collectif, industriels, collectivités).

Veolia est en capacité de vous fournir une analyse historique fine sur plusieurs années ainsi qu'une vision prospective à moyen et long terme. En effet, à travers les expertises en data science et en prospective, des modèles de prédiction, permettant de projeter l'évolution des consommations à horizon annuel mais également à l'horizon de la durée du contrat, ont été élaborés. Grâce à la prise en compte de paramètres tels que la météorologie, la croissance démographique, l'attractivité économique, une appréciation fine des consommations par segments d'usagers est facilitée.
Ces données peuvent ensuite être mises en regard de celles issues d'une projection de l'état de la ressource en eau sur votre territoire.

Plusieurs territoires, de petites collectivités rurales à de grandes métropoles urbaines, ont fait de la sobriété l'un des axes forts de leur service d'eau !
Nous pouvons venir vous en présenter les retours d'expérience et étudier les propositions qui seraient adaptées à votre collectivité.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

ANTICIPER LES PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES IMPORTANTS

L'expertise d'exploitation des installations par Veolia, combinée aux années d'expériences de PREDICT dans l'anticipation et l'assistance au cours d'événements hydrométéorologiques permettent de s'organiser préventivement face à des phénomènes à risques pouvant être dommageables pour l'exploitation des infrastructures du territoire.
L'équipe d'experts PREDICT fournit des recommandations précises et adaptées aux besoins des exploitants Veolia pour l'activation des différents niveaux d'alerte avec des mesures de protection et de sauvegarde spécifiques, validés au préalable avec vos services.

Les bénéfices pour votre collectivité :

- assurer la sécurité des habitants et maintenir la continuité de la circulation routière ;
- garantir la sécurité des opérateurs Veolia en leur fournissant les informations nécessaires pour décider si une sortie d'astreinte est sécurisée ou non ;
- protéger votre patrimoine et les équipements essentiels qui servent à l'exploitation ;
- sécuriser les réseaux et les infrastructures vitales ;
- assurer la continuité du service par l'anticipation et l'organisation préventive ;
- assurer le retour progressif à la normale.

ADAPTER LES INFRASTRUCTURES AUX ALÉAS CLIMATIQUES

Déjà une réalité sur le territoire, le changement climatique va avoir dans la durée des répercussions profondes sur le service d'eau potable. Vagues de chaleur, sécheresses, tempêtes et fortes pluies vont en effet se succéder plus fréquemment et plus intensément qu'auparavant, avec des conséquences très concrètes :

- modification de la structure des sols, entraînant une dégradation des canalisations et des bâtis ;
- rupture de télécommunications ou d'alimentation électrique des installations ;
- échauffement des équipements électriques et électromécaniques, pouvant entraîner des départs de feux ou des casses plus fréquentes ;
- raréfaction et dégradation de la qualité de la ressource en eau potable, avec une concentration accrue des polluants dans l'eau ;
- augmentation des besoins de rafraîchissement des populations, avec éventuel risque accru de street pooling ;
- etc.

Il est donc nécessaire de **mettre à jour le schéma directeur du service** pour évaluer les actions à engager à court, moyen et long terme. Cette mise à jour viendra notamment répondre aux mesures 9 et 10 du Plan Eau du Gouvernement, relatives à la déclinaison au niveau de chaque territoire :

- d'un plan d'adaptation au changement climatique ;
- de scénarios prospectifs sur les prélèvements en lien avec les SAGE et PTGE.

Face aux aléas climatiques, de nombreuses solutions et petits travaux sont bénéfiques pour renforcer la résilience des infrastructures du service, installations comme réseaux :

- **protection des automates programmables industriels et autres instruments électroniques sensibles** contre les fortes chaleurs, avec des solutions de monitoring et de rafraîchissement des locaux existants ;

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

- **protection des infrastructures implantées en lisière ou dans des forêts** à risque d'incendie avec la mise en place de réseaux d'humidification utilisant des eaux recyclées (REUT) ou création de réserves pour les pompiers ;
- **déploiement de solutions pour sécuriser l'approvisionnement en électricité** des installations les plus sensibles : solutions de sobriété énergétique (re-lamping par LED, pose de variateurs de vitesse CEE…), production autonome d'électricité (production solaire, groupes électrogènes…) ;
- **création d'îlots de fraîcheur et déploiement de solutions d'accès à l'eau** dans l'espace public ou les lieux d'habitat précaire ;
- **protection des canalisations contre le retrait gonflement des argiles**, avec des solutions de monitoring et des renouvellements ciblés avec des matériaux adaptés ;
- **protection des installations contre les inondations**, via des solutions de protection physique du bâti, la mise en sécurité des équipements critiques, l'installation de capteurs de niveau d'eau en extérieur, etc. En particulier, une solution de sécurisation physique existe pour les bâtiments les plus sensibles : il s'agit d'une solution technique de protection du bâti, installée autour de l'infrastructure à protéger, qui agit comme une barrière de protection permanente. Son activation est automatique et passive (sans électricité). Ce dispositif préventif dispose d'un atout supplémentaire majeur : il est totalement invisible une fois installé. Innovant et efficace, ce dispositif anti-inondation est adaptable à tous types de constructions en zone à risques. Cette barrière isole de l'eau l'infrastructure pendant toute la durée du sinistre. Déclenché automatiquement lors d'une inondation, il peut aussi inclure un dispositif manuel d'activation en option. Performant en zone inondable, il s'adapte à différents types d'aléa d'inondation : le ruissellement pluvial urbain, les débordements de cours d'eau, les inondations et les submersions marines. C'est un système réutilisable de protection des inondations ;
- **tropicalisation des armoires électriques et des automates**.

NOS PROPOSITIONS POUR LA BIODIVERSITÉ

Face au déclin du vivant, qui est essentiel à la régulation du climat, à la santé et à l'accès à des ressources de qualité, le service d'eau a un vrai rôle à jouer dans la préservation de la biodiversité du territoire.
En raison des importantes surfaces d'espaces verts incluses dans le périmètre du contrat, et dans un souci d'exemplarité du service public, Veolia vous propose d'engager des actions ciblées à l'efficacité éprouvée :

- **réalisation d'un Audit Biodiversité par un tiers expert** pour mieux connaître votre patrimoine naturel, le relier à la trame verte et bleue plus globale du territoire, et in fine cibler les actions à mener pour avoir un effet levier maximal sur la biodiversité et communiquer auprès de vos administrés ;
- **élaboration d'un plan de gestion différenciée des espaces verts**, qui garantit un entretien respectueux de la biodiversité, tout en tenant compte des différents usages des sites [proposition ok si zéro phyto] ;
- **déploiement du suivi automatisé de la santé des écosystèmes des sites avec LEKO :** fruit d'une collaboration entre Veolia et le Muséum National d'Histoire Naturelle, LEKO est un service qui permet d'écouter la biodiversité autour d'un point donné pour en déduire l'état de santé des écosystèmes. Il s'appuie pour ce faire sur des groupes bio-indicateurs que sont les chauves-souris, les sauterelles et les oiseaux. Grâce à un capteur acoustique qui fonctionne en permanence, les données générées permettent de comparer, dans le temps ou l'espace, l'évolution des communautés de ces espèces bio-indicatrices, et ainsi :
  - d'évaluer les impacts d'aménagements programmés, de changements des modalités de gestion des espaces verts, de changement des systèmes d'éclairage…,
  - de cataloguer une partie du patrimoine biodiversité, pour permettre notamment la prise en compte des espèces les plus menacées.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Un affichage web permet de suivre dans le temps de valoriser les résultats obtenus. Les données collectées sont versées à l'inventaire national du patrimoine naturel ;

- **mise en œuvre d'aménagements techniques légers pour la faune ou de projets de végétalisation**, sur la base des résultats de l'Audit biodiversité : nichoirs à oiseaux, gîtes à chauves-souris, chandelles à pollinisateurs, passages pour la petite faune, espaces de renaturation, plantation de haies… ;
- **prise en compte du risque de pollution lumineuse** générée par le service d'eau, grâce à une cartographie des éclairages extérieurs des sites permettant de cibler les sites et les actions les plus pertinents dans un double souci de préservation de la biodiversité et d'économies d'énergie !

3.6.3. VOLET SOCIAL

DIAGNOSTIC TERRITORIAL D'ACCÈS À L'EAU

Au 01 janvier 2025 chaque collectivité doit avoir établi un diagnostic territorial d'accès à l'eau recensant toutes les personnes qui n'ont pas aujourd'hui un accès direct à l'eau potable public afin de proposer un plan d'action pour y remédier.

Pour ce diagnostic qui comprend un volet technique (réseau de distribution, forage privatif, fontaine publique…) et un volet social (personnes non sédentaires, isolées ou de passage…), nous vous proposons de réaliser cette étude, avec les propositions de travaux associés.

ENGAGEMENTS SOCIAUX SPÉCIFIQUES AU CONTRAT

En 2024, 115 clients ont pu être aidés en bénéficiant du dispositif des chèques eau pour régler leurs factures.

Un montant total de 22 243.35 € a été utilisé sur une enveloppe de 45 200 € (20 000 € de dotation annuelle + 25 200 € de reliquat de 2023). Soit un taux d'utilisation de 49 %.

Dans le cadre de l'amélioration continue du dispositif, une réunion de concertation s'est tenue le 3 avril 2024 à notre initiative. Cette session a rassemblé les représentants du Pôle Solidarité de la COBAS ainsi que les CCAS des quatre communes concernées. L'objectif principal était de renforcer la sensibilisation des acteurs pour une utilisation plus efficiente du dispositif en place.

	Montant aide	Nbre clients aidés
LA TESTE DE BUCH	13 130,54 €	65
ARCACHON	4 296,00 €	24
GUJAN MESTRAS	3 625,29 €	18
LE TEICH	1 191,52 €	8
	22 243,35 €	115



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

4. RAPPORT FINANCIER DU SERVICE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

4.1. LE COMPTE ANNUEL DE RÉSULTAT DE L'EXPLOITATION DE LA DÉLÉGATION

Le présent chapitre est présenté conformément aux dispositions du décret 2016-86 du 1er février 2016.

4.1.1. LE CARE

Le compte annuel et l'état détaillé des produits figurent ci-après. Les modalités retenues pour la détermination des produits et des charges et l'avis des Commissaires aux Comptes sont présentés en annexe du présent rapport « Annexes financières ».
Les données ci-dessous sont en Euros.

Société d'Exploitation d'Eau du Bassin — **Version Finale**

Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation
Année 2024
(en application du décret du 14 mars 2005)

Collectivité: I0260 - COBAS — **Eau**

LIBELLE	2023	2024	Ecart %
PRODUITS	**11 700 744**	**11 607 395**	**-0,80 %**
Exploitation du service	6 591 095	6 724 081	
Collectivités et autres organismes publics	4 081 952	3 895 199	
Travaux attribués à titre exclusif	581 502	517 518	
Produits accessoires	446 196	470 597	
CHARGES	**11 586 253**	**11 394 562**	**-1,65 %**
Personnel	1 056 462	1 025 013	
Energie électrique	407 753	490 804	
Produits de traitement	392 584	230 506	
Analyses	63 533	82 268	
Sous-traitance, matièreset fournitures	2 133 123	1 773 694	
Impôts locaux et taxes	46 187	29 607	
Autres dépenses d'exploitation	1 225 494	1 098 784	
télécommunications, poste et telegestion	*8 809*	*14 904*	
engins et véhicules	*108 619*	*121 558*	
informatique	*331 130*	*398 336*	
assurances	*32 119*	*11 392*	
locaux	*44 197*	*49 163*	
autres	*700 623*	*503 431*	
Redevances contractuelles	170 795	630 142	
Contribution des services centraux et recherche	0	0	
Collectivités et autres organismes publics	4 081 952	3 895 199	
Charges relatives aux renouvellements	1 212 374	1 450 827	
programme contractuel (renouvellements)	*1 133 402*	*1 340 078*	
fonds contractuel (renouvellements)	*78 972*	*110 749*	
Charges relatives aux investissements	634 456	643 973	
programme contractuel (investissements)	*634 456*	*643 973*	
Pertes sur créances irrécouvrables-Contentieux recouvrement	161 539	43 744	
RESULTAT AVANT IMPOT	**114 491**	**212 832**	**NS**
Impôt sur les sociétés (calcul normatif)	28 615	53 200	
RESULTAT	**85 877**	**159 634**	**NS**

Conform e à la circulaire FP2E de janvier 2006 — 10/03/2025

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

4.1.2. L'ÉTAT DÉTAILLÉ DES PRODUITS

L'état suivant détaille les produits figurant sur la première ligne du CARE :
Les données ci-dessous sont en Euros.

Société d'Exploitation d'Eau du Bassin **Version Finale**

Etat détaillé des produits (1)
Année 2024

Collectivité: I0260 - COBAS **Eau**

LIBELLE	2023	2024	Ecart %
Recettes liées à la facturation du service	6 591 095	6 724 081	2,02 %
dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)	*6 406 580*	*6 707 330*	
dont variation de la part estimée sur consommations	*184 514*	*16 751*	
Exploitation du service	**6 591 095**	**6 724 081**	**2,02 %**
Produits : part de la collectivité contractante	2 156 977	2 060 890	-4,45 %
dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)	*2 172 760*	*2 119 978*	
dont variation de la part estimée sur consommations	*- 15 783*	*- 59 088*	
Redevance prélèvement (Agence de l'Eau)	334 387	316 016	-5,49 %
dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)	*338 383*	*328 593*	
dont variation de la part estimée sur consommations	*- 3 995*	*- 12 577*	
Redevance de lutte contre la pollution (Agence de l'Eau)	1 588 087	1 518 472	-4,38 %
dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)	*1 613 427*	*1 577 792*	
dont variation de la part estimée sur consommations	*- 25 340*	*- 59 320*	
Redevance Modernisation réseau	2 501	- 180	NS
dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)	*2 501*	*- 180*	
Collectivités et autres organismes publics	**4 081 952**	**3 895 199**	**-4,58 %**
Produits des travaux attribués à titre exclusif	**581 502**	**517 518**	**-11,0 %**
Produits accessoires	**446 196**	**470 597**	**5,47 %**

(1) Cette page contient le détail de la première ligne du CARE (produits hors TVA). 10/03/25

Compte tenu des arrondis effectués pour présenter la valeur sans décimale, le total des produits ci-dessus peut être différent à quelques euros près du total des produits inscrits sur le compte annuel de résultat de l'exploitation.

4.1.3. LE COMPTE D'EXPLOITATION CONVENTIONNEL

Le compte d'Exploitation Conventionnel est le reflet du bilan comptable de l'exercice, des produits et charges de l'exploitant seul. Il permet une comparaison avec le Compte d'Exploitation Prévisionnel, base de la renégociation contractuel de l'avenant N°3. Il est établi à partir des données du CARE.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

COMPTE D'EXPLOITATION CONVENTIONNEL

	REEL 2023	CEP 2024 actualisé	REEL 2024	Variation	Variation REEL/CEP
PRODUITS	**7 618 792 €**	**8 539 174 €**	**7 712 196 €**	**93 404 €**	**- 826 978 €**
Exploitation du service	6 591 095 €	7 337 808 €	6 724 081 €	132 986 €	- 613 728 €
– abonnements	*2 320 641 €*	*2 412 067 €*	*2 439 828 €*	*119 187 €*	*27 760 €*
– part variable (prix au m3)	*4 270 453 €*	*4 925 741 €*	*4 284 253 €*	*13 800 €*	*- 641 488 €*
Travaux attribués à titre exclusif	*581 502 €*	644 919 €	517 518 €	*- 63 984 €*	*- 127 401 €*
Produits accessoires	446 196 €	556 447 €	470 597 €	24 401 €	- 85 849 €

	REEL 2023	CEP 2024 actualisé	REEL 2024	Variation	Variation REEL/CEP
CHARGES	**7 504 300 €**	**8 349 022 €**	**7 499 363 €**	**- 4 937 €**	**- 849 659 €**
Personnel	1 000 520 €	1 208 800 €	953 507 €	- 47 013 €	- 255 293 €
Énergie	407 753 €	443 313 €	490 804 €	83 051 €	47 491 €
Achat d'eau		- €		- €	- €
Réactifs	392 584 €	342 022 €	230 506 €	- 162 078 €	- 111 516 €
Analyses	63 533 €	74 325 €	82 268 €	18 735 €	7 943 €
Sous-traitance	808 103 €	600 170 €	611 709 €	- 196 394 €	11 539 €
Fournitures	72 957 €	134 345 €	79 409 €	6 452 €	- 54 936 €
Entretien et réparations		- €		- €	- €
Autres dépenses d'exploitation dont :	952 322 €	1 024 773 €	1 039 431 €	87 109 €	14 658 €
– télécommunication, postes et télégestion	8 808 €	17 796 €	14 905 €	6 097 €	- 2 891 €
– engins et véhicules	110 653 €	106 654 €	121 558 €	10 905 €	14 905 €
– informatique	616 179 €	697 443 €	695 928 €	79 749 €	- 1 516 €
– assurance	111 878 €	90 050 €	94 074 €	- 17 804 €	4 024 €
– locations	- €	- €	974 €	974 €	974 €
– locaux	104 804 €	112 831 €	111 993 €	7 189 €	- 837 €
Autres frais	607 103 €	676 281 €	771 621 €	164 518 €	95 340 €
Amortissements	1 235 €		665 €	- 570 €	665 €
Impôts locaux et taxes	46 187 €	64 199 €	29 607 €	- 16 580 €	- 34 592 €
Sous-total des charges d'exploitation	***4 352 296 €***	***4 568 228 €***	***4 289 526 €***	***- 62 770 €***	***- 278 702 €***
Sous-total des charges TTE	***405 029 €***	***489 966 €***	***343 982 €***	***- 61 047 €***	***- 145 984 €***
Personnel	55 942 €	151 441 €	71 505 €	15 563 €	- 79 936 €
Sous-traitance	264 368 €	235 795 €	187 352 €	- 77 016 €	- 48 443 €
Fournitures	84 719 €	102 730 €	85 126 €	407 €	- 17 605 €
Redevances contractuelles	170 443 €	213 871 €	148 457 €	- 21 986 €	- 65 413 €
– redevance d'occupation du domaine public	35 676 €	38 327 €	39 320 €	3 644 €	993 €
– redevance pour frais de contrôle		- €	- €	- €	- €
– redevance pour CSD Cabaret	134 767 €	175 544 €	109 138 €	- 25 629 €	- 66 406 €
Contribution des services centraux et recherche (frais de structure et frais généraux)	453 044 €	514 131 €	459 456 €	6 412 €	- 54 676 €
Charges relatives aux investissements	634 456 €	781 856 €	643 973 €	9 517 €	- 137 883 €
Dotation de Gros Entretien et Renouvellement Fond	1 027 874 €	100 609 €	1 230 539 €	202 665 €	1 129 930 €
Dotation de Gros Entretien et Renouvellement Programme		1 119 790 €			
Dotation de Gros Entretien et Renouvellement Prog complémentaire	184 500 €	220 288 €	220 288 €	35 788 €	- €
Dotation Fond de sécurisation des ouvrages du service	115 119 €	119 397 €	119 397 €	4 278 €	- 0 €
Charges relatives aux investissements du domaine privé		- €		- €	- €
Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement	161 539 €	220 885 €	43 744 €	- 117 795 €	- 177 141 €

RÉSULTAT AVANT IMPÔT	114 492 €	190 152 €	212 833 €	98 341 €	22 681 €
Impôt sur les sociétés (calcul normatif)	28 615 €	49 116 €	53 200 €	24 585 €	4 084 €

RÉSULTAT	85 877 €	141 036 €	159 633 €	73 756 €	18 597 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Les principales évolutions des produits et des charges sont les suivantes :

La partie produit a été impactée par une baisse significative des volumes cette année encore -4.1% vs 2023 et nous sommes en écart de -13% de volume vs le CEP.
La progression du K compense la baisse des volumes et la baisse du nombre de branchements neufs réalisés.

La partie charge a été fortement impactée par l'inflation du coût de l'énergie. L'arrêt prolongé de l'usine de cabaret en 2024 a eu pour conséquence la baisse de la consommation de réactifs et de la redevance de CSD.

4.1.4. Le compte annuel de la Société Dédiée : SEEBAS

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

COMPTES ANNUELS

Société : SOCIETE D'EXPLOITATION D'EAU DU BASSIN D'ARCACHON SUD

Forme juridique : Société par actions simplifiée unipersonnelle

Siège social : 18 rue Jehenne 33120 ARCACHON

Date de clôture : 31/12/2024

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Bilan actif

BILAN-ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Concessions,brevets et droits similaires	0	0	0	0
Fonds commercial	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
TOTAL immobilisations incorporelles	***0***	***0***	***0***	***0***
Terrains	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0
Installations techniques, matériel	6 173 206	219 418	5 953 788	5 957 601
Autres immobilisations corporelles	9 277	7 489	1 788	0
Immobilisations en cours	6 481	0	6 481	23 361
Avances et acomptes	0	0	0	0
TOTAL immobilisations corporelles	***6 188 964***	***226 907***	***5 962 057***	***5 980 962***
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	0	0	0	0
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	9 030	0	9 030	8 471
TOTAL immobilisations financières	***9 030***	***0***	***9 030***	***8 471***
Total Actif Immobilisé (II)	***6 197 994***	***226 907***	***5 971 087***	***5 989 433***
Matières premières, approvisionnements	196 742	0	196 742	146 338
En cours de production de biens	1 837	0	1 837	0
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	0	0	0	0
TOTAL Stock	***198 579***	***0***	***198 579***	***146 338***
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
Clients et comptes rattachés	6 487 527	312 977	6 174 551	7 781 252
Autres créances	3 209 450	0	3 209 450	6 540 007
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
TOTAL Créances et divers	***9 696 977***	***312 977***	***9 384 000***	***14 321 259***
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	0	0	0	0
TOTAL Disponibilités	***0***	***0***	***0***	***0***
Charges constatées d'avance	84 906	0	84 906	107 505
Total Actif Circulant (III)	***9 980 462***	***312 977***	***9 667 485***	***14 575 101***
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0		0	0
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Ecarts de conversion actif (VI)	0		0	0
Total Général (I à VI)	***16 178 456***	***539 884***	***15 638 573***	***20 564 534***

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Bilan passif

BILAN-PASSIF			Exercice 2024	Exercice 2023
Capital social ou individuel	dont versé :	100 000	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			0	0
Ecarts de réévaluation	dont écart d'équivalence	0	0	0
Réserve légale			10 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles			0	0
Réserves réglementées	dont réserve des prov. fluctuation des cours :	0	0	0
Autres réserves	dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes :	0	0	0
Report à nouveau			2	2
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			**233 678**	**455 990**
Sous-Total : Situation Nette			***343 680***	***565 992***
Subventions d'investissement			0	0
Provisions réglementées			0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)			***343 680***	***565 992***
Produit des émissions de titres participatifs			0	0
Avances conditionnées			0	0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)			***0***	***0***
Provisions pour risques			110 000	110 000
Provisions pour charges			4 345 070	3 776 221
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)			***4 455 070***	***3 886 221***
Emprunts obligataires convertibles			0	0
Autres emprunts obligataires			0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			27 772	20 959
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs :	0	5 432	33 995
TOTAL Dettes financières			***33 204***	***54 954***
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			342 565	1 508 931
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			1 469 479	1 807 185
Dettes fiscales et sociales			214 382	233 255
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			0	0
Autres dettes			7 186 802	11 230 410
TOTAL Dettes d'exploitation et divers			***9 213 228***	***14 779 781***
Produits constatés d'avance			1 593 391	1 277 586
TOTAL DETTES (IV)			***10 839 822***	***16 112 320***
Ecart de conversion Passif (V)			0	0
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)			***15 638 573***	***20 564 534***

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT			Exercice 2024			Exercice 2023
			France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises			0	0	0	0
Production vendue biens			0	0	0	0
Production vendue services			11 711 944	0	11 711 944	11 846 368
Chiffres d'affaires nets			***11 711 944***	***0***	***11 711 944***	***11 846 368***
Production stockée					1 837	0
Production immobilisée					0	0
Subventions d'exploitation					0	0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges					1 494 928	1 561 413
Autres produits					192 893	3 701
Total des produits d'exploitation (I)					***13 401 602***	***13 411 482***
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					163	0
Variation de stock (marchandises)					0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					0	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					-61 534	-59 143
Autres achats et charges externes					8 444 356	9 728 625
Impôts, taxes et versements assimilés					47 359	62 563
Salaires et traitements					785 514	750 758
Charges sociales					388 730	359 733
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements			584 854	582 896
		dont montant de l'amort. du fonds de commerce			0	0
		Dotations aux provisions			0	0
	Sur actif circulant : dotations aux provisions				0	0
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				2 899	59 844
Autres charges					2 983 327	1 436 963
Total des charges d'exploitation (II)					***13 175 668***	***12 922 239***
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					225 934	489 243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					0	0
Produits financiers de participations					0	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé					0	0
Autres intérêts et produits assimilés					92 984	114 101
Reprises sur provisions et transferts de charges					0	0
Différences positives de change					0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					0	0
Total des produits financiers (V)					***92 984***	***114 101***
Dotations financières aux amortissements et provisions					0	0
Intérêts et charges assimilées					5 465	28 684
Différences négatives de change					0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					0	0
Total des charges financières (VI)					***5 465***	***28 684***
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)					87 519	85 417
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					313 453	574 660

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice 2024	Exercice 2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	0	0
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	67 709
Total des produits exceptionnels (VII)	***0***	***67 709***
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0	9 238
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0	42 353
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0	61
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***0***	***51 653***
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	**0**	**16 057**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	9 113	9 846
Impôts sur les bénéfices (X)	70 662	124 880
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	***13 494 586***	***13 593 292***
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	***13 260 908***	***13 137 301***
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	***233 678***	***455 990***

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

4.2. Situation des biens

4.2.1. Variation du patrimoine immobilier

Cet état retrace les opérations d'acquisition, de cession ou de restructuration d'ouvrages financées par le délégataire, qu'il s'agisse de biens du domaine concédé ou de biens de reprise. En 2024, le patrimoine immobilier n'a pas évolué sur le territoire de la COBAS

4.2.2. Inventaire des biens

L'inventaire au 31 décembre de l'exercice est établi selon les préconisations de la FP2E. Les biens désignés comme biens de retour ou biens de reprise sont ceux expressément désignés comme tels au contrat, conformément au décret 2016-86 du 1er février 2016. S'il y a lieu, l'inventaire distingue les biens propres du délégataire.

4.2.3. Situation des biens

La situation des biens est consultable dans la partie 5 "Données détaillées - Inventaire des installations et réseaux".

Par ce compte rendu, Veolia présente une vue d'ensemble de la situation du patrimoine du service délégué, à partir des constats effectués au quotidien (interventions, inspections, auto-surveillance, astreinte, ...) et d'une analyse des faits marquants, des études disponibles et d'autres informations le cas échéant.
Ce compte rendu permet ainsi à la collectivité, par une connaissance précise des éventuels problèmes, de leur probable évolution et des solutions possibles, de mieux programmer ses investissements.
Les biens dont l'état ou le fonctionnement sont satisfaisants, ou pour lesquels Veolia n'a pas décelé d'indice négatif, et qui à ce titre n'appellent pas ici de commentaire particulier, ne figurent pas dans ce compte rendu.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

4.3. LES INVESTISSEMENTS ET LE RENOUVELLEMENT

Les états présentés permettent de tracer, selon le format prévu au contrat, la réalisation des programmes d'investissement et/ou de renouvellement à la charge du délégataire, et d'assurer le suivi des fonds contractuels d'investissement.
La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée dans l'annexe financière « Les modalités d'établissement du CARE ».

4.3.1. PROGRAMME CONTRACTUEL D'INVESTISSEMENT

Conformément à l'avenant 3, le programme contractuel d'investissement a été finalisé en 2021. Un Fond de travaux de sécurisation a été créé afin d'améliorer le patrimoine de la collectivité.

DÉPENSES RELEVANT D'UN FONDS DE TRAVAUX DE SÉCURISATION:

DATE DES OPERATIONS	NATURE DES OPERATIONS	Heures de personnel	Personnel	Achats de matiere	Sous-traitance	Frais generaux	DEPENSES total	RECETTES	RECETTES - DEPENSES	CUMUL RECETTES - DEPENSES
31/12/2021	DOTATION 2021						-	50 000		
							-			
	Couverture Actiflo			16 951		2 204	19 155			
	Inverseur de source Cazaux Lac			3 512	3 148	457	7 117			
	Inverseur de source Cabaret			19 006	4 722	2 471	26 199			
							-			
TOTAL	ANNEE 2021		-	39 469	7 870	5 131	52 470	50 000	- 2 470	- 2 470
1/1/2022	Actualisation du solde au 31/12/2021							- 115		
31/12/2022	DOTATION 2022							104 667		
	Inverseur de source			2 478		322	2 800			
	2 pompes de Forage secours			20 067		2 609	22 676			
	Colonnes			3 939		512	4 451			
	Mise en place des colonnes				3 900	-	3 900			
	Plateforme Saturateur			5 196	2 007	675	7 879			
	Lot raccord hydraulique pompe de secours			3 825		497	4 322			
	Différentes pièces REXEL			1 080		140	1 221			
	Heures	70	2 955				2 955			
							-			
TOTAL	ANNEE 2022		2 955	36 585	5 907	4 756	50 203	104 552	54 348	51 878
1/1/2023	Actualisation du solde au 31/12/2022							5 181		
31/12/2023	DOTATION 2023							115 119		
TOTAL	ANNEE 2023		-	-	-	-	-	120 300	120 300	172 179
1/1/2024	Actualisation du solde au 31/12/2023							6 399		
31/12/2024	DOTATION 2024							119 397		
	Groupe électrogène Cazaux			41 549		5 401	46 951			
	Inverseur de source			1 980		257	2 237			
	Fourniture Chape groupe Cazaux			662		86	748			
	Mise en service GE Cazaux				530	-	530			
	Différentes pièces REXEL			1 612		210	1 821			
	Heures	52	2 372				2 372			
TOTAL	ANNEE 2024		2 372	45 803	530	5 954	54 659	125 796	71 137	243 316
TOTAL	Toutes années confondues		5 326	121 857	14 307	15 841	157 332	400 648	243 316	243 316

4.3.2. PROGRAMME CONTRACTUEL DE RENOUVELLEMENT

Installations électromécaniques	Renouvelé exercices antérieurs	Renouvelé dans l'exercice
CABARET DES PINS		
FILE BOUES - EXTRACTION / SOUTIRAGE DES BOUES		
APPAREIL DE MESURE PHYSIQUE	2016	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

FILE EAU - ALIMENTATION EAU BRUTE		
DEBITMETRE ARRIVEE CAZAUX_____	2016	
DEBITMETRE ARRIVEE CAZAUX_____	2023	
FILE EAU - DISTRIBUTION EAU TRAITEE		
BALLON ANTI-BELIER DEPART PISSENS	2018	
CAMICAS		
FILE EAU - SURPRESSION		
BALLON HYDROFORT		2024
CAPLANDE		
POMPAGE - ALIMENTATION EAU BRUTE		
COMPTAGE F1		2024
COMPTAGE F2	2016	
DEBITMETRE F2	2023	
CAZAUX LAC		
FILE EAU - TRANSFERT		
DEBITMETRE P1	2016	
DEBITMETRE P2	2016	
DEBITMETRE P3	2017	
DEBITMETRE P4	2017	
CAZAUX-CAONE		
FILE EAU - POMPAGE		
BALLON ANTI-BELIER	2022	
COMPTEUR FORAGE	2019	
DEBITMETRE ALIMENTATION	2022	
DEBITMETRE DISTRIBUTION	2022	
CAZAUX-LIBERATION		
POMPAGE - HYDRAULIQUE		
COMPTEUR ALIMENTATION RESERVOIR	2017	
COMPTEUR DISTRIBUTION	2017	
CPT BALANOS		
CONTRÔLE/COMMANDE - DISTRIBUTION / REPARTITION /		
SUPPORT DE TELETRANSMISSION	2022	
FILE EAU - DISTRIBUTION / REPARTITION / MAILLAGE E		
DEBITMETRE	2022	
CPT BORDEAUX		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

CONTRÔLE/COMMANDE - DISTRIBUTION / REPARTITION /		
SUPPORT DE TELETRANSMISSION	2020	
SUPPORT DE TELETRANSMISSION		2024
FILE EAU - DISTRIBUTION / REPARTITION / MAILLAGE E		
DEBITMETRE		2024
CPT CAMPS		
CONTRÔLE/COMMANDE - DISTRIBUTION / REPARTITION /		
SUPPORT DE TELETRANSMISSION	2016	
SUPPORT DE TELETRANSMISSION		2024
FILE EAU - DISTRIBUTION / REPARTITION / MAILLAGE E		
DEBITMETRE		2024
CPT COMMUNAL		
CONTRÔLE/COMMANDE - DISTRIBUTION / REPARTITION /		
SUPPORT DE TELETRANSMISSION	2022	
FILE EAU - DISTRIBUTION / REPARTITION / MAILLAGE E		
DEBITMETRE	2022	
CPT COTE D'ARGENT		
CONTRÔLE/COMMANDE - DISTRIBUTION / REPARTITION /		
SUPPORT DE TELETRANSMISSION	2022	
FILE EAU - DISTRIBUTION / REPARTITION / MAILLAGE E		
DEBITMETRE	2022	
CPT DANEY		
CONTRÔLE/COMMANDE - DISTRIBUTION / REPARTITION /		
SUPPORT DE TELETRANSMISSION	2020	
CPT DESBIEY		
CONTRÔLE/COMMANDE - DISTRIBUTION / REPARTITION /		
SUPPORT DE TELETRANSMISSION	2022	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

FILE EAU - DISTRIBUTION / REPARTITION / MAILLAGE E		
DEBITMETRE	2022	
CPT DIGNAC		
CONTRÔLE/COMMANDE - DISTRIBUTION / REPARTITION /		
SUPPORT DE TELETRANSMISSION	2022	
FILE EAU - DISTRIBUTION / REPARTITION / MAILLAGE E		
DEBITMETRE	2022	
CPT ETOILE 1 (DN300)		
CONTRÔLE/COMMANDE - DISTRIBUTION / REPARTITION /		
SUPPORT DE TELETRANSMISSION	2020	
CPT ETOILE 2 (DN500)		
CONTRÔLE/COMMANDE - DISTRIBUTION / REPARTITION /		
SUPPORT DE TELETRANSMISSION	2020	
FILE EAU - DISTRIBUTION / REPARTITION / MAILLAGE E		
DEBITMETRE	2017	
DEBITMETRE	2023	
CPT ETOILE PIED RESERVOIR (DN500)		
CONTRÔLE/COMMANDE - DISTRIBUTION / REPARTITION /		
SUPPORT DE TELETRANSMISSION	2020	
FILE EAU - DISTRIBUTION / REPARTITION / MAILLAGE E		
DEBITMETRE	2016	
CPT GAMBETTA		
CONTRÔLE/COMMANDE - DISTRIBUTION / REPARTITION /		
SUPPORT DE TELETRANSMISSION		2024
FILE EAU - DISTRIBUTION / REPARTITION / MAILLAGE E		
DEBITMETRE	2016	
DEBITMETRE		2024

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

CPT LAVOIR		
CONTRÔLE/COMMANDE - DISTRIBUTION / REPARTITION /		
SUPPORT DE TELETRANSMISSION	2022	
FILE EAU - DISTRIBUTION / REPARTITION / MAILLAGE E		
DEBITMETRE	2022	
CPT LECLERC		
CONTRÔLE/COMMANDE - DISTRIBUTION / REPARTITION /		
SUPPORT DE TELETRANSMISSION	2022	
FILE EAU - DISTRIBUTION / REPARTITION / MAILLAGE E		
DEBITMETRE	2022	
CPT MARIOLAN		
CONTRÔLE/COMMANDE - DISTRIBUTION / REPARTITION /		
SUPPORT DE TELETRANSMISSION	2022	
FILE EAU - DISTRIBUTION / REPARTITION / MAILLAGE E		
DEBITMETRE	2022	
CPT MOULIN ROUGE		
CONTRÔLE/COMMANDE - DISTRIBUTION / REPARTITION /		
SUPPORT DE TELETRANSMISSION	2022	
FILE EAU - DISTRIBUTION / REPARTITION / MAILLAGE E		
DEBITMETRE	2022	
CPT MOZART		
CONTRÔLE/COMMANDE - DISTRIBUTION / REPARTITION /		
SUPPORT DE TELETRANSMISSION	2020	
SUPPORT DE TELETRANSMISSION		2024
FILE EAU - DISTRIBUTION / REPARTITION / MAILLAGE E		
DEBITMETRE		2024
CPT PISSENS 1 (DN600)		
CONTRÔLE/COMMANDE - DISTRIBUTION / REPARTITION /		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

SUPPORT DE TELETRANSMISSION	2020	
CPT PISSENS 2 (DN250)		
FILE EAU - DISTRIBUTION / REPARTITION / MAILLAGE E		
DEBITMETRE	2021	
CPT POINT CANAL (FRAGON)		
CONTRÔLE/COMMANDE - DISTRIBUTION / REPARTITION /		
SUPPORT DE TELETRANSMISSION	2022	
FILE EAU - DISTRIBUTION / REPARTITION / MAILLAGE E		
DEBITMETRE	2022	
CPT PÔLE SANTE		
CONTRÔLE/COMMANDE - DISTRIBUTION / REPARTITION /		
SUPPORT DE TELETRANSMISSION	2022	
FILE EAU - DISTRIBUTION / REPARTITION / MAILLAGE E		
DEBITMETRE	2022	
CPT TASSIGNY		
CONTRÔLE/COMMANDE - DISTRIBUTION / REPARTITION /		
SUPPORT DE TELETRANSMISSION	2022	
FILE EAU - DISTRIBUTION / REPARTITION / MAILLAGE E		
DEBITMETRE	2022	
CPT VERDUN		
CONTRÔLE/COMMANDE - DISTRIBUTION / REPARTITION /		
SUPPORT DE TELETRANSMISSION	2020	
SUPPORT DE TELETRANSMISSION		2024
FILE EAU - DISTRIBUTION / REPARTITION / MAILLAGE E		
DEBITMETRE		2024
CPT VIGNES		
CONTRÔLE/COMMANDE - DISTRIBUTION / REPARTITION /		
SUPPORT DE TELETRANSMISSION	2020	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

SUPPORT DE TELETRANSMISSION		2024
FILE EAU - DISTRIBUTION / REPARTITION / MAILLAGE E		
DEBITMETRE	2020	
DEBITMETRE		2024
CPT VILLEMARIE		
CONTRÔLE/COMMANDE - DISTRIBUTION / REPARTITION /		
SUPPORT DE TELETRANSMISSION		2024
FILE EAU - DISTRIBUTION / REPARTITION / MAILLAGE E		
DEBITMETRE		2024
DESBIEY		
CONTROLE / COMMANDE - ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE		
ARMOIRE ELECTRIQUE	2019	
POMPAGE - ALIMENTATION EAU BRUTE		
COMPTEUR	2016	
COMPTEUR	2023	
POMPAGE - HYDRAULIQUE		
BALLON ANTI-BELIER	2017	
HAMEAU DES BARONS		
CONTROLE / COMMANDE - ARMOIRE ELECTRIQUE		
ARMOIRE ELECTRIQUE	2017	
LA HUME		
ENERGIES - ENERGIE ELECTRIQUE		
POSTE TRANSFO CABINE 160 KVA	2017	
POMPAGE - ALIMENTATION EAU BRUTE		
COMPTEUR FORAGE 1	2016	
COMPTEUR FORAGE 1	2023	
POMPAGE - DISTRIBUTION		
COMPTEUR AQUALAND ALLER	2016	
COMPTEUR AQUALAND RETOUR	2016	
COMPTEUR GUJAN	2016	
COMPTEUR LA TESTE	2016	
POMPAGE - HYDRAULIQUE		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

RAMPE DE PULVERISATION	2018	
LA PASSERELLE		
CONTROLE / COMMANDE - ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE		
TELEGESTION	2016	
ENERGIES - ALIMENTATION ELECTRIQUE		
TRANSFORMATEUR	2016	
TRANSFORMATEUR	2017	
POMPAGE - ALIMENTATION EAU BRUTE		
COMPTAGE	2016	
COMPTAGE	2023	
LE GOLF		
FILE EAU - ALIMENTATION / DISTRIBUTION		
DEBITMETRE DOUBLE SENS	2019	
PISSENS		
ENERGIE - PRODUCTION ENERGIE ELEC		
GROUPE ELECTROGENE	2021	
POMPAGE - ALIMENTATION EAU BRUTE		
COMPTAGE	2016	
COMPTAGE	2023	
PISTE 214		
CONTROLE / COMMANDE - ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE		
ARMOIRE ELECTRIQUE	2017	
AUTOMATE	2017	
POMPAGE - DISTRIBUTION		
DEBITMETRE	2019	
POMPAGE - HYDRAULIQUE		
BALLON HYDROFORT	2022	
PROTECTION CATHODIQUE - LE TEICH		
PROTECTION CATHODIQUE - PROTECTION CATHODIQUE		
PROTECTION CATHODIQUE	2018	
REGENERATION FORAGES		
REGENERATION FORAGES		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

REGENERATION PARTIELLE FORAGES Lot 2	2022	
REGENERATION PARTIELLE FORAGES Lot 2	2023	
REGENERATION PARTIELLE FORAGES Lot 2		2024
VILLEMARIE		
CONTROLE / COMMANDE - ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE		
ARMOIRE ELECTRIQUE	2018	
AUTOMATE	2018	
DEMARREUR POMPE FORAGE	2018	
POMPAGE - ALIMENTATION EAU BRUTE		
COMPTEUR	2016	
COMPTEUR	2023	
POMPAGE - DISTRIBUTION		
DEBITMETRE ALIM RESEAU	2017	

Réseaux	**Quantité renouvelée exercices antérieurs**	**Quantité renouvelée dans l'exercice**
BRANCHEMENTS EAU A LA RUE	6536	424
BRANCHEMENTS EAU ISOLES	87	58

4.3.3. Les autres dépenses de renouvellement

Les états présentés dans cette section permettent de suivre les dépenses réalisées dans le cadre d'une obligation en garantie pour la continuité du service ou d'un fonds contractuel de renouvellement.
La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée dans l'annexe financière «Les modalités d'établissement du CARE».

Dépenses relevant d'un fonds de renouvellement

Un fonds de renouvellement a été défini au contrat. Les dépenses et la situation du fonds relatif à l'exercice sont résumées dans les tableaux suivants :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

DATE DES OPERATIONS	NATURE DES OPERATIONS	DEPENSES	RECETTES	RECETTES - DEPENSES	CUMUL RECETTES - DEPENSES
1/1/2016	DOTATION 2016		246 557,00 €		
TOTAL	ANNEE 2016	97 478,00 €	246 557,00 €	149 079,00 €	149 079,00 €
1/1/2017	Actualisation du solde au 31/12/2016		-877,03 €		
1/1/2017	DOTATION 2017		245 106,51 €		
TOTAL	ANNEE 2017	272 326,00 €	244 229,48 €	-28 096,52 €	120 982,48 €
1/1/2018	Actualisation du solde au 31/12/2017		941,46 €		
1/1/2018	DOTATION 2018		247 013,87 €		
TOTAL	ANNEE 2018	157 643,00 €	247 955,33 €	90 312,33 €	211 294,81 €
1/1/2019	Actualisation du solde au 31/12/2018		6 368,67 €		
1/1/2019	DOTATION 2019		254 459,15 €		
TOTAL	ANNEE 2019	127 424,00 €	260 827,82 €	133 403,82 €	344 698,63 €
1/1/2020	Actualisation du solde au 31/12/2019		7 051,95 €		
1/1/2020	DOTATION 2020		259 664,96 €		
TOTAL	ANNEE 2020	86 351,00 €	266 716,91 €	180 365,91 €	525 064,54 €
1/1/2021	Actualisation du solde du 31/12/2020		1 588,91 €		
1/1/2021	DOTATION 2021		84 264,06 €		
TOTAL	ANNEE 2021	87 482,00 €	85 852,97 €	-1 629,03 €	523 435,51 €
1/1/2022	Actualisation du solde du 31/12/2021		24 068,05 €		
1/1/2022	DOTATION 2022		88 138,60 €		
TOTAL	ANNEE 2022	211 044,00 €	112 206,65 €	-98 837,35 €	424 598,16 €
1/1/2023	Actualisation du solde du 31/12/2022		41 206,18 €		
1/1/2023	DOTATION 2023		96 692,23 €		
TOTAL	ANNEE 2023	275 762,00 €	137 898,41 €	-137 863,59 €	286 734,57 €
1/1/2024	Actualisation du solde du 31/12/2023		10 511,80 €		
1/1/2024	DOTATION 2024		100 237,01 €		
TOTAL	ANNEE 2024	320 537,00 €	110 748,81 €	-209 788,19 €	76 946,38 €
TOTAL	Toutes années confondues	1 636 047,00 €	1 712 993,38 €	76 946,38 €	

4.4. LES ENGAGEMENTS À INCIDENCE FINANCIÈRE

Ce chapitre a pour objectif de présenter les engagements liés à l'exécution du service public et qui, à ce titre, peuvent entraîner des obligations financières entre Veolia, actuel délégataire de service, et toute entité (publique ou privée) qui pourrait être amenée à reprendre à l'issue du contrat l'exécution du service. Ce chapitre constitue pour les élus un élément de transparence et de prévision.
Conformément aux préconisations de l'Ordre des Experts Comptables, ce chapitre ne présente que les « engagements significatifs, sortant de l'ordinaire, nécessaires à la continuité du service, existant à la fin de la période objet du rapport, et qui à la fois devraient se continuer au-delà du terme normal de la convention de délégation et être repris par l'exploitant futur ».
Afin de rester simples, les informations fournies ont une nature qualitative. A la demande de la collectivité, et en particulier avant la fin du contrat, Veolia pourra détailler ces éléments.

4.4.1. FLUX FINANCIERS DE FIN DE CONTRAT

Les flux financiers de fin de contrat doivent être anticipés dans les charges qui s'appliqueront immédiatement à tout nouvel exploitant du service. Sur la base de ces informations, il est de la responsabilité de la collectivité, en qualité d'entité organisatrice du service, d'assurer la bonne prise en compte de ces contraintes dans son cahier des charges.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

RÉGULARISATIONS DE TVA

Si Veolia a assuré pour le compte de la collectivité la récupération de la TVA au titre des immobilisations (investissements) mises à disposition[1], deux cas se présentent :
Le nouvel exploitant est assujetti à la TVA[2] : aucun flux financier n'est nécessaire. Une simple déclaration des montants des immobilisations, dont la mise à disposition est transférée, doit être adressée aux Services de l'Etat.
Le nouvel exploitant n'est pas assujetti à la TVA : l'administration fiscale peut être amenée à réclamer à Veolia la part de TVA non amortie sur les immobilisations transférées. Dans ce cas, le repreneur doit s'acquitter auprès de Veolia du montant dû à l'administration fiscale pour les immobilisations transférées, et simultanément faire valoir ses droits auprès du Fonds de Compensation de la TVA. Le cahier des charges doit donc imposer au nouvel exploitant de disposer des sommes nécessaires à ce remboursement.

BIENS DE RETOUR

Les biens de retour (listés dans l'inventaire détaillé des biens du service) sont remis gratuitement à la collectivité à l'échéance du contrat selon les modalités prévues au contrat.

BIENS DE REPRISE

Les biens de reprise (listés dans l'inventaire détaillé des biens du service) seront remis au nouvel exploitant, si celui-ci le souhaite, à l'échéance du contrat selon les modalités prévues au contrat. Ces biens doivent généralement être achetés par le nouvel exploitant.

AUTRES BIENS OU PRESTATIONS

Hormis les biens de retour et les biens de reprise prévus au contrat, Veolia utilise, dans le cadre de sa liberté de gestion, certains biens et prestations. Le cas échéant, sur demande de la collectivité et selon des conditions à déterminer, les parties pourront convenir de leur mise à disposition auprès du nouvel exploitant.

CONSOMMATIONS NON FACTURÉES ET RECOUVREMENT DES SOMMES DUES AU DÉLÉGATAIRE À LA FIN DU CONTRAT

Les sommes correspondantes au service exécuté jusqu'à la fin du contrat sont dues au délégataire sortant. La continuité de service est à privilégier (maintien des calendriers de facturation ou de mensualisation jusqu'à l'échéance du contrat). Il y a donc lieu de définir avec la collectivité les modalités de facturation et de recouvrement des sommes dues ainsi que les modalités de reversement des encaissements qui s'imposeront le cas échéant au nouvel exploitant : part ancien contrat en prorata temporis, reprise des soldes de mensualisation des comptes clients. L'introduction de relevés spécifiques, notamment si le contrat se termine après une facturation d'acompte, peut être une option à considérer.

4.4.2. DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL

[1] art. 210 de l'annexe II du Code Général des Impôts

[2] Conformément au principe posé par le nouvel article 257 bis du Code Général des Impôts précisé par l'instruction 3 A 6 36 parue au BOI N°50 du 20 Mars 2006 repris dans le BOFiP (BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10)

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Les dispositions applicables au personnel du délégataire sortant s'apprécient dans le contexte de la période de fin de contrat. Les engagements qui en découlent pour le nouvel exploitant ne peuvent pas faire ici l'objet d'une présentation totalement exhaustive, pour deux motifs principaux :

- ils évoluent au fil du temps, au gré des évolutions de carrière, des aléas de la vie privée des agents et des choix d'organisation du délégataire ;
- ils sont soumis à des impératifs de protection des données personnelles.

Veolia propose de rencontrer la collectivité sur ce sujet pour inventorier les contraintes qui s'appliqueront en fin de contrat.

DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES APPLICABLES AUX SALARIÉS DE SEEBAS

Les salariés de Veolia bénéficient :

- des dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises des Services d'Eau et d'Assainissement du 12 avril 2000 ;
- des dispositions de l'accord interentreprises de l'Unité Economique et Sociale " Veolia - Générale des Eaux " du 12 novembre 2008 qui a pris effet au 1er janvier 2009, d'accords conclus dans le cadre de cette Unité Economique et Sociale et qui concernent notamment : l'intéressement et la participation, le temps de travail des cadres, la protection sociale (retraite, prévoyance, handicap, formation) et d'accords d'établissement, usages et engagements unilatéraux.

PROTECTION DES SALARIÉS ET DE L'EMPLOI EN FIN DE CONTRAT

Des dispositions légales assurent la protection de l'emploi et des salariés à l'occasion de la fin d'un contrat, lorsque le service est susceptible de changer d'exploitant, que le futur exploitant ait un statut public ou privé. A défaut, il est de la responsabilité de la collectivité de prévoir les mesures appropriées.
Lorsque l'entité sortante constitue une entité économique autonome, c'est-à-dire comprend des moyens corporels (matériel, outillage, marchandises, bâtiments, ateliers, terrains, équipements), des éléments incorporels (clientèle, droit au bail, etc.) et du personnel affecté, le tout organisé pour une mission identifiée, l'ensemble des salariés qui y sont affectés sont automatiquement transférés au nouvel exploitant, qu'il soit public ou privé (art. L 1224-1 du Code du Travail).
Dans cette hypothèse, Veolia transmettra à la collectivité, à la fin du contrat, la liste des salariés affectés au contrat ainsi que les éléments d'information les concernant (en particulier la masse salariale correspondante).
Le statut applicable à ces salariés au moment du transfert et pendant les trois mois suivants est celui en vigueur chez Veolia. Au-delà de ces trois mois, le statut Veolia est soit maintenu pendant une période de douze mois maximum, avec maintien des avantages individuels acquis au-delà de ces douze mois, soit aménagé au statut du nouvel exploitant.
Lorsque l'entité sortante ne constitue pas une entité économique autonome mais que le nouvel exploitant entre dans le champ d'application de la Convention collective Nationale des entreprises d'eau et d'assainissement d'avril 2000, l'application des articles 2.5.2 ou 2.5.4 de cette Convention s'impose tant au précédent délégataire qu'au nouvel exploitant avant la fin de la période de 12 mois.

A défaut d'application des dispositions précitées, seule la collectivité peut prévoir les modalités permettant la sauvegarde des emplois correspondant au service concerné par le contrat de délégation qui s'achève. Veolia se tient à la disposition de la collectivité pour fournir en amont les informations nécessaires à l'anticipation de cette question.

En tout état de cause, d'un point de vue général, afin de clarifier les dispositions applicables et de protéger l'emploi, nous proposons de préciser avec la collectivité avant la fin du contrat, le cadre dans lequel sera géré

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

le statut des salariés et la protection de l'emploi à la fin du contrat. Il est utile que ce cadre soit précisé dans le cahier des charges du nouvel exploitant.

La liste nominative des agents[3] affectés au contrat peut varier en cours de contrat, par l'effet normal de la vie dans l'entreprise : mutations, départs et embauches, changements d'organisation, mais aussi par suite d'événements de la vie personnelle des salariés. Ainsi, la liste nominative définitive ne pourra être constituée qu'au cours des dernières semaines d'exécution du contrat.

COMPTES ENTRE EMPLOYEURS SUCCESSIFS

Les dispositions à prendre entre employeurs successifs concernant le personnel transféré sont les suivantes :

- de manière générale, dispositions identiques à celles appliquées en début du contrat ;
- concernant les salaires et notamment les salaires différés : chaque employeur supporte les charges afférentes aux salaires (et les charges sociales ou fiscales directes ou indirectes y afférant) rattachables à la période effective d'activité dont il a bénéficié ; le calcul est fait sur la base du salaire de référence ayant déterminé le montant de la charge mais plafonné à celui applicable au jour de transfert : ce compte déterminera notamment les prorata 13ème mois, de primes annuelles, de congés payés, décomptes des heures supplémentaires ou repos compensateurs, …. ;
- concernant les autres rémunérations : pas de comptes à établir au titre des rémunérations différées dont les droits ne sont exigibles qu'en cas de survenance d'un événement ultérieur non encore intervenu : indemnité de départ à la retraite, droits à des retraites d'entreprises à prestations définies, médailles du travail, etc.

[3] Certaines informations utiles ont un caractère confidentiel et n'ont pas à figurer dans le rapport annuel qui est un document public. Elles pourront être fournies, dans le respect des droits des personnes intéressées, séparément à l'autorité délégante, sur sa demande justifiée par la préparation de la fin de contrat.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

4.5. ANNEXES FINANCIÈRES

LES MODALITÉS D'ÉTABLISSEMENT DU CARE

Introduction générale

Les articles R 3131-2 à R 3131-4 du Code de la Commande Publique fournissent des précisions sur les données devant figurer dans le Rapport Annuel du Délégataire prévu à l'article L 3131-5 du même Code, et en particulier sur le Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation (CARE) de la délégation.

Le CARE établi au titre de 2024 respecte ces principes. La présente annexe fournit les informations relatives à ses modalités d'établissement.

Pour la réalisation de son activité, à savoir l'exécution du contrat de délégation de service public de l'eau de la COBAS, la Société SEEBAS dispose de moyens propres. Elle bénéficie par ailleurs de l'assistance de Veolia Eau, au sein duquel Veolia Eau a mutualisé un certain nombre de compétences.

Cette assistance s'exerce en particulier dans les domaines suivants : administration et gestion du personnel, gestion administrative comptable et financière, informatique, gestion clientèle, assistance juridique, locaux et assurance, assistance technique et opérationnelle.

Le compte annuel de résultat de l'exploitation relatif à un contrat de délégation de service public, établi sous la responsabilité de la Société délégataire, regroupe l'ensemble des produits et des charges imputables à ce contrat, selon les règles exposées ci-dessous.

La présente annexe a pour objet de préciser les modalités de détermination de ces produits et de ces charges.

Faits Marquants

A l'écoute de ses clients et des consommateurs, Veolia Eau est convaincu que si l'eau est au cœur des grands défis du 21ème siècle, il convient aussi d'être très attentif à la quête grandissante de transparence, de proximité, d'implication des collectivités ainsi qu'à la recherche constante d'efficacité et de qualité.

L'organisation de Veolia Eau selon une logique "gLocale" répond à ces enjeux. Elle permet à la fois de partager le meilleur de ce que peut apporter un grand groupe en matière de qualité, d'innovation, de solutions et d'investissements (« global »); mais aussi en s'appuyant sur 57 « Territoires », avec des moyens renforcés pour l'exploitation, toujours plus ancrés dans les territoires et avec un réel pouvoir de décision (« local »). 9 Régions viennent quant à elle assumer un rôle de coordination et de mutualisation au bénéfice des Territoires.

Les moyens du Groupe ont été alloués aux différents niveaux en fonction des missions qui leur sont confiées : coordination et mutualisation pour les Régions, proximité, opérations et développement pour les Territoires, exécution opérationnelle pour les Services Locaux.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

La Société SEEBAS, tout en respectant les engagements contractuels qu'elle a pris concernant son organisation locale, bénéficie de sa proximité avec le Territoire Atlantique de la Région Sud-Ouest et du concours que ceux-ci peuvent lui apporter.

1. Produits

Les produits inscrits dans le compte annuel de résultat de l'exploitation regroupent l'ensemble des produits d'exploitation hors TVA comptabilisés en application du contrat, y compris ceux des travaux attribués à titre exclusif.

En ce qui concerne les activités de distribution d'eau, ces produits se fondent sur les volumes distribués de l'exercice, valorisés en prix de vente. A la clôture de l'exercice, une estimation s'appuyant sur les données de gestion est réalisée et comptabilisée sur la part des produits non relevés et/ou non facturés à la fin du mois de Novembre. Les éventuels écarts avec les facturations sont comptabilisés dans les comptes de l'année suivante. Les dégrèvements (dont ceux consentis au titre de la loi dite « Warsmann » du 17 mai 2011 qui fait obligation à la Société d'accorder - dans certaines conditions - des dégrèvements aux usagers ayant enregistré des surconsommations d'eau du fait de fuites sur leurs installations après compteur) sont quant à eux portés en minoration des produits d'exploitation de l'année où ils sont accordés.

S'agissant des produits des travaux attribués à titre exclusif, ils correspondent aux montants comptabilisés en application du principe de l'avancement.

Le détail des produits annexé au compte annuel du résultat de l'exploitation fournit une ventilation des produits entre les produits facturés au cours de l'exercice et ceux résultant de la variation de la part estimée des consommations.

2. Charges

Les charges inscrites dans le compte annuel du résultat de l'exploitation englobent l'ensemble des charges imputables au contrat.

Le montant de ces charges résulte soit directement de dépenses inscrites en comptabilité soit de calculs à caractère économique (charges calculées § 2.2).

2.1 Dépenses courantes d'exploitation

Il s'agit des dépenses de personnel imputées directement, d'énergie électrique, d'achats d'eau, de produits de traitement, d'analyses, des redevances contractuelles et obligatoires, de la Contribution Foncière des Entreprises et de certains impôts locaux, etc.

En cours d'année, les imputations directes de dépenses de personnel opérationnel au contrat ou au chantier sont valorisées suivant un coût standard par catégorie d'agent qui intègre également une quote-part de frais « d'environnement » (véhicule, matériel et outillage, frais de déplacement, encadrement de proximité…). En fin d'année, l'écart entre le montant réel des dépenses engagées au niveau du Service Local dont dépendent les agents et le coût standard imputé fait l'objet d'une répartition au prorata des heures imputées sur les contrats du Service Local. Cet écart est ventilé selon sa nature sur trois rubriques des CARE (personnel, véhicules, autres charges).

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

2.2 Charges calculées

Un certain nombre de charges doivent faire l'objet d'un calcul économique. Les éléments correspondants résultent de l'application du principe selon lequel : "Pour que les calculs des coûts et des résultats fournissent des valeurs correctes du point de vue économique…, il peut être nécessaire en comptabilité analytique, de substituer à certaines charges enregistrées en comptabilité générale selon des critères fiscaux ou sociaux, les charges correspondantes calculées selon des critères techniques et économiques" (voir note 1 ci-après).

Ces charges concernent principalement les éléments suivants :

Charges relatives au renouvellement :
Les charges économiques calculées relatives au renouvellement sont présentées sous des rubriques distinctes en fonction des clauses contractuelles (y compris le cas échéant au sein d'un même contrat).

- Programme contractuel

Cette rubrique est renseignée lorsque la Société s'est contractuellement engagée à réaliser un programme prédéterminé de travaux de renouvellement selon les priorités que la Collectivité s'est fixée.

La charge économique portée dans le compte annuel de résultat de l'exploitation est alors calculée en additionnant :

- d'une part le montant, réactualisé à la fin de l'exercice considéré, des renouvellements déjà effectués depuis le début de la période contractuelle en cours (voir note 2 ci-après) ;
- d'autre part, le montant des renouvellements contractuels futurs jusqu'à la fin de cette même période ;

et en divisant le total ainsi obtenu par la durée de la période contractuelle en cours.

- Fonds contractuel de renouvellement

Cette rubrique est renseignée lorsque la Société est contractuellement tenue de prélever tous les ans sur ses produits un certain montant et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d'un suivi pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel délimitant les obligations des deux parties est alors établi. C'est le montant correspondant à la définition contractuelle qui est repris dans cette rubrique.

Charges relatives aux investissements :
Les investissements financés par le délégataire sont pris en compte dans le compte annuel du résultat de l'exploitation, sous forme de redevances permettant d'étaler leur coût financier total :

- pour les biens appartenant au délégataire (biens propres et en particulier les compteurs du domaine privé) : sur leur durée de vie économique puisqu'ils restent lui appartenir indépendamment de l'existence du contrat ;
- pour les investissements contractuels (biens de retour) : sur la durée du contrat puisqu'ils ne servent au délégataire que pendant cette durée.

Le montant de ces redevances résulte d'un calcul actuariel permettant de reconstituer, sur ces durées et en euros constants, le montant de l'investissement initial.

S'agissant des compteurs, ce dernier comprend, depuis 2008, les frais de pose valorisés par l'application de critères opérationnels et qui ne sont donc en contrepartie plus compris dans les charges de l'exercice.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

L'étalement de ce coût financier global obéit aux règles suivantes :

- pour les investissements antérieurs à 2021, les redevances évoquées ci-dessus respectent une progressivité prédéterminée et constante (+1,5% par an) d'une année sur l'autre de la redevance attachée à un investissement donné. Le taux financier retenu est calculé à partir du Taux Moyen des Emprunts d'Etat en vigueur l'année de réalisation de l'investissement, majoré d'une marge. Un calcul financier spécifique garantit la neutralité actuarielle de la progressivité de 1,5% indiquée ci-dessus ;

- pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021, ces redevances prennent la forme d'une annuité constante et non plus progressive. Le taux financier retenu est déterminé en tenant compte des conditions de financement de l'année en cours. Le taux annuel de financement est fixé à 2,25% pour les investissements réalisés en 2021, 3,90% pour l'année 2022, 5,35% pour l'année 2023 et 5,30% pour les investissements réalisés en 2024.

Toutefois, par dérogation avec ce qui précède, et pour tous les contrats prenant effet à compter du 1er janvier 2015, la redevance peut reprendre le calcul arrêté entre les parties lors de la signature du contrat.

Enfin, et compte tenu de leur nature particulière, les biens immobiliers du domaine privé font l'objet d'un calcul spécifique comparable à l'approche retenue par les professionnels du secteur. Le montant de la redevance initiale attachée à un bien est pris égal à 7% du montant de l'investissement immobilier (terrain + constructions + agencements du domaine privé) puis est ajusté chaque année de l'évolution de l'indice du coût de la construction. Les agencements pris à bail donnent lieu à un calcul similaire.

- Investissements du domaine privé

Hormis le parc de compteurs relevant du domaine privé du délégataire (avec une redevance portée sur la ligne « Charges relatives aux compteurs du domaine privé ») et quelques cas où Veolia Eau ou ses filiales sont propriétaires d'ouvrages de production (avec une redevance alors portée sur la ligne « Charges relatives aux investissements du domaine privé »), les redevances attachées aux biens du domaine privé sont portées sur les lignes correspondant à leur affectation (la redevance d'un camion hydro cureur sera affectée sur la ligne « engins et véhicules », celle relative à un ordinateur à la ligne « informatique »…).

2.3 Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement

Cette rubrique reprend essentiellement les pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables, comptabilisées au cours de l'exercice. Celles-ci peuvent être enregistrées plusieurs années après l'émission des factures correspondantes compte tenu des délais notamment administratifs nécessaires à leur constatation définitive. Elle ne traduit par conséquent qu'avec un décalage dans le temps l'évolution des difficultés liées au recouvrement des créances.

2.4 Impôt sur les sociétés

L'impôt calculé correspond à celui qui serait dû par une entité autonome, en appliquant au résultat brut bénéficiaire, le taux en vigueur de l'impôt sur les sociétés.

Dans un souci de simplification, le taux normatif retenu en 2024 correspond au taux normal de l'impôt sur les sociétés applicable aux entreprises soit 25%, hors contribution sociale additionnelle de 3,3%.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

2.5 Charges d'encadrement, de structure, d'assistance, de support, d'assistance des services centraux [REDIGER SELON LES CAS]

Comme rappelé en préambule de la présente annexe, la Société bénéficie du support de Veolia Eau au travers de services rendus par VE-CGE.

Ainsi, dans le cadre de conventions spécifiques, VE-CGE réalise les prestations suivantes au profit de la Société:

- **Assistance générale**
- **Finance et comptabilité**
- **Paie et ressources humaines**
- **Informatique, bureautique et accès au réseau**
- **Gestion juridique et contractuelle**
- **Gestion des achats et approvisionnements**
- **Assistance technique et exploitation**
- **Gestion et relation clientèle**

2.6 Autres charges

2.6.1 Valorisation des travaux réalisés dans le cadre d'un contrat de délégation de service public (DSP)

Pour valoriser les travaux réalisés dans le cadre d'un contrat de DSP, une quote-part de frais de structure est calculée sur la dépense brute du chantier. Cette disposition est applicable à l'ensemble des catégories de travaux relatifs aux délégations de service public (production immobilisée, travaux exclusifs, travaux de renouvellement), hors frais de pose des compteurs. Par exception, la quote-part est réduite à la seule composante « frais généraux » si la prestation intellectuelle est comptabilisée séparément. De même, les taux forfaitaires de maîtrise d'œuvre et de gestion contractuelle des travaux ne sont pas automatiquement

applicables aux opérations supérieures à 500 K€. Ces prestations peuvent alors faire l'objet d'un calcul spécifique.

L'objectif de cette approche est de prendre en compte les différentes prestations intellectuelles associées réalisées en interne (maîtrise d'œuvre en phase projet et en phase chantier, gestion contractuelle imposée par le contrat DSP : suivi des programmes pluriannuels, planification annuelle des chantiers, reporting contractuel et réglementaire, mises à jour des inventaires,...).

La quote-part de frais ainsi attribuée aux différents chantiers est portée en diminution des charges indirectes réparties selon les règles exposées au § 2.5 (de même que la quote-part « frais généraux » affectée aux chantiers hors DSP sur la base de leurs dépenses brutes ou encore que la quote-part de 5% appliquée aux achats d'eau en gros).

2.6.2 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

Les charges de personnel indiquées dans les comptes annuels de résultat de l'exploitation comprennent la participation des salariés acquittée par la Société en 2024 au titre de l'exercice 2023.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

2.7 Autres informations

Au-delà des charges économiques calculées présentées ci-dessus et substituées aux charges enregistrées en comptabilité générale, la Société a privilégié, pour la présentation de ses comptes annuels de résultat de l'exploitation, une approche selon laquelle les risques liés à l'exploitation – et notamment les risques sur créances impayées mentionnées au paragraphe 2.3, qui donnent lieu à la constatation de provisions pour risques et charges ou pour dépréciation en comptabilité générale – sont pris en compte pour leur montant définitif au moment de leur concrétisation. Les dotations et reprises de provisions relatives à ces risques ou dépréciation en sont donc exclues.

Notes :

1. *Texte issu de l'ancien Plan Comptable Général de 1983, et dont la refonte opérée en 1999 ne traite plus des aspects relatifs à la comptabilité analytique.*
2. *Compte tenu des informations disponibles, pour les périodes contractuelles ayant débuté avant 1990, le montant de la garantie de renouvellement est calculé selon le même principe d'étalement linéaire, en considérant que le point de départ de ces périodes se situe au 1er janvier 2016.*

Toulouse, le 29 avril 2025

Jérôme NATTA
Directeur Régional Sud-Ouest

DocuSigned by:
Jérôme NATTA
AE03FCFC14EA468...

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

DÉTAIL DES BIENS RENOUVELÉS ET VALORISÉS DANS LE CADRE DU COMPTE DE RENOUVELLEMENT

Détail des opérations imputées sur le fonds en 2024:

Ensemble Technique	NATURE DES OPERATIONS	Heures de personnel	Personnel	Achats de matiere	Sous-traitance	Frais generaux	DEPENSES total
CABARET DES PINS	CAG FILTRE 2	-	-	- 20		- 3	- 23
CABARET DES PINS	COLONNE DE FORAGE	7	319	-	13 270	42	13 631
CABARET DES PINS	COMPTEUR PISSENS	14	639	1 853		324	2 815
CABARET DES PINS	CONDUITE	14	639	-	3 853	83	4 575
CABARET DES PINS	CONVOYEUR / TRANS	4	182	1 034		158	1 375
CABARET DES PINS	DEBITMETRE ETOILE	14	639	1 853		324	2 815
CABARET DES PINS	DEBITMETRE OZONE	7	319	2 226		331	2 876
CABARET DES PINS	TREMIE	7	319	5 199		717	6 236
CABARET PINS	CAG FILTRE BICOUCHE 3	7	319	63 712		8 324	72 355
CABARET PINS	CLAPET - PPE HOPC200	8	365	1 284		214	1 863
CABARET PINS	COLLECT REFOUL LTB	7	319	-	3 510	42	3 871
CABARET PINS	DEVOUT SILO CHAUX 1	7	319	2 930	66	422	3 738
CABARET PINS	FILE EAU - DISTRI ET	14	639	1 671		300	2 610
CABARET PINS	PRODUITS DE TRAITEMEN	7	319	63 712		8 324	72 355
CABARET PINS	VIS DOS MICROSABLE	7	319	744		138	1 201
CABARET	PPE EAU CHAUX AJUSTEMENT 3	14	639	0		83	722
CAZAUX LAC	VARIATEUR P4	7	319	986		170	1 475
CPT FUSILLE	DEBITMETRE	7	319	1 241		203	1 763
CPT FUSILLE	SUPPORT DE TELETRANS	4	182	779		125	1 086
CPT GERVAIS	DEBITMETRE	7	319	1 241		203	1 763
CPT GERVAIS	SUPPORT DE TELETRANS	4	182	779		125	1 086
DIVERS RESEAU	200 SONDES GUTTERMAN	-	-	74 630		9 702	84 332
DIVERS RESEAU	RENOUV 2 VENTOUSES 2	-	-	378		49	427
RESEAU	50 CAPTEURS SURVEILLANCE PI	-	-	15 789	5 040	2 053	22 882
PISSENS	TUBING CHLORE PVDF	7	319	1 850		282	2 451
GRANGENEUVE	CLOTURE	13	593	3 173		490	4 255
LA PASSERELLE	VARIATEUR FREQUENCE	-	-	-	596	-	596
DIVERS RESEAU	VANNE DN100 RUE JEHE	-	-	-	2 548	-	2 548
RESEAU	VANNE DN150 AV CHÊNES VERT	14	639	-	2 136	83	2 858
			-			-	-
			-			-	-
TOTAL		**201**	**9 168**	**247 042**	**31 020**	**33 307**	**320 537**

AVIS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

La Société a demandé à un Co-Commissaire aux Comptes de Veolia d'établir un avis sur la procédure d'établissement de ses CARE. Une copie de cet avis est disponible sur simple demande de la collectivité.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

5. DONNEES DETAILLEES

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

5.1. LE PRIX DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU

En France, l'intégralité des coûts du service public est supportée par la facture d'eau. La facture type de 120m^3 représente l'équivalent de la consommation d'eau d'une année pour un ménage de 3 à 4 personnes.

A titre indicatif sur la commune de ARCACHON, l'évolution du prix du service de l'eau (redevances comprises, mais hors assainissement) par m^3 **[D102.0]** pour 120 m^3, au tarif en vigueur au 1er janvier, est la suivante :

ARCACHON **Prix du service de l'eau potable**	Volume	Prix Au 01/01/2025	Montant Au 01/01/2024	Montant Au 01/01/2025	N/N-1
Part délégataire			**136,83**	**136,83**	**0,00%**
Abonnement			38,74	38,74	0,00%
Consommation	120	0,8174	98,09	98,09	0,00%
Part syndicale			**42,77**	**42,77**	**0,00%**
Abonnement			13,26	13,26	0,00%
Consommation	120	0,2459	29,51	29,51	0,00%
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau) *	**120**	**0,1039**	**7,20**	**12,47**	**73,19%**
Organismes publics			**39,60**	**46,80**	**18,18%**
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120		39,60		
Consommation d'eau Potable	120	0,3200		38,40	
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0700		8,40	
Total € HT			**226,40**	**238,87**	**5,51%**
TVA			12,45	13,14	5,54%
Total TTC			**238,85**	**252,01**	**5,51%**
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3			**1,99**	**2,10**	5,53%

(*) A partir du 1/1/2025, et conformément à l'arrêté du 2 octobre 2024 modifiant l'arrêté du 10 juillet 1996, la redevance "Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)" figurera bien dans la rubrique "Organismes publics" de la facture transmise aux usagers. Pour des facilités de comparaison pour les besoins du RAD 2024, elle n'a pas été déplacée cette année. Elle sera réintégrée dans la bonne rubrique à partir du RAD 2025.

Le graphique ci-dessous présente la répartition du prix pour 120 m^3 pour la commune de ARCACHON:

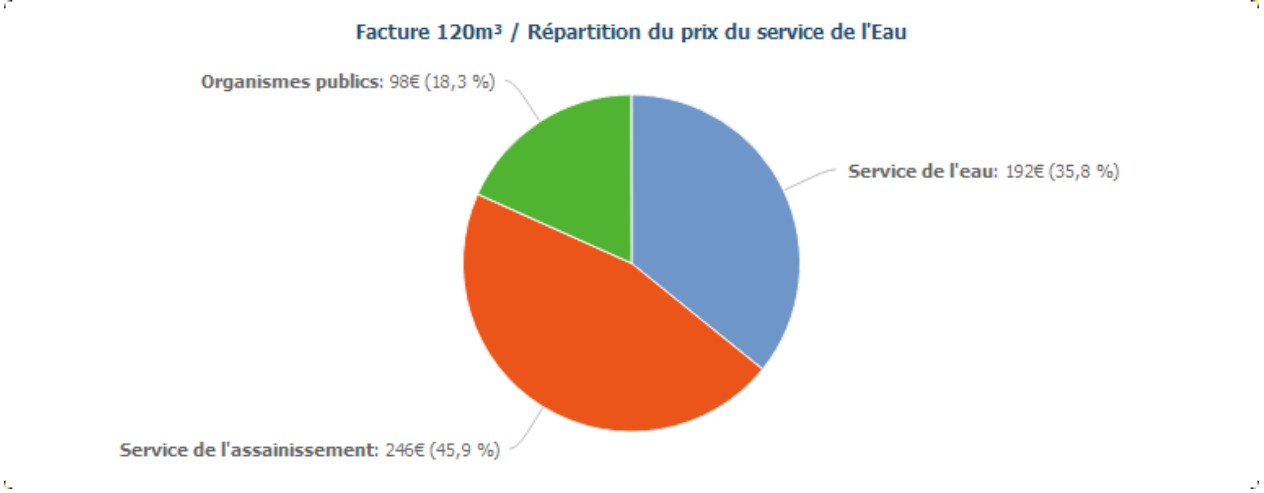

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

LA FACTURE 120 M³ DE CHAQUE COMMUNE

ARCACHON	m³	Prix au 01/01/2025	Montant au 01/01/2024	Montant au 01/01/2025	N/N-1
Production et distribution de l'eau			**186,80**	**192,07**	**2,82%**
Part délégataire			**136,83**	**136,83**	**0,00%**
Abonnement			38,74	38,74	0,00%
Consommation	120	0,8174	98,09	98,09	0,00%
Part syndicale			**42,77**	**42,77**	**0,00%**
Abonnement			13,26	13,26	0,00%
Consommation	120	0,2459	29,51	29,51	0,00%
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau) *	**120**	**0,1039**	**7,20**	**12,47**	**73,19%**
Collecte et dépollution des eaux usées			**246,32**	**246,32**	**0,00%**
Part délégataire			**138,22**	**135,82**	**-1,74%**
Abonnement			13,78	13,54	-1,74%
Consommation	120	1,0190	124,44	122,28	-1,74%
Part syndicale			**108,10**	**110,50**	**2,22%**
Abonnement			44,50	44,50	0,00%
Consommation	120	0,5500	63,60	66,00	3,77%
Organismes publics et TVA			**109,68**	**98,43**	**-10,26%**
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120		39,60		
Modernisation du réseau de collecte	120		30,00		
Consommation d'eau Potable	120	0,3200		38,40	
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0700		8,40	
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,1050		12,60	
TVA			40,08	39,03	-2,62%
TOTAL € TTC			**542,80**	**536,82**	**-1,10%**

(*) A partir du 1/1/2025, et conformément à l'arrêté du 2 octobre 2024 modifiant l'arrêté du 10 juillet 1996, la redevance "Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)" figurera bien dans la rubrique "Organismes publics et TVA" de la facture transmise aux usagers. Pour des facilités de comparaison pour les besoins du RAD 2024, elle a été maintenue pour cette année dans la rubrique "Production et distribution de l'eau" dans le tableau de présentation de la facture du RAD. Elle sera réintégrée dans la bonne rubrique à partir du RAD 2025.

GUJAN MESTRAS	m³	Prix au 01/01/2025	Montant au 01/01/2024	Montant au 01/01/2025	N/N-1
Production et distribution de l'eau			**186,80**	**192,07**	**2,82%**
Part délégataire			**136,83**	**136,83**	**0,00%**
Abonnement			38,74	38,74	0,00%
Consommation	120	0,8174	98,09	98,09	0,00%
Part syndicale			**42,77**	**42,77**	**0,00%**
Abonnement			13,26	13,26	0,00%

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Consommation	120	0,2459	29,51	29,51	0,00%
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau) *	**120**	**0,1039**	**7,20**	**12,47**	**73,19%**
Collecte et dépollution des eaux usées			**246,32**	**246,32**	**0,00%**
Part délégataire			**138,22**	**135,82**	**-1,74%**
Abonnement			13,78	13,54	-1,74%
Consommation	120	1,0190	124,44	122,28	-1,74%
Part syndicale			**108,10**	**110,50**	**2,22%**
Abonnement			44,50	44,50	0,00%
Consommation	120	0,5500	63,60	66,00	3,77%
Organismes publics et TVA			**109,68**	**98,43**	**-10,26%**
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120		39,60		
Modernisation du réseau de collecte	120		30,00		
Consommation d'eau Potable	120	0,3200		38,40	
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0700		8,40	
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,1050		12,60	
TVA			40,08	39,03	-2,62%
TOTAL € TTC			**542,80**	**536,82**	**-1,10%**

(*) A partir du 1/1/2025, et conformément à l'arrêté du 2 octobre 2024 modifiant l'arrêté du 10 juillet 1996, la redevance "Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)" figurera bien dans la rubrique "Organismes publics et TVA" de la facture transmise aux usagers. Pour des facilités de comparaison pour les besoins du RAD 2024, elle a été maintenue pour cette année dans la rubrique "Production et distribution de l'eau" dans le tableau de présentation de la facture du RAD. Elle sera réintégrée dans la bonne rubrique à partir du RAD 2025.

LA TESTE DE BUCH	**m³**	**Prix au 01/01/2025**	**Montant au 01/01/2024**	**Montant au 01/01/2025**	**N/N-1**
Production et distribution de l'eau			**186,80**	**192,07**	**2,82%**
Part délégataire			**136,83**	**136,83**	**0,00%**
Abonnement			38,74	38,74	0,00%
Consommation	120	0,8174	98,09	98,09	0,00%
Part syndicale			**42,77**	**42,77**	**0,00%**
Abonnement			13,26	13,26	0,00%
Consommation	120	0,2459	29,51	29,51	0,00%
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau) *	**120**	**0,1039**	**7,20**	**12,47**	**73,19%**
Collecte et dépollution des eaux usées			**246,32**	**246,32**	**0,00%**
Part délégataire			**138,22**	**135,82**	**-1,74%**
Abonnement			13,78	13,54	-1,74%
Consommation	120	1,0190	124,44	122,28	-1,74%
Part syndicale			**108,10**	**110,50**	**2,22%**
Abonnement			44,50	44,50	0,00%
Consommation	120	0,5500	63,60	66,00	3,77%
Organismes publics et TVA			**109,68**	**98,43**	**-10,26%**
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120		39,60		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Modernisation du réseau de collecte	120		30,00		
Consommation d'eau Potable	120	0,3200		38,40	
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0700		8,40	
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,1050		12,60	
TVA			40,08	39,03	-2,62%
TOTAL € TTC			**542,80**	**536,82**	**-1,10%**

(*) A partir du 1/1/2025, et conformément à l'arrêté du 2 octobre 2024 modifiant l'arrêté du 10 juillet 1996, la redevance "Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)" figurera bien dans la rubrique "Organismes publics et TVA" de la facture transmise aux usagers. Pour des facilités de comparaison pour les besoins du RAD 2024, elle a été maintenue pour cette année dans la rubrique "Production et distribution de l'eau" dans le tableau de présentation de la facture du RAD. Elle sera réintégrée dans la bonne rubrique à partir du RAD 2025.

LE TEICH	**m³**	**Prix au 01/01/2025**	**Montant au 01/01/2024**	**Montant au 01/01/2025**	**N/N-1**
Production et distribution de l'eau			**186,80**	**192,07**	**2,82%**
Part délégataire			**136,83**	**136,83**	**0,00%**
Abonnement			38,74	38,74	0,00%
Consommation	120	0,8174	98,09	98,09	0,00%
Part syndicale			**42,77**	**42,77**	**0,00%**
Abonnement			13,26	13,26	0,00%
Consommation	120	0,2459	29,51	29,51	0,00%
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau) *	**120**	**0,1039**	**7,20**	**12,47**	**73,19%**
Collecte et dépollution des eaux usées			**246,32**	**246,32**	**0,00%**
Part délégataire			**138,22**	**135,82**	**-1,74%**
Abonnement			13,78	13,54	-1,74%
Consommation	120	1,0190	124,44	122,28	-1,74%
Part syndicale			**108,10**	**110,50**	**2,22%**
Abonnement			44,50	44,50	0,00%
Consommation	120	0,5500	63,60	66,00	3,77%
Organismes publics et TVA			**109,68**	**98,43**	**-10,26%**
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120		39,60		
Modernisation du réseau de collecte	120		30,00		
Consommation d'eau Potable	120	0,3200		38,40	
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0700		8,40	
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,1050		12,60	
TVA			40,08	39,03	-2,62%
TOTAL € TTC			**542,80**	**536,82**	**-1,10%**

(*) A partir du 1/1/2025, et conformément à l'arrêté du 2 octobre 2024 modifiant l'arrêté du 10 juillet 1996, la redevance "Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)" figurera bien dans la rubrique "Organismes publics et TVA" de la facture transmise aux usagers. Pour des facilités de comparaison pour les besoins du RAD 2024, elle a été maintenue pour cette année dans la rubrique "Production et distribution de l'eau" dans le tableau de présentation de la facture du RAD. Elle sera réintégrée dans la bonne rubrique à partir du RAD 2025.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

5.2. VISION PLURIANNUELLE DES VOLUMES

5.2.1. HISTORIQUE

VOLUMES PRÉLEVÉS PAR INSTALLATION DE PRODUCTION

	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
Volume prélevé (m3)	**7 484 204**	**7 481 830**	**7 729 397**	**7 480 549**	**7 005 767**	**-6,3%**
Volume prélevé par ressource (m3)						
ST 01 - ETOILE	494 919	500 653	493 436	632 832	672 066	6,2%
ST 07 - PISSENS	384 046	449 834	479 985	469 555	413 167	-12,0%
ST 10 - LA HUME	579 075	567 198	720 300	849 814	692 239	-18,5%
ST 11 - LA PASSERELLE	555 311	523 744	523 260	591 914	621 943	5,1%
ST 12 - CAPLANDE	686 103	697 108	697 415	656 990	789 962	20,2%
ST 15 - CAZAUX LIBERATION	174 580	151 236	140 462	131 354	133 373	1,5%
ST05-CABARET PINS (Forage)	1 375 092	1 368 065	1 364 044	1 112 787	1 330 600	19,6%
ST05-CABARET PINS(Cazaux Lac)	2 810 151	2 788 922	2 725 540	2 419 824	1 814 354	-25,0%
ST13 - VILLEMARIE	424 927	435 070	584 955	615 479	538 063	-12,6%
Volume prélevé par nature d'eau (m3)						
Eau souterraine non influencée	4 674 053	4 692 908	5 003 857	5 060 725	5 191 413	2,6%
Eau de surface	2 810 151	2 788 922	2 725 540	2 419 824	1 814 354	-25,0%

En 2024, le ratio *Production usine/(Production usine+production forage)* est de 24%
Les volumes journaliers maximum par forage en 2024 est présenté en Annexe complémentaire au RAD.

VOLUMES PRODUITS ET MIS EN DISTRIBUTION

	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
Volume prélevé (m3)	**7 484 204**	**7 481 830**	**7 729 397**	**7 480 549**	**7 005 767**	**-6,3%**
Volume eau brute vendu	73 107	80 053	100 810	96 813	80 401	-17,0%
Besoin des usines	369 287	392 226	348 668	387 784	73 804	-81,0%
Pertes en adduction	0	0	0	0	70 824	100%
Volume produit (m3)	**7 041 810**	**7 009 551**	**7 279 919**	**6 995 952**	**6 780 738**	**-3,1%**
Volume acheté à d'autres services d'eau potable	0	0	0	0	0	/
Volume vendu à d'autres services d'eau potable	0	0	0	0	0	/
Volume mis en distribution (m3)	**7 041 810**	**7 009 551**	**7 279 919**	**6 995 952**	**6 780 738**	**-3,1%**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Détail des volumes produits par installation:

Installation de captage	Vol annuel prélevé	Vol annuel produit
FORAGE CABARET DES PINS	1 331 684	2 957 685
ST 04 - CAZAUX LAC	1 814 354	
FORAGE CAONE	57 911	128 925
FORAGE LIBERATION	75 462	
FORAGE CAPLANDE 1	98 654	798 278
FORAGE CAPLANDE 2	691 308	
FORAGE DESBIEY	672 066	672 066
FORAGE HUME 1	370 513	634 624
FORAGE HUME 2	319 701	
FORAGE LA PASSERELLE	621 943	621 943
FORAGE PISSENS	413 167	413 167
FORAGE VILLEMARIE	538 063	554 050
Cumul 2024	**7 004 826**	**6 780 738**
AQUALAND		79 963

VOLUMES VENDUS

	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
Volume vendu (m3)	**5 678 068**	**5 745 269**	**5 941 077**	**5 492 710**	**5 268 740**	**-4,1%**
dont clients individuels	5 468 735	5 499 348	5 690 005	5 251 513	5 037 374	-4,1%
dont bâtiments communaux	209 333	245 921	251 072	241 197	231 366	-4,1%
dont appareils publics	0	0	0	0	0	0%

VOLUMES CONSOMMÉS

	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3)	5 890 155	5 983 402	6 098 850	5 603 345	5 383 680	-3,9%
Volume comptabilisé hors ventes en gros 365 jours (m3)	**5 938 834**	**6 066 505**	**6 082 186**	**5 649 782**	**5 383 680**	**-4,7%**
Nombre de jours de consommation entre 2 relevés annuels	363	360	366	362	366	1,1%
Volume consommateurs sans comptage (m3)	37 368	33 064	124 224	45 224	35 418	-21,7%
Volume de service du réseau (m3)	42 209	40 661	51 837	79 338	73 405	-7,5%
Volume consommé autorisé (m3)	**5 969 732**	**6 057 127**	**6 274 911**	**5 727 907**	**5 492 503**	**-4,1%**
Volume consommé autorisé 365 jours (m3)	**6 018 411**	**6 140 230**	**6 258 247**	**5 774 344**	**5 492 503**	**-4,9%**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

INDICATEURS DE PERFORMANCE

	2020	2021	2022	2023	2024
Indice linéaire des volumes non comptés (m3/km/j) (A-B)/(L/1000)/365	**4,52**	**3,86**	**4,88**	**5,47**	**5,63**
Volume mis en distribution (m3) . . . . . A	7 041 810	7 009 551	7 279 919	6 995 952	6 780 738
Volume comptabilisé 365 jours (m3) . . . . . B	5 938 834	6 066 505	6 082 186	5 649 782	5 383 680
Longueur de canalisation de distribution (ml) L	666 500	668 554	672 265	674 759	677 931

	2020	2021	2022	2023	2024
Indice linéaire de pertes en réseau (m3/km/j) (A-B)/(L/1000)/365	**4,20**	**3,56**	**4,16**	**4,96**	**5,19**
Volume mis en distribution (m3) . . . . . A	7 041 810	7 009 551	7 279 919	6 995 952	6 780 738
Volume consommé autorisé 365 jours (m3) . . . . . B	6 018 411	6 140 230	6 258 247	5 774 344	5 492 503
Longueur de canalisation de distribution (ml) L	666 500	668 554	672 265	674 759	677 931

5.2.2. DONNÉES MENSUELLES

VOLUMES MOYENS JOURNALIERS PRODUITS ET ACHETÉS

	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.
Volume moyen journalier produit (m3/j)	15 713	14 980	15 177	17 060	18 009	21 086	25 032	27 966	19 414	15 893	15 773	15 361
Total (m3/j)	**15 713**	**14 980**	**15 177**	**17 060**	**18 009**	**21 086**	**25 032**	**27 966**	**19 414**	**15 893**	**15 773**	**15 361**

Sous réserve de la confirmation qui sera émise par l'Agence de l'Eau, le rendement de réseau 2024 étant supérieur au seuil de rendement « Grenelle 2 », il n'est pas nécessaire d'établir un plan d'actions spécifique. Veolia poursuivra ses efforts pour améliorer la performance du réseau dans la continuité des actions mises en œuvre en 2024.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

5.3. INDICE DE PROTECTION DE LA RESSOURCE

A L'ÉCHELLE DU SERVICE

	2020	2021	2022	2023	2024
Indice d'avancement de la démarche de protection de la ressource	**80 %**	**80 %**	**80 %**	**80 %**	**80 %**

PAR POINT DE POINT DE PRODUCTION

Indice d'avancement de la démarche de protection de la ressource par installation de production	2020	2021	2022	2023	2024
ST 01 - ETOILE	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
ST 07 - PISSENS	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
ST 10 - LA HUME	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
ST 11 - LA PASSERELLE	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
ST 12 - CAPLANDE	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
ST 15 - CAZAUX LIBERATION	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
ST05-CABARET PINS (Forage)	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
ST05-CABARET PINS(Cazaux Lac)	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
ST13 - VILLEMARIE	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

5.4. Qualité de l'eau

Historique du contrôle officiel

	2020	2021	2022	2023	2024
Paramètres microbiologiques					
Taux de conformité microbiologique	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**
Nombre de prélèvements conformes	226	222	232	226	227
Nombre de prélèvements non conformes	0	0	0	0	0
Nombre total de prélèvements	226	222	232	226	227
Paramètres physico–chimique					
Taux de conformité physico-chimique	**100,00 %**	**98,31 %**	**100,00 %**	**98,48 %**	**100,00 %**
Nombre de prélèvements conformes	52	58	63	65	62
Nombre de prélèvements non conformes	0	1	0	1	0
Nombre total de prélèvements	52	59	63	66	62

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

Intensité du programme d'analyse

	Contrôle sanitaire	Surveillance par le délégataire	Analyses supplémentaires
Microbiologique	1323	1002	42
Physico-chimique	8833	3914	3553

Non-Conformités par rapport aux limites de qualité

Paramètre	Mini	Maxi	Nb de non-conformités Contrôle Sanitaire	Nb de non-conformités Surveillance Délégataire	Nb d'analyses Contrôle Sanitaire	Nb d'analyses Surveillance Délégataire	Valeur du seuil et unité
Tous les résultats sont conformes							

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

NON-CONFORMITÉS PAR RAPPORT AUX RÉFÉRENCES DE QUALITÉ

Paramètre	Mini	Maxi	Nb de non-conformités Contrôle Sanitaire	Nb de non-conformités Surveillance Délégataire	Nb d'analyses Contrôle Sanitaire	Nb d'analyses Surveillance Délégataire	Valeur du seuil et unité
Bact et spores sulfito-rédu	0	10	2	8	162	166	0 n/100ml
Bactéries Coliformes	0	9	0	3	227	164	0 n/100ml
Equ.Calco (0;1;2;3;4)	0	4	5	20	19	45	2 Qualitatif
Fer total	8	750	3	0	225	0	200 µg/l
pH mesuré au labo	6,1	8,4	0	1	223	168	9 Unité pH
Température de l'eau	9,9	27,3	32	10	234	189	25 °C

Détail des non conformités par rapport aux références de qualité :

En réponse aux non-conformités constatées, une investigation approfondie est systématiquement menée afin d'en déterminer les causes. Concernant les stations de production, le fonctionnement des traitements ainsi que les dosages sont vérifiés. Quant au réseau de distribution, une purge est effectuée et plusieurs analyses de contrôle sont réalisées pour s'assurer de la conformité de l'eau distribuée.

Point	Spores bactéries anaérobies sulfito-réductrices (UFC/100mL)	date NC	date contrôle	conformité contrôle
Cabaret les Pins La Teste de Buch	1	06/02/2024	13/02/2024 04/03/2024 07/03/2024	oui
Cabaret les Pins La Teste de Buch	1	20/06/2024	27/06/2024 02/07/2024 01/08/2024	oui
Piste 214 La Teste de Buch	2	28/05/2024	06/06/2024	oui
Piste 214 La Teste de Buch	10	25/09/2024	23/10/2024 26/11/2024 04/12/2024 10/12/2024 17/12/2024	oui
Piste 214 La Teste de Buch	1	26/12/2024	08/01/2025 15/01/2025	oui
Pissens La Teste de Buch	2	27/03/2024	17/04/2024 14/05/2024 30/05/2024	oui
Pissens La Teste de Buch	1	06/06/2024	12/06/2024 02/07/2024 25/09/2024	oui

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Point 1 La Teste de Buch	1	23/08/2024	28/08/2024 17/09/2024	oui
Point 2 La Teste de Buch	1	23/10/2024	07/11/2024 10/12/2024 17/12/2024 08/01/2025 15/01/2025	oui
Arcachon	1	10/12/2024	17/12/2024	oui

Point	**Bactéries coliformes (UFC/100mL)**	**date NC**	**date contrôle**	**conformité contrôle**
Piste 214 La Teste de Buch	9	10/12/2024	17/12/2024	non
Piste 214 La Teste de Buch	3	17/12/2024	26/12/2024 08/01/2025 15/01/2025	oui
Point 2 La Teste de Buch	1	10/12/2024	17/12/2024 08/01/2025 15/01/2025	oui

Pour le site de la Piste 214, qui est alimenté par l'eau du réseau, et qui comprend une bâche de stockage et une chloration, une vérification de l'étanchéité des accès à la bâche a été réalisée. Aucune anomalie n'a été détectée, une inspection approfondie de la structure de la bâche sera réalisée lors du prochain nettoyage annuel.

Site de Production	**Equilibre calco-carbonique**
Villemarie	2 mesures "eau légèrement agressive" 3 mesures "eau agressive"
Cazaux Caonne	1 mesure "eau légèrement agressive" 1 mesure "eau agressive"
Cazaux libération	3 mesures "eau légèrement agressive"
Etoile	1 mesure "eau légèrement agressive"
Pissens	2 mesures "eau légèrement agressive" 2 mesures "eau agressive"
Passerelle	3 mesures "eau légèrement agressive" 1 mesure "eau agressive"
La Hume	1 mesure "eau légèrement agressive" 1 mesure "eau agressive"
Cabaret les Pins	1 mesure "eau légèrement incrustante" 1 mesure "eau légèrement agressive" 2 mesures "eau agressive"

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

À l'exception de l'usine de Cabaret-des-Pins, les sites de la COBAS ne disposent pas d'installations de traitement pour la reminéralisation de l'eau. En 2024, l'usine de Cabaret-des-Pins n'a pas une eau à l'équilibre pour 4 prélèvements sur les 17 effectués.

Point	Fer (µg/L)	date NC	date contrôle	conformité contrôle
Arcachon	360	16/04/2024	22/04/2024	oui
Le Teich	750	19/07/2024	01/08/2024	oui
La Teste de Buch	210	15/10/2024	23/10/2024	oui

La valeur de pH mesurée en laboratoire pour le site de Passerelle le 27/03/2024 est de 6,1 upH alors que la mesure réalisée in situ par notre agent était de 8,1 upH.

Plusieurs dépassements du seuil de température de l'eau ont été enregistrés durant l'année 2024. Ces dépassements sont directement liés à l'élévation de la température des ressources, qui ont excédé 25°C.

Afin de garantir le maintien de la qualité bactériologique de l'eau, nous avons immédiatement mis en œuvre des ajustements dans nos processus de désinfection. Ces mesures ont permis de garantir la qualité de l'eau distribuée.

Non-Conformités pour les paramètres soumis à une valeur indicative

Paramètre	Mini	Maxi	Nb de non-conformités Contrôle Sanitaire	Nb de non-conformités Surveillance Délégataire	Nb d'analyses Contrôle Sanitaire	Nb d'analyses Surveillance Délégataire	Valeur du seuil et unité
Tous les résultats sont conformes							

Le métabolite du chlorothalonil, R471811, a changé de statut en début d'année 2024, il a été déclaré non pertinent par l'autorité sanitaire. A ce titre, il n'est donc plus considéré comme une limite de qualité mais comme une valeur indicative. Dans les tableaux précédents, sa conformité a été évaluée par rapport au seuil de 0,9 µg/L (valeur indicative) pour l'ensemble de l'année.

Non-Conformités pour les paramètres soumis à une valeur de vigilance

Paramètre	Mini	Maxi	Nb de non-conformités Contrôle Sanitaire	Nb de non-conformités Surveillance Délégataire	Nb d'analyses Contrôle Sanitaire	Nb d'analyses Surveillance Délégataire	Valeur du seuil et unité
Tous les résultats sont conformes							

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Composition de l'eau au robinet

Paramètre	Mini	Maxi	Nb d'analyses	Unité	Valeur du seuil
Calcium	13,80	32,90	64	mg/l	Sans objet
Chlorures	23	86	102	mg/l	250
Fluorures	99	300	19	µg/l	1500
Magnésium	2,80	8	64	mg/l	Sans objet
Nitrates	0	0,62	102	mg/l	50
Pesticides totaux	0	0,10	28	µg/l	0,5
Potassium	1,10	4,20	64	mg/l	Sans objet
Sodium	6,20	68,90	64	mg/l	200
Sulfates	0	11	102	mg/l	250
Titre Hydrotimétrique	5,90	9,80	97	°F	Sans objet

Qualité des ressources

	Contrôle sanitaire		Surveillance par le délégataire	
	Nb total de résultats d'analyses	Nb de résultats d'analyses conformes	Nb total de résultats d'analyses	Nb de résultats d'analyses conformes
Microbiologique	18	18		
Physico-chimique	1421	1421	903	903

Tous les résultats sont conformes.

Qualité de l'eau produite et distribuée

	Taux de conformité Contrôle Sanitaire	Taux de conformité Surveillance du Délégataire	Taux de conformité Contrôle Sanitaire et Surveillance du Délégataire
Microbiologique	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Physico-chimie	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

DÉTAIL

PC - Forage cazaux communal COBAS

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
E.Coli /100ml	0		0	1	n/100ml	<= 20000
Entérocoques fécaux	0		0	1	n/100ml	<= 10000
Pentachlorobenzène	0	0	0	1	µg/l	
Carbonates	0	0	0	1	mg/l CO3	
CO2 libre	1.31	1.31	1.31	1	mg/l CO2	
Ecart pH initial et pHéq	0.08	0.08	0.08	1	Unité pH	
Equ.Calco (0;1;2;3;4)	2		2	1	Qualitatif	
Hydrogénocarbonates	120	120	120	1	mg/l	
pH à température de l'eau	8.2	8.2	8.2	1	Unité pH	
pH d'équilibre à 20°C	8.28	8.28	8.28	1	Unité pH	
pH mesuré au labo	8.2	8.2	8.2	1	Unité pH	
TH Calcique	5.75	5.75	5.75	1	°F	
TH Magnésien	1.218	1.218	1.218	1	°F	
Titre Alcalimétrique	0	0	0	1	°F	
Titre Alcalimétrique Complet	9.6	9.6	9.6	1	°F	
Titre Hydrotimétrique	6.9	6.9	6.9	1	°F	
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	1	Qualitatif	
Couleur apr. filtration simple	0	0	0	1	mg/l Pt	<= 200
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	0		0	1	Qualitatif	
Turbidité	0	0	0	1	NFU	
Indice Hydrocarbure	0	0	0	1	mg/l	<= 1
Température de l'eau	16.1	16.1	16.1	1	°C	
Température de mesure du pH	20.4	20.4	20.4	1	°C	
Fer dissous	51	51	51	1	µg/l	
Fer total	60	60	60	1	µg/l	
Manganèse total	3	3	3	1	µg/l	
Acetochlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
Acetochlore OXA	0	0	0	1	µg/l	
Alachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
Chlorothalonil R471811	0.05	0.05	0.05	1	µg/l	
Metazachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
Metazachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	
Metolachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
Metolachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	
Calcium	23	23	23	1	mg/l	
Chlorures	22	22	22	1	mg/l	<= 200

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Conductivité à 25°C	256	256	256	1	µS/cm	
Magnésium	2.9	2.9	2.9	1	mg/l	
Potassium	2.4	2.4	2.4	1	mg/l	
Silicates (en mg/l de SiO2)	17	17	17	1	mg/l	
Sodium	23	23	23	1	mg/l	<= 200
Sulfates	1.5	1.5	1.5	1	mg/l	<= 250
Carbone Organique Total	0.62	0.62	0.62	1	mg/l C	<= 10
Oxygène dissous	0.8	0.8	0.8	1	mg/l	
O2 dissous % Saturation	8	8	8	1	%sat.	>= 30
Ammonium	0.087	0.087	0.087	1	mg/l	<= 4
Nitrates	0	0	0	1	mg/l	<= 100
Nitrates/50 + Nitrites/3	0	0	0	1	mg/l	
Nitrites	0	0	0	1	mg/l	
Phosphore total (en P2O5)	0.046	0.046	0.046	1	mg/l P2O5	
Antimoine	0	0	0	1	µg/l	
Arsenic	2.7	2.7	2.7	1	µg/l	<= 100
Bore	16	16	16	1	µg/l	<= 1500
Cadmium	0	0	0	1	µg/l	<= 5
Fluorures	66	66	66	1	µg/l	
Nickel	0	0	0	1	µg/l	<= 20
Sélénium	0	0	0	1	µg/l	<= 20
Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	
Pesticides totaux	0.05	0.05	0.05	1	µg/l	<= 5
Benzène	0	0	0	1	µg/l	

PC - Forage cazaux goulugne bas

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
E.Coli /100ml	0		0	1	n/100ml	<= 20000
Entérocoques fécaux	0		0	1	n/100ml	<= 10000
Pentachlorobenzène	0	0	0	1	µg/l	
Carbonates	0	0	0	1	mg/l CO3	
CO2 libre	1.32	1.32	1.32	1	mg/l CO2	
Ecart pH initial et pHéq	0.14	0.14	0.14	1	Unité pH	
Equ.Calco (0;1;2;3;4)	2		2	1	Qualitatif	
Hydrogénocarbonates	110	110	110	1	mg/l	
pH à température de l'eau	8.2	8.2	8.2	1	Unité pH	
pH d'équilibre à 20°C	8.32	8.32	8.32	1	Unité pH	
pH mesuré au labo	8.2	8.2	8.2	1	Unité pH	
TH Calcique	5.5	5.5	5.5	1	°F	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

TH Magnésien	1.302	1.302	1.302	1	°F	
Titre Alcalimétrique	0	0	0	1	°F	
Titre Alcalimétrique Complet	9.2	9.2	9.2	1	°F	
Titre Hydrotimétrique	6.8	6.8	6.8	1	°F	
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	1	Qualitatif	
Couleur apr. filtration simple	0	0	0	1	mg/l Pt	<= 200
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	0		0	1	Qualitatif	
Turbidité	0.32	0.32	0.32	1	NFU	
Indice Hydrocarbure	0	0	0	1	mg/l	<= 1
Température de l'eau	16.2	16.2	16.2	1	°C	
Température de mesure du pH	20.4	20.4	20.4	1	°C	
Fer dissous	46	46	46	1	µg/l	
Fer total	51	51	51	1	µg/l	
Manganèse total	2	2	2	1	µg/l	
Acetochlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
Acetochlore OXA	0	0	0	1	µg/l	
Alachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
Chlorothalonil R471811	0.09	0.09	0.09	1	µg/l	
Metazachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
Metazachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	
Metolachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
Metolachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	
Calcium	22	22	22	1	mg/l	
Chlorures	22	22	22	1	mg/l	<= 200
Conductivité à 25°C	253	253	253	1	µS/cm	
Magnésium	3.1	3.1	3.1	1	mg/l	
Potassium	2.5	2.5	2.5	1	mg/l	
Silicates (en mg/l de SiO2)	17	17	17	1	mg/l	
Sodium	22	22	22	1	mg/l	<= 200
Sulfates	2	2	2	1	mg/l	<= 250
Carbone Organique Total	0.5	0.5	0.5	1	mg/l C	<= 10
Oxygène dissous	0.5	0.5	0.5	1	mg/l	
O2 dissous % Saturation	5.4	5.4	5.4	1	%sat.	>= 30
Ammonium	0.076	0.076	0.076	1	mg/l	<= 4
Nitrates	0	0	0	1	mg/l	<= 100
Nitrates/50 + Nitrites/3	0	0	0	1	mg/l	
Nitrites	0	0	0	1	mg/l	
Phosphore total (en P2O5)	0.023	0.023	0.023	1	mg/l P2O5	
Antimoine	0	0	0	1	µg/l	
Arsenic	2.6	2.6	2.6	1	µg/l	<= 100
Bore	17	17	17	1	µg/l	<= 1500
Cadmium	0	0	0	1	µg/l	<= 5
Fluorures	72	72	72	1	µg/l	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Nickel	0	0	0	1	µg/l	<= 20
Sélénium	0	0	0	1	µg/l	<= 20
Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	
Pesticides totaux	0.09	0.09	0.09	1	µg/l	<= 5
Benzène	0	0	0	1	µg/l	

PC - Forage de CABARET COBAS

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
E.Coli /100ml	0		0	1	n/100ml	<= 20000
Entérocoques fécaux	0		0	1	n/100ml	<= 10000
Legionella pneumophilla	0		0	2	n/l	
Legionella spp	0		0	2	n/l	
Pentachlorobenzène	0	0	0	1	µg/l	
Carbonates	0	0	0	1	mg/l CO3	
CO2 libre	1.49	1.49	1.49	1	mg/l CO2	
Ecart pH initial et pHéq	0.06	0.06	0.06	1	Unité pH	
Equ.Calco (0;1;2;3;4)	2		2	1	Qualitatif	
Hydrogénocarbonates	120	120	120	1	mg/l	
pH à température de l'eau	8.1	8.1	8.1	3	Unité pH	
pH d'équilibre à 20°C	8.16	8.16	8.16	1	Unité pH	
pH mesuré au labo	8.2	8.2	8.2	1	Unité pH	
TH Calcique	4.25	4.25	4.25	1	°F	
TH Magnésien	3.234	3.234	3.234	1	°F	
Titre Alcalimétrique	0	0	0	1	°F	
Titre Alcalimétrique Complet	10.2	10.2	10.2	1	°F	
Titre Hydrotimétrique	7.5	7.5	7.5	1	°F	
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	3	Qualitatif	
Couleur apr. filtration simple	0	0	0	1	mg/l Pt	<= 200
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	0		0	3	Qualitatif	
Turbidité	0.21	0.21	0.21	1	NFU	
Indice Hydrocarbure	0	0	0	1	mg/l	<= 1
Température de l'eau	27.3	27.333	27.4	3	°C	
Température de mesure du pH	21.5	21.5	21.5	1	°C	
Fer dissous	25	25	25	1	µg/l	
Fer total	31	31	31	1	µg/l	
Manganèse total	0	0	0	1	µg/l	
Acetochlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
Acetochlore OXA	0	0	0	1	µg/l	
Alachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Chlorothalonil R471811	0	0	0	1	µg/l	<= 2
Metazachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
Metazachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	
Metolachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
Metolachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	
Calcium	17	17	17	1	mg/l	
Chlorures	50	50	50	1	mg/l	<= 200
Conductivité à 25°C	381	381	381	1	µS/cm	
Magnésium	7.7	7.7	7.7	1	mg/l	
Potassium	3.9	3.9	3.9	1	mg/l	
Silicates (en mg/l de SiO2)	12	12	12	1	mg/l	
Sodium	43	43	43	1	mg/l	<= 200
Sulfates	7.3	7.3	7.3	1	mg/l	<= 250
Carbone Organique Total	0.27	0.27	0.27	1	mg/l C	<= 10
Oxygène dissous	0.1	0.1	0.1	1	mg/l	
O2 dissous % Saturation	1.2	1.2	1.2	1	%sat.	>= 30
Ammonium	0.081	0.081	0.081	1	mg/l	<= 4
Nitrates	0	0	0	1	mg/l	<= 100
Nitrates/50 + Nitrites/3	0	0	0	1	mg/l	
Nitrites	0	0	0	1	mg/l	
Phosphore total (en P2O5)	0	0	0	1	mg/l P2O5	
Antimoine	0	0	0	1	µg/l	
Arsenic	0	0	0	1	µg/l	<= 100
Bore	51	51	51	1	µg/l	<= 1500
Cadmium	0	0	0	1	µg/l	<= 5
Fluorures	300	300	300	1	µg/l	
Nickel	0	0	0	1	µg/l	<= 20
Sélénium	0	0	0	1	µg/l	<= 20
Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	
Benzène	0	0	0	1	µg/l	

PC - Forage DESBIEY (District)

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
E.Coli /100ml	0		0	1	n/100ml	<= 20000
Entérocoques fécaux	0		0	1	n/100ml	<= 10000
Pentachlorobenzène	0	0	0	1	µg/l	
Carbonates	0	0	0	1	mg/l CO3	
CO2 libre	1.43	1.43	1.43	1	mg/l CO2	
Ecart pH initial et pHéq	0.07	0.07	0.07	1	Unité pH	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Equ.Calco (0;1;2;3;4)	2		2	1	Qualitatif	
Hydrogénocarbonates	120	120	120	1	mg/l	
pH à température de l'eau	8.1	8.1	8.1	1	Unité pH	
pH d'équilibre à 20°C	8.18	8.18	8.18	1	Unité pH	
pH mesuré au labo	8.2	8.2	8.2	1	Unité pH	
TH Calcique	4.75	4.75	4.75	1	°F	
TH Magnésien	3.234	3.234	3.234	1	°F	
Titre Alcalimétrique	0	0	0	1	°F	
Titre Alcalimétrique Complet	9.7	9.7	9.7	1	°F	
Titre Hydrotimétrique	7.9	7.9	7.9	1	°F	
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	1	Qualitatif	
Couleur apr. filtration simple	3	3	3	1	mg/l Pt	<= 200
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	0		0	1	Qualitatif	
Turbidité	0.21	0.21	0.21	1	NFU	
Indice Hydrocarbure	0	0	0	1	mg/l	<= 1
Température de l'eau	24.8	24.8	24.8	1	°C	
Température de mesure du pH	21	21	21	1	°C	
Fer dissous	11	11	11	1	µg/l	
Fer total	11	11	11	1	µg/l	
Manganèse total	0	0	0	1	µg/l	
Acetochlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
Acetochlore OXA	0	0	0	1	µg/l	
Alachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
Chlorothalonil R471811	0	0	0	1	µg/l	<= 2
Metazachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
Metazachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	
Metolachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
Metolachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	
Calcium	19	19	19	1	mg/l	
Chlorures	32	32	32	1	mg/l	<= 200
Conductivité à 25°C	305	305	305	1	µS/cm	
Magnésium	7.7	7.7	7.7	1	mg/l	
Potassium	3.2	3.2	3.2	1	mg/l	
Silicates (en mg/l de SiO2)	14	14	14	1	mg/l	
Sodium	27	27	27	1	mg/l	<= 200
Sulfates	5.5	5.5	5.5	1	mg/l	<= 250
Carbone Organique Total	0.3	0.3	0.3	1	mg/l C	<= 10
Oxygène dissous	2.5	2.5	2.5	1	mg/l	
O2 dissous % Saturation	30.8	30.8	30.8	1	%sat.	>= 30
Ammonium	0.054	0.054	0.054	1	mg/l	<= 4
Nitrates	0	0	0	1	mg/l	<= 100
Nitrates/50 + Nitrites/3	0	0	0	1	mg/l	
Nitrites	0	0	0	1	mg/l	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Phosphore total (en P2O5)	0	0	0	1	mg/l P2O5	
Antimoine	0	0	0	1	µg/l	
Arsenic	0	0	0	1	µg/l	<= 100
Bore	24	24	24	1	µg/l	<= 1500
Cadmium	0	0	0	1	µg/l	<= 5
Fluorures	250	250	250	1	µg/l	
Nickel	0	0	0	1	µg/l	<= 20
Sélénium	0	0	0	1	µg/l	<= 20
Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	
Benzène	0	0	0	1	µg/l	

PC - Forage la PASSERELLE COBAS

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
E.Coli /100ml	0		0	1	n/100ml	<= 20000
Entérocoques fécaux	0		0	1	n/100ml	<= 10000
Pentachlorobenzène	0	0	0	1	µg/l	
Carbonates	0	0	0	1	mg/l CO3	
CO2 libre	1.35	1.35	1.35	1	mg/l CO2	
Ecart pH initial et pHéq	0.1	0.1	0.1	1	Unité pH	
Equ.Calco (0;1;2;3;4)	2		2	1	Qualitatif	
Hydrogénocarbonates	110	110	110	1	mg/l	
pH à température de l'eau	8.1	8.1	8.1	1	Unité pH	
pH d'équilibre à 20°C	8.21	8.21	8.21	1	Unité pH	
pH mesuré au labo	8.1	8.1	8.1	1	Unité pH	
TH Calcique	5.5	5.5	5.5	1	°F	
TH Magnésien	2.688	2.688	2.688	1	°F	
Titre Alcalimétrique	0	0	0	1	°F	
Titre Alcalimétrique Complet	8.8	8.8	8.8	1	°F	
Titre Hydrotimétrique	8.1	8.1	8.1	1	°F	
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	1	Qualitatif	
Couleur apr. filtration simple	0	0	0	1	mg/l Pt	<= 200
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	0		0	1	Qualitatif	
Turbidité	0	0	0	1	NFU	
Indice Hydrocarbure	0	0	0	1	mg/l	<= 1
Température de l'eau	22.2	22.2	22.2	1	°C	
Température de mesure du pH	20.8	20.8	20.8	1	°C	
Fer dissous	13	13	13	1	µg/l	
Fer total	13	13	13	1	µg/l	
Manganèse total	0	0	0	1	µg/l	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Acetochlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
Acetochlore OXA	0	0	0	1	µg/l	
Alachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
Chlorothalonil R471811	0	0	0	1	µg/l	<= 2
Metazachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
Metazachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	
Metolachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
Metolachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	
Calcium	22	22	22	1	mg/l	
Chlorures	32	32	32	1	mg/l	<= 200
Conductivité à 25°C	285	285	285	1	µS/cm	
Magnésium	6.4	6.4	6.4	1	mg/l	
Potassium	2.8	2.8	2.8	1	mg/l	
Silicates (en mg/l de SiO2)	13	13	13	1	mg/l	
Sodium	22	22	22	1	mg/l	<= 200
Sulfates	4.9	4.9	4.9	1	mg/l	<= 250
Carbone Organique Total	0.21	0.21	0.21	1	mg/l C	<= 10
Oxygène dissous	0.9	0.9	0.9	1	mg/l	
O2 dissous % Saturation	10.4	10.4	10.4	1	%sat.	>= 30
Ammonium	0.041	0.041	0.041	1	mg/l	<= 4
Nitrates	0	0	0	1	mg/l	<= 100
Nitrates/50 + Nitrites/3	0	0	0	1	mg/l	
Nitrites	0	0	0	1	mg/l	
Phosphore total (en P2O5)	0	0	0	1	mg/l P2O5	
Antimoine	0	0	0	1	µg/l	
Arsenic	0	0	0	1	µg/l	<= 100
Bore	18	18	18	1	µg/l	<= 1500
Cadmium	0	0	0	1	µg/l	<= 5
Fluorures	160	160	160	1	µg/l	
Nickel	0	0	0	1	µg/l	<= 20
Sélénium	0	0	0	1	µg/l	<= 20
Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	
Benzène	0	0	0	1	µg/l	

PC - Forage 1 La HUME COBAS

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Legionella pneumophilla	0		0	2	n/l	
Legionella spp	0		0	2	n/l	
pH à température de l'eau	7.9	8	8.1	2	Unité pH	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	2	Qualitatif	
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	0		0	2	Qualitatif	
Température de l'eau	26.6	26.65	26.7	2	°C	

PC - Lac de CAZAUX COBAS

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Biphényle	0	0	0	4	µg/l	
Diéthylaniline-2,6	0	0	0	4	µg/l	
Acetochlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Acetochlore ESA	0	0	0	3	µg/l	
Acetochlore OXA	0	0	0	3	µg/l	
Acetochlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Alachlore ESA	0	0	0	3	µg/l	
Alachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Dimétachlore ESA (CGA 354742)	0	0	0	2	µg/L	
Dimétachlore ESA (CGA 354742)	0	0	0	2	µg/L	<= 0.9
Diméthénamide ESA	0	0	0	3	µg/L	
Diméthénamide ESA	0	0	0	1	µg/L	<= 0.9
Diméthénamide OXA	0	0	0	3	µg/L	
Diméthénamide OXA	0	0	0	1	µg/L	<= 0.9
Metazachlore ESA	0	0	0	3	µg/l	
Metazachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metazachlore OXA	0	0	0	3	µg/l	
Metazachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metolachlore ESA	0.296	0.323	0.347	4	µg/l	
Metolachlore NOA	0	0	0	4	µg/l	
Metolachlore OXA	0.183	0.22	0.277	4	µg/l	
Bromures	0.11	0.118	0.12	4	mg/l	
Carbone Organique Total	4.2	5.225	6.2	12	mg/l C	<= 10
DCO	13	17.833	24	12	mg/l O2	
Anthraquinone	0	0	0	4	µg/l	
PCB 101	0	0	0	4	µg/l	
PCB 105	0	0	0	4	µg/l	
PCB 118	0	0	0	4	µg/l	
PCB 138	0	0	0	4	µg/l	
PCB 149	0	0	0	4	µg/l	
PCB 153	0	0	0	4	µg/l	
PCB 170	0	0	0	4	µg/l	
PCB 18	0	0	0	4	µg/l	
PCB 180	0	0	0	4	µg/l	
PCB 194	0	0	0	4	µg/l	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

PCB 209	0	0	0	4	µg/l	
PCB 28	0	0	0	4	µg/l	
PCB 31	0	0	0	4	µg/l	
PCB 35	0	0	0	4	µg/l	
PCB 44	0	0	0	4	µg/l	
PCB 52	0	0	0	4	µg/l	
Somme des 7 PCBi	0	0	0	4	µg/l	

UP - Bache de Caonne

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bact et spores sulfito-rédu	0		0	6	n/100ml	= 0
Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		2	6	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	0		3	6	n/ml	
Bactéries Coliformes	0		0	6	n/100ml	= 0
E.Coli /100ml	0		0	6	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		0	6	n/100ml	= 0
Pentachlorobenzène	0	0	0	1	µg/l	
Carbonates	0	0	0	1	mg/l CO3	
CO2 libre	1.21	1.21	1.21	1	mg/l CO2	
Delta pH = PHE - PHEAU	0.13	0.243	0.33	3	Unité pH	
Ecart pH initial et pHéq	0.02	0.02	0.02	1	Unité pH	
Equ.Calco (0;1;2;3;4)	2		4	4	Qualitatif	[1 - 2]
Hydrogénocarbonates	110	110	110	1	mg/l	
pH à température de l'eau	8	8.09	8.2	5	Unité pH	[6,5 - 9]
pH d'équilibre (à T pH insitu)	8.13	8.293	8.42	3	Unité pH	
pH d'équilibre à 20°C	8.19	8.19	8.19	1	Unité pH	
pH mesuré au labo	7.8	8.014	8.2	7	Unité pH	[6,5 - 9]
TH Calcique	4.775	5.625	6.525	4	°F	
TH Magnésien	2.142	2.594	3.108	4	°F	
Titre Alcalimétrique	0	0	0	5	°F	
Titre Alcalimétrique Complet	8.4	8.867	9.2	6	°F	
Titre Hydrotimétrique	7.337	8.182	8.667	5	°F	
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	2	Qualitatif	
Couleur apr. filtration simple	0	0	0	2	mg/l Pt	<= 15
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	0		0	2	Qualitatif	
Saveur (0=RAS, 1 sinon)	0		0	2	Qualitatif	
Turbidité	0	0.066	0.25	7	NFU	<= 1
Acrylamide	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Bisphenol A	0	0	0	1	µg/l	<= 2.5
Epichlorohydrine	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Température de l'eau	13.8	18.3	22.8	7	°C	<= 25

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Température de mesure du pH	18.4	20.05	21.7	2	°C	
Fer total	19	25.5	32	2	µg/l	<= 200
Manganèse total	0	0	0	1	µg/l	<= 50
Acetochlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Acetochlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Alachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Chlorothalonil R471811	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metazachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metazachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metolachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metolachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Calcium	19.1	22.5	26.1	4	mg/l	
Chlorures	35.1	39.017	46.5	6	mg/l	<= 250
Conductivité à 20°C	263	272.8	296	5	µS/cm	[180 - 2000]
Conductivité à 25°C	294	307.143	330	7	µS/cm	[200 - 1200]
Magnésium	5.1	6.175	7.4	4	mg/l	
Potassium	2.9	3.2	3.8	4	mg/l	
Sodium	25.3	27.95	30.5	4	mg/l	<= 200
Sulfates	4.7	5.7	7.5	6	mg/l	<= 250
Carbone Organique Total	0	0.46	1.3	6	mg/l C	<= 2
Ammonium	0	0	0	2	mg/l	<= 0.1
Nitrates	0	0	0	6	mg/l	<= 50
Nitrates/50 + Nitrites/3	0	0	0	2	mg/l	<= 1
Nitrites	0	0	0	2	mg/l	<= 0.1
Aluminium total	0.012	0.02	0.028	2	mg/l	<= 0.2
Arsenic	0	0	0	1	µg/l	<= 10
Baryum	0.013	0.013	0.013	1	mg/l	<= 0.7
Bore	24	24	24	1	µg/l	<= 1500
Cyanures totaux	0	0	0	1	µg/l	<= 50
Fluorures	170	170	170	1	µg/l	<= 1500
Mercure	0	0	0	1	µg/l	<= 1
Sélénium	0	0	0	1	µg/l	<= 20
Chlorure de vinyl monomère	0	0	0	1	µg/l	<= 0.5
Dichloroéthane-1,2	0	0	0	1	µg/l	<= 3
Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	<= 10
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	
Chlore libre	0.2	0.344	0.48	7	mg/l	
Chlore total	0.21	0.374	0.52	7	mg/l	
Acide bromoacétique	0.6	0.6	0.6	1	µg/l	
Acide dibromoacétique	1.3	1.3	1.3	1	µg/l	
Acide dichloroacétique	0.5	0.5	0.5	1	µg/l	
Acide monochloroacétique	0	0	0	1	µg/l	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Acide trichloroacétique	0	0	0	1	µg/l	
Acides haloacétiques (somme)	2.4	2.4	2.4	1	µg/L	<= 60
Bromates	0	0	0	1	µg/l	<= 10
Bromoforme	2.4	2.4	2.4	1	µg/l	
Chloroforme	0.61	0.61	0.61	1	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	15	15	15	1	µg/l	
Dichloromonobromométhane	3.8	3.8	3.8	1	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	21.81	21.81	21.81	1	µg/l	<= 100
17 bêta estradiol	0	0	0	1	ng/l	<= 1
Benzène	0	0	0	1	µg/l	<= 1

UP - usine VILLEMARIE COBAS

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bact et spores sulfito-rédu	0		0	6	n/100ml	= 0
Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		1	11	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	0		5	11	n/ml	
Bactéries Coliformes	0		0	11	n/100ml	= 0
E.Coli /100ml	0		0	11	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		0	11	n/100ml	= 0
Pentachlorobenzène	0	0	0	1	µg/l	
Carbonates	0	0	0	2	mg/l CO3	
CO2 libre	1.49	1.625	1.76	2	mg/l CO2	
Delta pH = PHE - PHEAU	-0.09	0.233	0.41	6	Unité pH	
Ecart pH initial et pHéq	0.14	0.17	0.2	2	Unité pH	
Equ.Calco (0;1;2;3;4)	2		4	8	Qualitatif	[1 - 2]
Hydrogénocarbonates	110	110	110	2	mg/l	
pH à température de l'eau	7.9	8.025	8.3	8	Unité pH	[6,5 - 9]
pH d'équilibre (à T pH insitu)	8.21	8.25	8.31	6	Unité pH	
pH d'équilibre à 20°C	8.19	8.195	8.2	2	Unité pH	
pH mesuré au labo	7.1	7.842	8.2	12	Unité pH	[6,5 - 9]
TH Calcique	4.475	4.972	5.25	8	°F	
TH Magnésien	3.066	3.14	3.234	8	°F	
Titre Alcalimétrique	0	0	0	8	°F	
Titre Alcalimétrique Complet	8.3	8.955	9.3	11	°F	
Titre Hydrotimétrique	7.583	8.151	8.5	11	°F	
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	5	Qualitatif	
Couleur apr. filtration simple	0	1	5	5	mg/l Pt	<= 15
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	0		0	5	Qualitatif	
Saveur (0=RAS, 1 sinon)	0		0	5	Qualitatif	
Turbidité	0	0.038	0.23	12	NFU	<= 2
Acrylamide	0	0	0	2	µg/l	<= 0.1

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Bisphenol A	0	0	0	1	µg/l	<= 2.5
Epichlorohydrine	0	0	0	2	µg/l	<= 0.1
Température de l'eau	21.1	23.336	24.3	14	°C	<= 25
Température de mesure du pH	19.3	21.18	22.7	5	°C	
Fer total	26	29.2	33	5	µg/l	<= 200
Manganèse total	0	0	0	2	µg/l	<= 50
Acetochlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Acetochlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Alachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Chlorothalonil R471811	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Metazachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metazachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metolachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metolachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Calcium	17.9	19.888	21	8	mg/l	
Chlorures	34	34.836	36	11	mg/l	<= 250
Conductivité à 20°C	262	263	264	7	µS/cm	[180 - 2000]
Conductivité à 25°C	289	294.917	306	12	µS/cm	[200 - 1200]
Magnésium	7.3	7.475	7.7	8	mg/l	
Potassium	2.6	2.85	3.3	8	mg/l	
Sodium	24.8	26.25	28	8	mg/l	<= 200
Sulfates	4.3	4.582	4.8	11	mg/l	<= 250
Carbone Organique Total	0	0.178	0.32	9	mg/l C	<= 2
Ammonium	0	0	0	5	mg/l	<= 0.5
Nitrates	0	0	0	11	mg/l	<= 50
Nitrates/50 + Nitrites/3	0	0	0	5	mg/l	<= 1
Nitrites	0	0	0	5	mg/l	<= 0.1
Aluminium total	0	0	0	2	mg/l	<= 0.2
Arsenic	0	0	0	2	µg/l	<= 10
Baryum	0	0	0	2	mg/l	<= 0.7
Bore	19	20.5	22	2	µg/l	<= 1500
Cyanures totaux	0	0	0	2	µg/l	<= 50
Fluorures	190	195	200	2	µg/l	<= 1500
Mercure	0	0	0	2	µg/l	<= 1
Sélénium	0	0	0	2	µg/l	<= 20
Chlorure de vinyl monomère	0	0	0	2	µg/l	<= 0.5
Dichloroéthane-1,2	0	0	0	2	µg/l	<= 3
Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	2	µg/l	<= 10
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	2	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	2	µg/l	
Activité alpha totale	0.028	0.028	0.028	1	Bq/l	
Activité bêta due au K40	82.1	82.1	82.1	1	mBq/l	
Activité béta résiduelle	0	0	0	1	Bq/l	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Activité béta totale	0.122	0.122	0.122	1	Bq/l	
Dose totale indicative	0	0	0	1	mSv/an	<= 0.1
Radon 222	0	0	0	1	mBq/l	<= 100000
Tritium (activité due au)	0	0	0	1	Bq/l	<= 100
Chlore libre	0.26	0.329	0.48	12	mg/l	
Chlore total	0.28	0.352	0.51	12	mg/l	
Acide bromoacétique	0	0	0	1	µg/l	
Acide dibromoacétique	0	0	0	1	µg/l	
Acide dichloroacétique	0	0	0	1	µg/l	
Acide monochloroacétique	0	0	0	1	µg/l	
Acide trichloroacétique	0	0	0	1	µg/l	
Acides haloacétiques (somme)	0	0	0	1	µg/L	<= 60
Bromates	0	0	0	2	µg/l	<= 10
Bromoforme	3.3	3.55	3.8	2	µg/l	
Chloroforme	0	0	0	2	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	1.2	1.5	1.8	2	µg/l	
Dichloromonobromométhane	0.3	0.375	0.45	2	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	4.8	5.425	6.05	2	µg/l	<= 100
17 bêta estradiol	0	0	0	1	ng/l	<= 1
Benzène	0	0	0	2	µg/l	<= 1

UP - Usine CABARET COBAS

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bact et spores sulfito-rédu	0		10	36	n/100ml	= 0
Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		6	36	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	0		7	36	n/ml	
Bactéries Coliformes	0		9	35	n/100ml	= 0
E.Coli /100ml	0		0	35	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		0	36	n/100ml	= 0
Flore saprophyte (37°C)	0		5	4	(+)	
Legionella pneumophilla	0		0	2	n/l	
Legionella spp	0		0	2	n/l	
Microcystine-LR totale	0	0	0	2	µg/l	
Microcystine-RR totale	0	0	0	2	µg/l	
Microcystine-YR totale	0	0	0	2	µg/l	
Total microcystines	0	0	0	2	µg/l	<= 1
Pentachlorobenzène	0	0	0	3	µg/l	
Carbonates	0	0	0	4	mg/l CO3	
CO2 libre	1.12	1.54	2.08	4	mg/l CO2	
Delta pH = PHE - PHEAU	-0.37	0.03	0.32	12	Unité pH	
Ecart pH initial et pHéq	-0.06	0.078	0.2	4	Unité pH	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Equ.Calco (0;1;2;3;4)	0		4	17	Qualitatif	[1 - 2]
Hydrogénocarbonates	110	117.5	120	4	mg/l	
pH à température de l'eau	7.8	8.126	8.4	16	Unité pH	[6,5 - 9]
pH d'équilibre (à T pH insitu)	8.03	8.185	8.32	13	Unité pH	
pH d'équilibre à 20°C	8.14	8.16	8.21	4	Unité pH	
pH mesuré au labo	7.3	8.006	8.3	34	Unité pH	[6,5 - 9]
TH Calcique	4.45	6.072	7.9	17	°F	
TH Magnésien	1.806	2.384	3.36	17	°F	
Titre Alcalimétrique	0	0	0	17	°F	
Titre Alcalimétrique Complet	7.1	9.219	10.4	26	°F	
Titre Hydrotimétrique	7	8.249	9.8	26	°F	
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	14	Qualitatif	
Couleur apr. filtration simple	0	0	0	13	mg/l Pt	<= 15
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	0		0	14	Qualitatif	
Saveur (0=RAS, 1 sinon)	0		0	14	Qualitatif	
Turbidité	0	0.099	0.49	34	NFU	<= 1
Acrylamide	0	0	0	4	µg/l	<= 0.1
Biphényle	0	0	0	4	µg/l	
Bisphenol A	0	0	0	2	µg/l	<= 2.5
Diéthylaniline-2,6	0	0	0	4	µg/l	
Epichlorohydrine	0	0	0	4	µg/l	<= 0.1
Température de l'eau	12.8	22.277	27.2	35	°C	<= 25
Température de mesure du pH	19	21.246	23.3	13	°C	
Fer total	8	26.154	47	13	µg/l	<= 200
Manganèse total	0	0	0	4	µg/l	<= 50
Acetochlore ESA	0	0	0	7	µg/l	<= 0.9
Acetochlore OXA	0	0	0	7	µg/l	<= 0.9
Alachlore ESA	0	0	0	7	µg/l	<= 0.9
Chlorothalonil R471811	0	0.008	0.1	12	µg/l	<= 0.9
Dimétachlore ESA (CGA 354742)	0	0	0	4	µg/L	<= 0.9
Diméthénamide ESA	0	0	0	4	µg/L	<= 0.9
Diméthénamide OXA	0	0	0	4	µg/L	<= 0.9
Metazachlore ESA	0	0	0	7	µg/l	<= 0.9
Metazachlore OXA	0	0	0	7	µg/l	<= 0.9
Metolachlore ESA	0	0.006	0.04	7	µg/l	<= 0.9
Metolachlore NOA	0	0	0	4	µg/l	<= 0.9
Metolachlore OXA	0	0.005	0.038	7	µg/l	<= 0.9
Calcium	17.8	24.288	31.6	17	mg/l	
Chlorures	43	49.585	56.3	26	mg/l	<= 250
Conductivité à 20°C	255	293.333	345	21	µS/cm	[180 - 2000]
Conductivité à 25°C	285	341.853	395	34	µS/cm	[200 - 1200]
Magnésium	4.3	5.676	8	17	mg/l	
Potassium	2.8	3.353	4.2	17	mg/l	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Sodium	27.3	35.018	45.4	17	mg/l	<= 200
Sulfates	7	7.785	9.3	26	mg/l	<= 250
Carbone Organique Total	0	0.822	2	25	mg/l C	<= 2
DCO	0	1.917	13	12	mg/l O2	
Ammonium	0	0.003	0.023	13	mg/l	<= 0.1
Nitrates	0	0.15	0.62	26	mg/l	<= 50
Nitrates/50 + Nitrites/3	0	0.001	0.007	13	mg/l	<= 1
Nitrites	0	0	0	13	mg/l	<= 0.1
Aluminium total	0	0.02	0.089	25	mg/l	<= 0.2
Arsenic	0	0	0	4	µg/l	<= 10
Baryum	0.006	0.01	0.021	4	mg/l	<= 0.7
Bore	28	40.25	46	4	µg/l	<= 1500
Cyanures totaux	0	0	0	4	µg/l	<= 50
Fluorures	110	240	300	4	µg/l	<= 1500
Mercure	0	0	0	4	µg/l	<= 1
Sélénium	0	0	0	4	µg/l	<= 20
Chlorure de vinyl monomère	0	0	0	4	µg/l	<= 0.5
Dichloroéthane-1,2	0	0	0	4	µg/l	<= 3
Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	4	µg/l	<= 10
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	4	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	4	µg/l	
Anthraquinone	0	0	0	4	µg/l	
Pesticides totaux	0	0.007	0.1	14	µg/l	<= 0.5
PCB 101	0	0	0	4	µg/l	
PCB 105	0	0	0	4	µg/l	
PCB 118	0	0	0	4	µg/l	
PCB 138	0	0	0	4	µg/l	
PCB 149	0	0	0	4	µg/l	
PCB 153	0	0	0	4	µg/l	
PCB 170	0	0	0	4	µg/l	
PCB 18	0	0	0	4	µg/l	
PCB 180	0	0	0	4	µg/l	
PCB 194	0	0	0	4	µg/l	
PCB 209	0	0	0	4	µg/l	
PCB 28	0	0	0	4	µg/l	
PCB 31	0	0	0	4	µg/l	
PCB 35	0	0	0	4	µg/l	
PCB 44	0	0	0	4	µg/l	
PCB 52	0	0	0	4	µg/l	
Somme des 7 PCBi	0	0	0	4	µg/l	
Activité alpha totale	0	0	0	1	Bq/l	
Activité bêta due au K40	123.9	123.9	123.9	1	mBq/l	
Activité béta résiduelle	0	0	0	1	Bq/l	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Activité béta totale	0.133	0.133	0.133	1	Bq/l	
Dose totale indicative	0	0	0	1	mSv/an	<= 0.1
Radon 222	5620	5620	5620	1	mBq/l	<= 100000
Tritium (activité due au)	0	0	0	1	Bq/l	<= 100
Chlore libre	0.05	0.323	0.55	36	mg/l	
Chlore total	0.06	0.352	0.55	36	mg/l	
Acide bromoacétique	0	0.25	0.5	2	µg/l	
Acide dibromoacétique	0.8	0.8	0.8	2	µg/l	
Acide dichloroacétique	0	0	0	2	µg/l	
Acide monochloroacétique	0	0	0	2	µg/l	
Acide trichloroacétique	0	0	0	2	µg/l	
Acides haloacétiques (somme)	0.8	1.05	1.3	2	µg/L	<= 60
Bromates	0	0	0	8	µg/l	<= 10
Bromoforme	4.7	9.675	17	4	µg/l	
Chloroforme	0	0	0	4	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	1.6	5.525	12	4	µg/l	
Dichloromonobromométhane	0.41	1.2	2.3	4	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	6.71	16.4	31.3	4	µg/l	<= 100
17 bêta estradiol	0	0	0	2	ng/l	<= 1
Benzène	0	0	0	4	µg/l	<= 1

UP - usine CAPLANDE COBAS

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bact et spores sulfito-rédu	0		0	5	n/100ml	= 0
Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		8	10	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	0		15	10	n/ml	
Bactéries Coliformes	0		0	10	n/100ml	= 0
E.Coli /100ml	0		0	10	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		0	10	n/100ml	= 0
Pentachlorobenzène	0	0	0	1	µg/l	
Carbonates	0	0	0	2	mg/l CO3	
CO2 libre	1.83	1.875	1.92	2	mg/l CO2	
Delta pH = PHE - PHEAU	-0.02	0.053	0.17	3	Unité pH	
Ecart pH initial et pHéq	0.12	0.145	0.17	2	Unité pH	
Equ.Calco (0;1;2;3;4)	2		2	5	Qualitatif	[1 - 2]
Hydrogénocarbonates	110	110	110	2	mg/l	
pH à température de l'eau	8	8.05	8.2	6	Unité pH	[6,5 - 9]
pH d'équilibre (à T pH insitu)	8.01	8.12	8.18	3	Unité pH	
pH d'équilibre à 20°C	8.12	8.135	8.15	2	Unité pH	
pH mesuré au labo	7.6	7.918	8.1	11	Unité pH	[6,5 - 9]
TH Calcique	6.25	6.79	8.225	5	°F	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

TH Magnésien	1.386	1.789	1.974	5	°F	
Titre Alcalimétrique	0	0	0	6	°F	
Titre Alcalimétrique Complet	9.1	9.367	9.7	9	°F	
Titre Hydrotimétrique	8.198	8.504	9.611	8	°F	
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	5	Qualitatif	
Couleur apr. filtration simple	0	0	0	5	mg/l Pt	<= 15
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	0		0	5	Qualitatif	
Saveur (0=RAS, 1 sinon)	0		0	5	Qualitatif	
Turbidité	0	0.168	0.98	11	NFU	<= 2
Acrylamide	0	0	0	2	µg/l	<= 0.1
Bisphenol A	0	0	0	1	µg/l	<= 2.5
Epichlorohydrine	0	0	0	2	µg/l	<= 0.1
Température de l'eau	19.3	21.055	21.8	11	°C	<= 25
Température de mesure du pH	19.3	21.04	22.6	5	°C	
Fer total	24	25.6	28	5	µg/l	<= 200
Manganèse total	0	0	0	2	µg/l	<= 50
Acetochlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Acetochlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Alachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Chlorothalonil R471811	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Metazachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metazachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metolachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metolachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Calcium	25	27.16	32.9	5	mg/l	
Chlorures	37	37.989	39.2	9	mg/l	<= 250
Conductivité à 20°C	279	282.167	283	6	µS/cm	[180 - 2000]
Conductivité à 25°C	309	315.818	322	11	µS/cm	[200 - 1200]
Magnésium	3.3	4.26	4.7	5	mg/l	
Potassium	1.1	2.28	2.7	5	mg/l	
Sodium	6.2	24.66	31	5	mg/l	<= 200
Sulfates	6.9	7.133	7.4	9	mg/l	<= 250
Carbone Organique Total	0	0.183	0.28	9	mg/l C	<= 2
Ammonium	0	0	0	5	mg/l	<= 0.5
Nitrates	0	0	0	9	mg/l	<= 50
Nitrates/50 + Nitrites/3	0	0	0	5	mg/l	<= 1
Nitrites	0	0	0	5	mg/l	<= 0.1
Aluminium total	0	0	0	2	mg/l	<= 0.2
Arsenic	0	0	0	2	µg/l	<= 10
Baryum	0.009	0.01	0.01	2	mg/l	<= 0.7
Bore	18	19.5	21	2	µg/l	<= 1500
Cyanures totaux	0	0	0	2	µg/l	<= 50
Fluorures	120	125	130	2	µg/l	<= 1500

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Mercure	0	0	0	2	µg/l	<= 1
Sélénium	0	0	0	2	µg/l	<= 20
Chlorure de vinyl monomère	0	0	0	2	µg/l	<= 0.5
Dichloroéthane-1,2	0	0	0	2	µg/l	<= 3
Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	2	µg/l	<= 10
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	2	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	2	µg/l	
Chlore libre	0.24	0.307	0.42	11	mg/l	
Chlore total	0.26	0.333	0.43	11	mg/l	
Acide bromoacétique	0	0	0	1	µg/l	
Acide dibromoacétique	0	0	0	1	µg/l	
Acide dichloroacétique	0	0	0	1	µg/l	
Acide monochloroacétique	0	0	0	1	µg/l	
Acide trichloroacétique	0	0	0	1	µg/l	
Acides haloacétiques (somme)	0	0	0	1	µg/L	<= 60
Bromates	0	0	0	2	µg/l	<= 10
Bromoforme	1.2	1.6	2	2	µg/l	
Chloroforme	0	0	0	2	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	0.54	0.58	0.62	2	µg/l	
Dichloromonobromométhane	0	0	0	2	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	1.74	2.18	2.62	2	µg/l	<= 100
17 bêta estradiol	0	0	0	1	ng/l	<= 1
Benzène	0	0	0	2	µg/l	<= 1

UP - usine de CAZAUX COBAS

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bact et spores sulfito-rédu	0		0	3	n/100ml	= 0
Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		1	6	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	0		0	6	n/ml	
Bactéries Coliformes	0		0	6	n/100ml	= 0
E.Coli /100ml	0		0	6	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		0	6	n/100ml	= 0
Pentachlorobenzène	0	0	0	1	µg/l	
Carbonates	0	0	0	1	mg/l CO3	
CO2 libre	1.54	1.54	1.54	1	mg/l CO2	
Delta pH = PHE - PHEAU	0.21	0.22	0.23	2	Unité pH	
Ecart pH initial et pHéq	0.23	0.23	0.23	1	Unité pH	
Equ.Calco (0;1;2;3;4)	3		3	3	Qualitatif	[1 - 2]
Hydrogénocarbonates	110	110	110	1	mg/l	
pH à température de l'eau	8	8.064	8.12	5	Unité pH	[6,5 - 9]
pH d'équilibre (à T pH insitu)	8.31	8.33	8.35	2	Unité pH	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

pH d'équilibre à 20°C	8.32	8.32	8.32	1	Unité pH	
pH mesuré au labo	7.7	7.914	8.1	7	Unité pH	[6,5 - 9]
TH Calcique	4.725	5.25	5.525	3	°F	
TH Magnésien	1.176	1.176	1.176	3	°F	
Titre Alcalimétrique	0	0	0	5	°F	
Titre Alcalimétrique Complet	8.8	8.914	9.1	7	°F	
Titre Hydrotimétrique	5.901	6.64	7.1	5	°F	
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	3	Qualitatif	
Couleur apr. filtration simple	0	0	0	3	mg/l Pt	<= 15
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	0		0	3	Qualitatif	
Saveur (0=RAS, 1 sinon)	0		0	3	Qualitatif	
Turbidité	0	0	0	7	NFU	<= 2
Acrylamide	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Bisphenol A	0	0	0	1	µg/l	<= 2.5
Epichlorohydrine	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Température de l'eau	15.3	16.4	17.6	7	°C	<= 25
Température de mesure du pH	18.8	20.1	21.3	3	°C	
Fer total	45	49	52	3	µg/l	<= 200
Manganèse total	2	2	2	1	µg/l	<= 50
Acetochlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Acetochlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Alachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Chlorothalonil R471811	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metazachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metazachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metolachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metolachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Calcium	18.9	21	22.1	3	mg/l	
Chlorures	23	23.871	24.8	7	mg/l	<= 250
Conductivité à 20°C	224	224.5	225	4	µS/cm	[180 - 2000]
Conductivité à 25°C	245	250	252	7	µS/cm	[200 - 1200]
Magnésium	2.8	2.8	2.8	3	mg/l	
Potassium	2.4	2.433	2.5	3	mg/l	
Sodium	21.9	22.733	24.3	3	mg/l	<= 200
Sulfates	0	1.543	2.1	7	mg/l	<= 250
Carbone Organique Total	0.51	0.581	0.65	7	mg/l C	<= 2
Ammonium	0	0	0	3	mg/l	<= 0.1
Nitrates	0	0	0	7	mg/l	<= 50
Nitrates/50 + Nitrites/3	0	0	0	3	mg/l	<= 1
Nitrites	0	0	0	3	mg/l	<= 0.1
Aluminium total	0	0	0	1	mg/l	<= 0.2
Arsenic	2.5	2.5	2.5	1	µg/l	<= 10
Baryum	0.02	0.02	0.02	1	mg/l	<= 0.7

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Bore	16	16	16	1	µg/l	<= 1500
Cyanures totaux	0	0	0	1	µg/l	<= 50
Fluorures	99	99	99	1	µg/l	<= 1500
Mercure	0	0	0	1	µg/l	<= 1
Sélénium	0	0	0	1	µg/l	<= 20
Chlorure de vinyl monomère	0	0	0	1	µg/l	<= 0.5
Dichloroéthane-1,2	0	0	0	1	µg/l	<= 3
Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	<= 10
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	
Chlore libre	0.16	0.264	0.34	7	mg/l	
Chlore total	0.2	0.293	0.36	7	mg/l	
Acide bromoacétique	0	0	0	1	µg/l	
Acide dibromoacétique	0.8	0.8	0.8	1	µg/l	
Acide dichloroacétique	0.5	0.5	0.5	1	µg/l	
Acide monochloroacétique	0	0	0	1	µg/l	
Acide trichloroacétique	0	0	0	1	µg/l	
Acides haloacétiques (somme)	1.3	1.3	1.3	1	µg/L	<= 60
Bromates	0	0	0	1	µg/l	<= 10
Bromoforme	3.3	3.3	3.3	1	µg/l	
Chloroforme	1.9	1.9	1.9	1	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	5.6	5.6	5.6	1	µg/l	
Dichloromonobromométhane	3.4	3.4	3.4	1	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	14.2	14.2	14.2	1	µg/l	<= 100
17 bêta estradiol	0	0	0	1	ng/l	<= 1
Benzène	0	0	0	1	µg/l	<= 1

UP - usine de Pissens COBAS

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bact et spores sulfito-rédu	0		2	15	n/100ml	= 0
Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		1	15	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	0		5	15	n/ml	
Bactéries Coliformes	0		0	15	n/100ml	= 0
E.Coli /100ml	0		0	15	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		0	15	n/100ml	= 0
Flore saprophyte (37°C)	0		0	2	(+)	
Pentachlorobenzène	0	0	0	2	µg/l	
Carbonates	0	0	0	2	mg/l CO3	
CO2 libre	1.37	1.685	2	2	mg/l CO2	
Delta pH = PHE - PHEAU	-0.1	0.174	0.46	7	Unité pH	
Ecart pH initial et pHéq	0	0.135	0.27	2	Unité pH	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Equ.Calco (0;1;2;3;4)	2		4	9	Qualitatif	[1 - 2]
Hydrogénocarbonates	120	120	120	2	mg/l	
pH à température de l'eau	8	8.1	8.3	9	Unité pH	[6,5 - 9]
pH d'équilibre (à T pH insitu)	8.11	8.289	8.46	7	Unité pH	
pH d'équilibre à 20°C	8.12	8.18	8.24	2	Unité pH	
pH mesuré au labo	7.5	7.923	8.2	13	Unité pH	[6,5 - 9]
TH Calcique	3.45	4.931	6.475	9	°F	
TH Magnésien	1.806	2.511	2.982	9	°F	
Titre Alcalimétrique	0	0	0	9	°F	
Titre Alcalimétrique Complet	8.6	9.646	10.6	13	°F	
Titre Hydrotimétrique	6.18	7.257	8.382	13	°F	
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	6	Qualitatif	
Couleur apr. filtration simple	0	0.5	3	6	mg/l Pt	<= 15
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	0		0	6	Qualitatif	
Saveur (0=RAS, 1 sinon)	0		0	6	Qualitatif	
Turbidité	0	0.142	0.97	13	NFU	<= 2
Acrylamide	0	0	0	2	µg/l	<= 0.1
Bisphenol A	0	0	0	1	µg/l	<= 2.5
Epichlorohydrine	0	0	0	2	µg/l	<= 0.1
Température de l'eau	19.4	21.844	25.1	16	°C	<= 25
Température de mesure du pH	19.1	21.217	22.7	6	°C	
Fer total	8	11.333	20	6	µg/l	<= 200
Manganèse total	0	0	0	2	µg/l	<= 50
Acetochlore ESA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Acetochlore OXA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Alachlore ESA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Chlorothalonil R471811	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Metazachlore ESA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Metazachlore OXA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Metolachlore ESA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Metolachlore OXA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Calcium	13.8	19.722	25.9	9	mg/l	
Chlorures	44.9	65.977	86	13	mg/l	<= 250
Conductivité à 20°C	298	363.571	424	7	µS/cm	[180 - 2000]
Conductivité à 25°C	333	416.692	491	13	µS/cm	[200 - 1200]
Magnésium	4.3	5.978	7.1	9	mg/l	
Potassium	3	3.256	3.5	9	mg/l	
Sodium	29.3	52.122	68.9	9	mg/l	<= 200
Sulfates	7.6	8.046	8.8	13	mg/l	<= 250
Carbone Organique Total	0.27	0.689	1.4	11	mg/l C	<= 2
Ammonium	0	0	0	6	mg/l	<= 0.5
Nitrates	0	0.065	0.54	13	mg/l	<= 50
Nitrates/50 + Nitrites/3	0	0.001	0.006	6	mg/l	<= 1

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Nitrites	0	0	0	6	mg/l	<= 0.1
Aluminium total	0	0.012	0.028	6	mg/l	<= 0.2
Arsenic	0	0	0	2	µg/l	<= 10
Baryum	0.009	0.01	0.011	2	mg/l	<= 0.7
Bore	40	46.5	53	2	µg/l	<= 1500
Cyanures totaux	0	0	0	2	µg/l	<= 50
Fluorures	230	235	240	2	µg/l	<= 1500
Mercure	0	0	0	2	µg/l	<= 1
Sélénium	0	0	0	2	µg/l	<= 20
Chlorure de vinyl monomère	0	0	0	2	µg/l	<= 0.5
Dichloroéthane-1,2	0	0	0	2	µg/l	<= 3
Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	2	µg/l	<= 10
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	2	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	2	µg/l	
Activité alpha totale	0.035	0.035	0.035	1	Bq/l	
Activité bêta due au K40	99.8	99.8	99.8	1	mBq/l	
Activité béta résiduelle	0.071	0.071	0.071	1	Bq/l	
Activité béta totale	0.171	0.171	0.171	1	Bq/l	
Dose totale indicative	0	0	0	1	mSv/an	<= 0.1
Radon 222	4600	4600	4600	1	mBq/l	<= 100000
Tritium (activité due au)	0	0	0	1	Bq/l	<= 100
Chlore libre	0.05	0.244	0.5	14	mg/l	
Chlore total	0.07	0.279	0.53	14	mg/l	
Acide bromoacétique	0.8	0.8	0.8	1	µg/l	
Acide dibromoacétique	1.6	1.6	1.6	1	µg/l	
Acide dichloroacétique	0	0	0	1	µg/l	
Acide monochloroacétique	0	0	0	1	µg/l	
Acide trichloroacétique	0	0	0	1	µg/l	
Acides haloacétiques (somme)	2.4	2.4	2.4	1	µg/L	<= 60
Bromates	0	0	0	2	µg/l	<= 10
Bromoforme	11	20.5	30	2	µg/l	
Chloroforme	0	0	0	2	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	7.5	8.05	8.6	2	µg/l	
Dichloromonobromométhane	1.3	1.55	1.8	2	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	20.3	30.1	39.9	2	µg/l	<= 100
17 bêta estradiol	0	0	0	1	ng/l	<= 1
Benzène	0	0	0	2	µg/l	<= 1

UP - usine ETOILE

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bact et spores sulfito-rédu	0		0	12	n/100ml	= 0

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		2	12	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	0		2	12	n/ml	
Bactéries Coliformes	0		0	12	n/100ml	= 0
E.Coli /100ml	0		0	12	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		0	12	n/100ml	= 0
Pentachlorobenzène	0	0	0	2	µg/l	
Carbonates	0	0	0	3	mg/l CO3	
CO2 libre	1.42	1.49	1.55	3	mg/l CO2	
Delta pH = PHE - PHEAU	0.01	0.103	0.24	4	Unité pH	
Ecart pH initial et pHéq	0.08	0.09	0.1	3	Unité pH	
Equ.Calco (0;1;2;3;4)	2		3	7	Qualitatif	[1 - 2]
Hydrogénocarbonates	110	110	110	3	mg/l	
pH à température de l'eau	8	8.129	8.2	7	Unité pH	[6,5 - 9]
pH d'équilibre (à T pH insitu)	8.21	8.253	8.32	4	Unité pH	
pH d'équilibre à 20°C	8.15	8.163	8.19	3	Unité pH	
pH mesuré au labo	7.7	7.992	8.2	13	Unité pH	[6,5 - 9]
TH Calcique	4.5	5.186	5.75	7	°F	
TH Magnésien	2.646	2.904	3.108	7	°F	
Titre Alcalimétrique	0	0	0	7	°F	
Titre Alcalimétrique Complet	8.7	9.255	9.7	11	°F	
Titre Hydrotimétrique	7.314	8.089	8.4	11	°F	
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	7	Qualitatif	
Couleur apr. filtration simple	0	0.429	3	7	mg/l Pt	<= 15
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	0		0	7	Qualitatif	
Saveur (0=RAS, 1 sinon)	0		0	7	Qualitatif	
Turbidité	0	0.056	0.53	13	NFU	<= 2
Acrylamide	0	0	0	3	µg/l	<= 0.1
Bisphenol A	0	0	0	1	µg/l	<= 2.5
Epichlorohydrine	0	0	0	3	µg/l	<= 0.1
Température de l'eau	18	23.138	24.6	13	°C	<= 25
Température de mesure du pH	18.9	21.171	22.7	7	°C	
Fer total	9	11.286	15	7	µg/l	<= 200
Manganèse total	0	0	0	3	µg/l	<= 50
Acetochlore ESA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Acetochlore OXA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Alachlore ESA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Chlorothalonil R471811	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Metazachlore ESA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Metazachlore OXA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Metolachlore ESA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Metolachlore OXA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Calcium	18	20.743	23	7	mg/l	
Chlorures	34	37.545	41.3	11	mg/l	<= 250

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Conductivité à 20°C	273	278.333	289	6	µS/cm	[180 - 2000]
Conductivité à 25°C	301	311.231	328	13	µS/cm	[200 - 1200]
Magnésium	6.3	6.914	7.4	7	mg/l	
Potassium	3.1	3.257	3.5	7	mg/l	
Sodium	28	28.757	30.8	7	mg/l	<= 200
Sulfates	5.8	6.255	6.8	11	mg/l	<= 250
Carbone Organique Total	0.24	0.425	0.8	11	mg/l C	<= 2
Ammonium	0	0	0	7	mg/l	<= 0.1
Nitrates	0	0.027	0.3	11	mg/l	<= 50
Nitrates/50 + Nitrites/3	0	0.001	0.006	7	mg/l	<= 1
Nitrites	0	0	0	7	mg/l	<= 0.1
Aluminium total	0	0.005	0.014	7	mg/l	<= 0.2
Arsenic	0	0	0	3	µg/l	<= 10
Baryum	0.006	0.008	0.009	3	mg/l	<= 0.7
Bore	24	24.667	25	3	µg/l	<= 1500
Cyanures totaux	0	0	0	3	µg/l	<= 50
Fluorures	190	200	210	3	µg/l	<= 1500
Mercure	0	0	0	3	µg/l	<= 1
Sélénium	0	0	0	3	µg/l	<= 20
Chlorure de vinyl monomère	0	0	0	3	µg/l	<= 0.5
Dichloroéthane-1,2	0	0	0	3	µg/l	<= 3
Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	3	µg/l	<= 10
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	3	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	3	µg/l	
Activité alpha totale	0.031	0.031	0.031	1	Bq/l	
Activité bêta due au K40	96.7	96.7	96.7	1	mBq/l	
Activité béta résiduelle	0.049	0.049	0.049	1	Bq/l	
Activité béta totale	0.145	0.145	0.145	1	Bq/l	
Dose totale indicative	0	0	0	1	mSv/an	<= 0.1
Radon 222	600	600	600	1	mBq/l	<= 100000
Tritium (activité due au)	0	0	0	1	Bq/l	<= 100
Chlore libre	0.15	0.257	0.34	13	mg/l	
Chlore total	0.2	0.289	0.38	13	mg/l	
Acide bromoacétique	0.8	0.8	0.8	1	µg/l	
Acide dibromoacétique	1.6	1.6	1.6	1	µg/l	
Acide dichloroacétique	0	0	0	1	µg/l	
Acide monochloroacétique	0	0	0	1	µg/l	
Acide trichloroacétique	0	0	0	1	µg/l	
Acides haloacétiques (somme)	2.4	2.4	2.4	1	µg/L	<= 60
Bromates	0	0	0	3	µg/l	<= 10
Bromoforme	10	12.667	15	3	µg/l	
Chloroforme	0	0	0	3	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	4.9	6.6	8	3	µg/l	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Dichloromonobromométhane	0.93	1.377	1.7	3	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	15.83	20.643	24.7	3	µg/l	<= 100
17 bêta estradiol	0	0	0	1	ng/l	<= 1
Benzène	0	0	0	3	µg/l	<= 1

UP - usine LA HUME COBAS

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bact et spores sulfito-rédu	0		0	6	n/100ml	= 0
Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		4	11	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	0		2	11	n/ml	
Bactéries Coliformes	0		0	11	n/100ml	= 0
E.Coli /100ml	0		0	11	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		0	11	n/100ml	= 0
Legionella pneumophilla	0		0	2	n/l	
Legionella spp	0		0	2	n/l	
Pentachlorobenzène	0	0	0	1	µg/l	
Carbonates	0	0	0	2	mg/l CO3	
CO2 libre	1.68	2.015	2.35	2	mg/l CO2	
Delta pH = PHE - PHEAU	0.04	0.183	0.38	3	Unité pH	
Ecart pH initial et pHéq	0.1	0.18	0.26	2	Unité pH	
Equ.Calco (0;1;2;3;4)	2		4	5	Qualitatif	[1 - 2]
Hydrogénocarbonates	110	115	120	2	mg/l	
pH à température de l'eau	7.9	8.017	8.2	6	Unité pH	[6,5 - 9]
pH d'équilibre (à T pH insitu)	8.13	8.183	8.28	3	Unité pH	
pH d'équilibre à 20°C	8.12	8.13	8.14	2	Unité pH	
pH mesuré au labo	7.6	7.908	8.1	12	Unité pH	[6,5 - 9]
TH Calcique	5.1	5.46	5.75	5	°F	
TH Magnésien	3.066	3.125	3.192	5	°F	
Titre Alcalimétrique	0	0	0	6	°F	
Titre Alcalimétrique Complet	8.7	9.27	9.8	10	°F	
Titre Hydrotimétrique	8.25	8.702	9.4	9	°F	
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	6	Qualitatif	
Couleur apr. filtration simple	0	0.5	3	6	mg/l Pt	<= 15
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	0		0	6	Qualitatif	
Saveur (0=RAS, 1 sinon)	0		0	6	Qualitatif	
Turbidité	0	0.018	0.21	12	NFU	<= 2
Acrylamide	0	0	0	2	µg/l	<= 0.1
Bisphenol A	0	0	0	1	µg/l	<= 2.5
Epichlorohydrine	0	0	0	2	µg/l	<= 0.1
Température de l'eau	20	23.4	26.1	12	°C	<= 25
Température de mesure du pH	19	21.35	22.4	6	°C	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Fer total	23	51.333	160	6	µg/l	<= 200
Manganèse total	0	0	0	2	µg/l	<= 50
Acetochlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Acetochlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Alachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Chlorothalonil R471811	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Metazachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metazachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metolachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metolachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Calcium	20.4	21.84	23	5	mg/l	
Chlorures	33.8	37.84	39.7	10	mg/l	<= 250
Conductivité à 20°C	272	287.667	297	6	µS/cm	[180 - 2000]
Conductivité à 25°C	296	320.5	336	12	µS/cm	[200 - 1200]
Magnésium	7.3	7.44	7.6	5	mg/l	
Potassium	3.1	3.38	3.6	5	mg/l	
Sodium	27.9	31.66	34	5	mg/l	<= 200
Sulfates	5.1	7.73	11	10	mg/l	<= 250
Carbone Organique Total	0	0.181	0.28	10	mg/l C	<= 2
Ammonium	0	0	0	6	mg/l	<= 0.5
Nitrates	0	0	0	10	mg/l	<= 50
Nitrates/50 + Nitrites/3	0	0.001	0.004	6	mg/l	<= 1
Nitrites	0	0.002	0.011	6	mg/l	<= 0.1
Aluminium total	0	0	0	3	mg/l	<= 0.2
Arsenic	0	0	0	2	µg/l	<= 10
Baryum	0	0	0	2	mg/l	<= 0.7
Bore	32	34.5	37	2	µg/l	<= 1500
Cyanures totaux	0	0	0	2	µg/l	<= 50
Fluorures	210	240	270	2	µg/l	<= 1500
Mercure	0	0	0	2	µg/l	<= 1
Sélénium	0	0	0	2	µg/l	<= 20
Chlorure de vinyl monomère	0	0	0	2	µg/l	<= 0.5
Dichloroéthane-1,2	0	0	0	2	µg/l	<= 3
Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	2	µg/l	<= 10
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	2	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	2	µg/l	
Activité alpha totale	0.043	0.043	0.043	1	Bq/l	
Activité bêta due au K40	120.5	120.5	120.5	1	mBq/l	
Activité béta résiduelle	0.045	0.045	0.045	1	Bq/l	
Activité béta totale	0.166	0.166	0.166	1	Bq/l	
Dose totale indicative	0	0	0	1	mSv/an	<= 0.1
Radon 222	0	0	0	1	mBq/l	<= 100000
Tritium (activité due au)	0	0	0	1	Bq/l	<= 100

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Chlore libre	0.11	0.325	0.5	12	mg/l	
Chlore total	0.15	0.351	0.53	12	mg/l	
Acide bromoacétique	0	0	0	1	µg/l	
Acide dibromoacétique	0	0	0	1	µg/l	
Acide dichloroacétique	0	0	0	1	µg/l	
Acide monochloroacétique	0	0	0	1	µg/l	
Acide trichloroacétique	0	0	0	1	µg/l	
Acides haloacétiques (somme)	0	0	0	1	µg/L	<= 60
Bromates	0	0	0	2	µg/l	<= 10
Bromoforme	2.7	3.15	3.6	2	µg/l	
Chloroforme	0	0	0	2	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	1.3	1.75	2.2	2	µg/l	
Dichloromonobromométhane	0.33	0.46	0.59	2	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	4.33	5.36	6.39	2	µg/l	<= 100
17 bêta estradiol	0	0	0	1	ng/l	<= 1
Benzène	0	0	0	2	µg/l	<= 1

UP - usine LA PASSERELLE COBAS

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bact et spores sulfito-rédu	0		0	5	n/100ml	= 0
Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		0	10	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	0		2	10	n/ml	
Bactéries Coliformes	0		0	10	n/100ml	= 0
E.Coli /100ml	0		0	10	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		0	10	n/100ml	= 0
Pentachlorobenzène	0	0	0	1	µg/l	
Carbonates	0	0	0	2	mg/l CO3	
CO2 libre	1.56	1.735	1.91	2	mg/l CO2	
Delta pH = PHE - PHEAU	0.16	0.248	0.37	4	Unité pH	
Ecart pH initial et pHéq	0.19	0.24	0.29	2	Unité pH	
Equ.Calco (0;1;2;3;4)	2		4	6	Qualitatif	[1 - 2]
Hydrogénocarbonates	100	100	100	2	mg/l	
pH à température de l'eau	7.9	8	8.1	6	Unité pH	[6,5 - 9]
pH d'équilibre (à T pH insitu)	8.21	8.273	8.35	4	Unité pH	
pH d'équilibre à 20°C	8.22	8.225	8.23	2	Unité pH	
pH mesuré au labo	6.1	7.827	8.2	11	Unité pH	[6,5 - 9]
TH Calcique	5.2	5.542	5.775	6	°F	
TH Magnésien	2.562	2.702	2.814	6	°F	
Titre Alcalimétrique	0	0	0	6	°F	
Titre Alcalimétrique Complet	8.1	8.489	8.8	9	°F	
Titre Hydrotimétrique	7.762	8.234	8.547	9	°F	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	5	Qualitatif	
Couleur apr. filtration simple	0	0.6	3	5	mg/l Pt	<= 15
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	0		0	5	Qualitatif	
Saveur (0=RAS, 1 sinon)	0		0	5	Qualitatif	
Turbidité	0	0.056	0.21	11	NFU	<= 2
Acrylamide	0	0	0	2	µg/l	<= 0.1
Bisphenol A	0	0	0	1	µg/l	<= 2.5
Epichlorohydrine	0	0	0	2	µg/l	<= 0.1
Température de l'eau	17.9	20.818	22.1	11	°C	<= 25
Température de mesure du pH	19.3	21.1	22.3	5	°C	
Fer total	14	15.2	17	5	µg/l	<= 200
Manganèse total	0	0	0	2	µg/l	<= 50
Acetochlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Acetochlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Alachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Chlorothalonil R471811	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Metazachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metazachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metolachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metolachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Calcium	20.8	22.167	23.1	6	mg/l	
Chlorures	33	33.522	34.4	9	mg/l	<= 250
Conductivité à 20°C	252	259.667	295	6	µS/cm	[180 - 2000]
Conductivité à 25°C	274	286	329	11	µS/cm	[200 - 1200]
Magnésium	6.1	6.433	6.7	6	mg/l	
Potassium	2.8	2.95	3.1	6	mg/l	
Sodium	21	22.733	23.6	6	mg/l	<= 200
Sulfates	5	5.156	5.4	9	mg/l	<= 250
Carbone Organique Total	0	0.109	0.24	9	mg/l C	<= 2
Ammonium	0	0	0	5	mg/l	<= 0.5
Nitrates	0	0	0	9	mg/l	<= 50
Nitrates/50 + Nitrites/3	0	0	0	5	mg/l	<= 1
Nitrites	0	0	0	5	mg/l	<= 0.1
Aluminium total	0	0	0	2	mg/l	<= 0.2
Arsenic	0	0	0	2	µg/l	<= 10
Baryum	0.005	0.006	0.006	2	mg/l	<= 0.7
Bore	15	16	17	2	µg/l	<= 1500
Cyanures totaux	0	0	0	2	µg/l	<= 50
Fluorures	160	170	180	2	µg/l	<= 1500
Mercure	0	0	0	2	µg/l	<= 1
Sélénium	0	0	0	2	µg/l	<= 20
Chlorure de vinyl monomère	0	0	0	2	µg/l	<= 0.5
Dichloroéthane-1,2	0	0	0	2	µg/l	<= 3

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	2	µg/l	<= 10
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	2	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	2	µg/l	
Activité alpha totale	0.035	0.035	0.035	1	Bq/l	
Activité bêta due au K40	88.8	88.8	88.8	1	mBq/l	
Activité béta résiduelle	0	0	0	1	Bq/l	
Activité béta totale	0.12	0.12	0.12	1	Bq/l	
Dose totale indicative	0	0	0	1	mSv/an	<= 0.1
Radon 222	0	0	0	1	mBq/l	<= 100000
Tritium (activité due au)	0	0	0	1	Bq/l	<= 100
Chlore libre	0.24	0.305	0.36	11	mg/l	
Chlore total	0.27	0.328	0.4	11	mg/l	
Acide bromoacétique	0	0	0	1	µg/l	
Acide dibromoacétique	0	0	0	1	µg/l	
Acide dichloroacétique	0	0	0	1	µg/l	
Acide monochloroacétique	0	0	0	1	µg/l	
Acide trichloroacétique	0	0	0	1	µg/l	
Acides haloacétiques (somme)	0	0	0	1	µg/L	<= 60
Bromates	0	0	0	2	µg/l	<= 10
Bromoforme	2.8	2.9	3	2	µg/l	
Chloroforme	0	0	0	2	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	1	1.1	1.2	2	µg/l	
Dichloromonobromométhane	0.21	0.235	0.26	2	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	4.01	4.235	4.46	2	µg/l	<= 100
17 bêta estradiol	0	0	0	1	ng/l	<= 1
Benzène	0	0	0	2	µg/l	<= 1

ZD - Réseau arcachon-teste-hume+

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bact et spores sulfito-rédu	0		1	174	n/100ml	= 0
Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		300	178	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	0		300	178	n/ml	
Bactéries Coliformes	0		1	177	n/100ml	= 0
E.Coli /100ml	0		0	177	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		0	178	n/100ml	= 0
Flore saprophyte (37°C)	0		1	4	(+)	
pH mesuré au labo	7.3	8.084	8.4	173	Unité pH	[6,5 - 9]
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	113	Qualitatif	
Couleur apr. filtration simple	0	0.204	10	108	mg/l Pt	<= 15
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	0		0	113	Qualitatif	
Saveur (0=RAS, 1 sinon)	0		0	113	Qualitatif	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Turbidité	0	0.096	1.5	175	NFU	<= 2
Acrylamide	0	0	0	2	µg/l	<= 0.1
Epichlorohydrine	0	0	0	2	µg/l	<= 0.1
Hydrocarbure Volatil (indice)	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Indice Hydrocarbure	0	0	0	2	mg/l	
Température de l'eau	9.9	20.472	27.3	190	°C	<= 25
Température de mesure du pH	11.9	20.244	23.2	108	°C	
Fer total	9	32.409	360	110	µg/l	<= 200
Conductivité à 20°C	228	314.828	599	64	µS/cm	[180 - 2000]
Conductivité à 25°C	255	341.552	668	172	µS/cm	[200 - 1200]
Ammonium	0	00	0.045	108	mg/l	<= 0.5
Nitrites	0	0	0	2	mg/l	<= 0.5
Aluminium total	0	0.026	0.09	106	mg/l	<= 0.2
Antimoine	0	0	0	2	µg/l	<= 10
Cadmium	0	0	0	2	µg/l	<= 5
Chrome hexavalent	0	0	0	2	µg/l	<= 6
Chrome total	0	0	0	2	µg/l	<= 50
Cuivre	0	0.008	0.016	4	mg/l	<= 2
Nickel	0	0.325	1.3	4	µg/l	<= 20
Plomb	0	0.15	0.6	4	µg/l	<= 10
Chlorure de vinyl monomère	0	0	0	10	µg/l	<= 0.5
Benzo(a)pyrène	0	0	0	2	µg/l	<= 0.01
Benzo(11,12)fluoranthène	0	0	0	2	µg/l	<= 0.1
Benzo(1,12)pérylène	0	0	0	2	µg/l	<= 0.1
Benzo(3,4)fluoranthène	0	0	0	2	µg/l	<= 0.1
Hydroca.polycycl.arom. 4sub nx	0	0	0	2	µg/l	<= 0.1
Hydrocarb.polycycl.arom. 16sub	0	0	0	2	µg/l	
Indéno(1,2,3-cd) Pyrène	0	0	0	2	µg/l	
Chlore libre	0	0.115	0.37	183	mg/l	
Chlore total	0	0.14	0.38	183	mg/l	
Bromoforme	19	23	27	2	µg/l	
Chloroforme	0	0	0	2	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	13	13.5	14	2	µg/l	
Dichloromonobromométhane	2.2	2.3	2.4	2	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	34.2	38.8	43.4	2	µg/l	<= 100

ZD - réseau de Cazaux

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bact et spores sulfito-rédu	0		0	10	n/100ml	= 0
Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		1	16	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	0		32	16	n/ml	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Bactéries Coliformes	0		0	16	n/100ml	= 0
E.Coli /100ml	0		0	16	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		0	16	n/100ml	= 0
pH mesuré au labo	7.8	7.913	8.1	16	Unité pH	[6,5 - 9]
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	10	Qualitatif	
Couleur apr. filtration simple	0	0.7	4	10	mg/l Pt	<= 15
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	0		0	10	Qualitatif	
Saveur (0=RAS, 1 sinon)	0		0	10	Qualitatif	
Turbidité	0	0.032	0.29	16	NFU	<= 2
Acrylamide	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Epichlorohydrine	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Température de l'eau	12.2	17.924	23.4	17	°C	<= 25
Température de mesure du pH	18.8	20.61	21.8	10	°C	
Fer total	43	49.3	64	10	µg/l	<= 200
Conductivité à 20°C	224	256.333	304	6	µS/cm	[180 - 2000]
Conductivité à 25°C	241	263.938	339	16	µS/cm	[200 - 1200]
Ammonium	0	0	0	10	mg/l	<= 0.5
Nitrites	0	0	0	1	mg/l	<= 0.5
Aluminium total	0	0	0	4	mg/l	<= 0.2
Antimoine	0	0	0	1	µg/l	<= 10
Cadmium	0	0	0	1	µg/l	<= 5
Chrome hexavalent	0	0	0	1	µg/l	<= 6
Chrome total	0	0	0	1	µg/l	<= 50
Cuivre	0	0.004	0.008	2	mg/l	<= 2
Nickel	0	0	0	2	µg/l	<= 20
Plomb	0	0	0	2	µg/l	<= 10
Chlorure de vinyl monomère	0	0	0	1	µg/l	<= 0.5
Benzo(a)pyrène	0	0	0	1	µg/l	<= 0.01
Benzo(11,12)fluoranthène	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Benzo(1,12)pérylène	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Benzo(3,4)fluoranthène	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Hydroca.polycycl.arom. 4sub nx	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Hydrocarb.polycycl.arom. 16sub	0	0	0	1	µg/l	
Indéno(1,2,3-cd) Pyrène	0	0	0	1	µg/l	
Chlore libre	0.08	0.25	0.37	16	mg/l	
Chlore total	0.1	0.269	0.41	16	mg/l	
Bromoforme	2.8	2.8	2.8	1	µg/l	
Chloroforme	2.1	2.1	2.1	1	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	5.1	5.1	5.1	1	µg/l	
Dichloromonobromométhane	3.4	3.4	3.4	1	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	13.4	13.4	13.4	1	µg/l	<= 100

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

ZD - Réseau gujan, teich N

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bact et spores sulfito-rédu	0		0	36	n/100ml	= 0
Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		69	61	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	0		102	61	n/ml	
Bactéries Coliformes	0		0	61	n/100ml	= 0
E.Coli /100ml	0		0	61	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		0	61	n/100ml	= 0
pH mesuré au labo	7.7	8.072	8.3	61	Unité pH	[6,5 - 9]
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	41	Qualitatif	
Couleur apr. filtration simple	0	0	0	41	mg/l Pt	<= 15
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	0		0	41	Qualitatif	
Odeur 25°C	1	1	1	1	Tx dilut.	<= 3
Saveur (0=RAS, 1 sinon)	0		0	41	Qualitatif	
Saveur 25°C	1	1	1	1	Tx dilut.	<= 3
Turbidité	0	0.073	1	61	NFU	<= 2
Acrylamide	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Epichlorohydrine	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Température de l'eau	11.7	18.391	25.9	65	°C	<= 25
Température de mesure du pH	13.7	19.466	23.3	41	°C	
Fer total	9	45.634	750	41	µg/l	<= 200
Conductivité à 20°C	243	279.25	340	20	µS/cm	[180 - 2000]
Conductivité à 25°C	268	301.23	379	61	µS/cm	[200 - 1200]
Ammonium	0	00	0.014	41	mg/l	<= 0.5
Nitrites	0	0	0	1	mg/l	<= 0.5
Aluminium total	0	0.011	0.055	16	mg/l	<= 0.2
Antimoine	0	0	0	1	µg/l	<= 10
Cadmium	0	0	0	1	µg/l	<= 5
Chrome hexavalent	0	0	0	1	µg/l	<= 6
Chrome total	0	0	0	1	µg/l	<= 50
Cuivre	0.011	0.016	0.021	2	mg/l	<= 2
Nickel	0	0	0	2	µg/l	<= 20
Plomb	0	0	0	2	µg/l	<= 10
Chlorure de vinyl monomère	0	0	0	4	µg/l	<= 0.5
Benzo(a)pyrène	0	0	0	1	µg/l	<= 0.01
Benzo(11,12)fluoranthène	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Benzo(1,12)pérylène	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Benzo(3,4)fluoranthène	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Hydroca.polycycl.arom. 4sub nx	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Hydrocarb.polycycl.arom. 16sub	0	0	0	1	µg/l	
Indéno(1,2,3-cd) Pyrène	0	0	0	1	µg/l	
Chlore libre	0.03	0.199	0.38	61	mg/l	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Chlore total	0.03	0.215	0.4	61	mg/l	
Bromoforme	3.9	3.9	3.9	1	µg/l	
Chloroforme	0	0	0	1	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	1.4	1.4	1.4	1	µg/l	
Dichloromonobromométhane	0.31	0.31	0.31	1	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	5.61	5.61	5.61	1	µg/l	<= 100

ZD - Réseau TEICH Ouest

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bact et spores sulfito-rédu	0		0	14	n/100ml	= 0
Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		41	21	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	0		85	21	n/ml	
Bactéries Coliformes	0		0	21	n/100ml	= 0
E.Coli /100ml	0		0	21	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		0	21	n/100ml	= 0
pH mesuré au labo	7.7	8.076	8.3	21	Unité pH	[6,5 - 9]
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	12	Qualitatif	
Couleur apr. filtration simple	0	0	0	12	mg/l Pt	<= 15
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	0		0	12	Qualitatif	
Saveur (0=RAS, 1 sinon)	0		0	12	Qualitatif	
Turbidité	0	0	0	21	NFU	<= 2
Acrylamide	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Epichlorohydrine	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Température de l'eau	11.9	18.844	26	25	°C	<= 25
Température de mesure du pH	15.7	19.392	21.8	12	°C	
Fer total	13	21.5	64	12	µg/l	<= 200
Conductivité à 20°C	271	279.889	287	9	µS/cm	[180 - 2000]
Conductivité à 25°C	298	312.857	336	21	µS/cm	[200 - 1200]
Ammonium	0	0.001	0.011	12	mg/l	<= 0.5
Nitrites	0	0	0	1	mg/l	<= 0.5
Aluminium total	0.011	0.021	0.034	5	mg/l	<= 0.2
Antimoine	0	0	0	1	µg/l	<= 10
Cadmium	0	0	0	1	µg/l	<= 5
Chrome hexavalent	0	0	0	1	µg/l	<= 6
Chrome total	0	0	0	1	µg/l	<= 50
Cuivre	0	0.003	0.005	2	mg/l	<= 2
Nickel	0	0.3	0.6	2	µg/l	<= 20
Plomb	0	0.3	0.6	2	µg/l	<= 10
Chlorure de vinyl monomère	0	0	0	4	µg/l	<= 0.5
Benzo(a)pyrène	0	0	0	1	µg/l	<= 0.01
Benzo(11,12)fluoranthène	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Benzo(1,12)pérylène	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Benzo(3,4)fluoranthène	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Hydroca.polycycl.arom. 4sub nx	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Hydrocarb.polycycl.arom. 16sub	0	0	0	1	µg/l	
Indéno(1,2,3-cd) Pyrène	0	0	0	1	µg/l	
Chlore libre	0.07	0.235	0.38	21	mg/l	
Chlore total	0.08	0.251	0.41	21	mg/l	
Bromoforme	22	22	22	1	µg/l	
Chloroforme	0	0	0	1	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	11	11	11	1	µg/l	
Dichloromonobromométhane	2.4	2.4	2.4	1	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	35.4	35.4	35.4	1	µg/l	<= 100

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

5.5. Energie et réactifs

Consommation d'énergie par installation

Installation de production

	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
ST 01 - ETOILE						
Energie relevée consommée (kWh)	5 473	4 615	5 165	3 939	4 326	9,8%
Consommation spécifique (Wh/m3)	11	9	10	6	6	0,0%
Volume produit refoulé (m3)	494 919	500 653	493 436	632 832	672 066	6,2%
ST 07 - PISSENS						
Energie relevée consommée (kWh)	272 267	262 600	299 505	271 361	265 813	-2,0%
Consommation spécifique (Wh/m3)	709	584	624	578	643	11,2%
Volume produit refoulé (m3)	384 046	449 834	479 985	469 555	413 167	-12,0%
ST 10 - LA HUME						
Energie relevée consommée (kWh)	446 255	418 766	515 629	606 143	486 849	-19,7%
Consommation spécifique (Wh/m3)	848	829	811	796	766	-3,8%
Volume produit refoulé (m3)	526 358	505 342	635 772	761 026	635 624	-16,5%
ST 11 - LA PASSERELLE						
Energie relevée consommée (kWh)	318 786	299 688	307 267	341 170	363 207	6,5%
Consommation spécifique (Wh/m3)	574	572	587	576	584	1,4%
Volume produit refoulé (m3)	555 311	523 744	523 260	591 914	621 943	5,1%
ST 12 - CAPLANDE						
Energie relevée consommée (kWh)	373 075	383 883	389 415	345 348	403 454	16,8%
Consommation spécifique (Wh/m3)	557	547	553	544	505	-7,2%
Volume produit refoulé (m3)	669 225	701 868	703 632	635 219	798 278	25,7%
ST 15 - CAZAUX LIBERATION						
Energie relevée consommée (kWh)	43 985	1 995	16 075	12 558	25 127	100,1%
Consommation spécifique (Wh/m3)	274	14	119	99	195	97,0%
Volume produit refoulé (m3)	160 374	147 167	135 477	126 258	128 925	2,1%
ST05-CABARET PINS (Forage)						
Volume produit refoulé (m3)	1 375 092	1 368 065	1 364 044	1 112 787	1 331 684	19,7%
ST05-CABARET PINS(Cazaux Lac)						
Energie relevée consommée (kWh)	2 057 064	2 027 885	2 000 596	1 738 906	1 617 563	-7,0%
Consommation spécifique (Wh/m3)	825	841	849	847	995	17,5%
Volume produit refoulé (m3)	2 492 529	2 411 437	2 357 527	2 052 707	1 625 001	-20,8%
ST13 - VILLEMARIE						
Energie relevée consommée (kWh)	235 385	229 130	314 592	351 828	234 626	-33,3%
Consommation spécifique (Wh/m3)	613	571	536	573	423	-26,2%
Volume produit refoulé (m3)	383 956	401 441	586 786	613 654	554 050	-9,7%

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Installation de reprise, de pompage ou surpresseur

	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
ST 09 - PISTE 214						
Energie relevée consommée (kWh)	129 485	149 594	141 635	125 417	52 435	-58,2%
Consommation spécifique (Wh/m3)	539	448	479	476	514	8,0%
Volume pompé (m3)	240 106	333 941	295 529	263 219	102 030	-61,2%
ST 14 - HAMEAU DES BARONS						
Energie relevée consommée (kWh)	10 649	10 528	10 752	7 747	10 087	30,2%
ST 16 - CAZAUX CAONE						
Energie relevée consommée (kWh)	92 368	74 480	73 415	65 517	60 127	-8,2%
Consommation spécifique (Wh/m3)	905	740	766	745	565	-24%
Volume pompé (m3)	102 020	100 647	95 839	87 997	106375	20,8%
ST 17 - CAMICAS						
Energie relevée consommée (kWh)	3 182	3 020	2 483	1 904	2 465	29,5%
Consommation spécifique (Wh/m3)	692	722	460	514	749	45,7%
Volume pompé (m3)	4 596	4 181	5 396	3 702	3 293	-11,0%
ST18 - GRANGENEUVE						
Energie relevée consommée (kWh)	74 770	70 637	72 104	69 830	73 374	5,1%
Consommation spécifique (Wh/m3)	230	234	229	217	219	0,9%
Volume pompé (m3)	325 516	301 477	315 306	321 482	334 770	4,0%

Installation de captage

	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
FORAGE CABARET DES PINS						
Volume pompé (m3)	1 375 092	1 368 065	1 364 044	1 112 787	1 330 601	19,6%
FORAGE CAONE						
Volume pompé (m3)	138 921	96 134	96 459	87 997	57 911	-34,2%
FORAGE CAPLANDE 1						
Volume pompé (m3)	22 236	0	0	71 759	98 654	37,5%
FORAGE CAPLANDE 2						
Volume pompé (m3)	663 867	697 108	697 415	585 231	691 308	18,1%
FORAGE DESBIEY						
Energie relevée consommée (kWh)	278 265	288 554	291 741	342 247	367 146	7,3%
Consommation spécifique (Wh/m3)	562	576	591	541	546	0,9%
Volume pompé (m3)	494 919	500 653	493 436	632 832	672 066	6,2%
FORAGE HUME 1						
Volume pompé (m3)	422 675	432 684	442 355	533 650	372 538	-30,2%
FORAGE HUME 2						
Volume pompé (m3)	156 400	134 514	277 945	316 164	319 701	1,1%
FORAGE LA PASSERELLE						
Volume pompé (m3)	555 311	523 744	523 260	591 914	621 943	5,1%
FORAGE LIBERATION						

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Volume pompé (m3)	35 659	55 102	44 003	43 357	75 462	74,0%
FORAGE PISSENS						
Volume pompé (m3)	384 046	449 834	479 985	469 555	413 167	-12,0%
FORAGE VILLEMARIE						
Volume pompé (m3)	424 927	435 070	584 955	615 479	538 063	-12,6%
ST 04 - CAZAUX LAC						
Energie relevée consommée (kWh)	116 948	96 408	107 305	77 247	67 665	-12,4%
Consommation spécifique (Wh/m3)	42	35	39	32	37	15,6%
Volume pompé (m3)	2 810 151	2 788 922	2 725 540	2 419 824	1 814 354	-25,0%

CONSOMMATION DE RÉACTIFS

La baisse des quantités de réactif en 2024 est liée à la baisse des volumes traités provenant du lac de Cazaux et la baisse des volumes produits.

PRODUIT	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Charbon actif en poudre	33	48	58	61	81	82,5	77,4	**36,2**
Coagulant	92	122	186	169	167	138	126,9	**81,2**
Chaux	263	201	237	212	184	187	154,7	**98,7**
CO2	187	234	177	261	249	196	181	**135**
Javel	25	36	41	38	39	45	40,5	**40,8**
Chlore gazeux	4,4	4,3	4,3	4,3	3,8	4,4	5	**4,2**
Microsable	14	13	11	11	11	17	19,8	**9,1**
Polymere	0,7	0,7	1,3	1	1,3	0,5	0,5	**0,6**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

5.6. Inventaire des installations et réseaux

Le patrimoine de la collectivité, géré dans le cadre du service de l'eau confié à SEEBAS, est composé :

- des installations de captage
- des installations de traitement
- des installations de surpression
- des stockages
- des réseaux de distribution et équipements
- des branchements jusqu'au compteur de l'abonné
- et de compteurs

Prélèvements autorisés

	Débit horaire (m3/h)	Volume journalier (m3/jour)
ST 01 - ETOILE (Desbiey)	95	1 900
ST 07 - PISSENS	120	1 500
ST 10 - LA HUME	320	6 580
ST 11 - LA PASSERELLE	120	2 880
ST 12 - CAPLANDE	210	3 625
ST 15 - CAZAUX LIBERATION	25	500
ST05-CABARET PINS (Forage)	220	5 280
ST05-CABARET PINS(Cazaux Lac)	1 000	20 000
ST13 - VILLEMARIE	150	3 000

Inventaires des installations

Installation de captage	Débit des pompes (m3/h)
FORAGE CABARET DES PINS	192
FORAGE CAONE	55
FORAGE CAPLANDE 1	18
FORAGE CAPLANDE 2	106
FORAGE DESBIEY	95
FORAGE HUME 1	70
FORAGE HUME 2	130
FORAGE LA PASSERELLE	92
FORAGE LIBERATION	34
FORAGE PISSENS	126
FORAGE VILLEMARIE	128
ST 04 - CAZAUX LAC	1000

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Installation de production	Capacité de production (m3/j)	Capacité de stockage (m3)
ST 01 - ETOILE (Desbiey)	2289	3 000
ST 07 - PISSENS	3031	6 000
ST 10 - LA HUME	4801	1 000
ST 11 - LA PASSERELLE	2211	1 500
ST 12 - CAPLANDE	2971	900
ST 15 - CAZAUX LIBERATION (Forage Libération + Forage Caone)	2120	350
ST05-CABARET PINS (Forage)	4611	
ST05-CABARET PINS(Cazaux Lac)	20 000	300+1 000
ST13 - VILLEMARIE	3086	1 000
Capacité totale	**45120**	**15050**

La capacité totale de production est calculée en utilisant les forages à leur maximum sur 24H nécessitant de demander des dérogations auprès des autorités compétentes.

Réservoir ou château d'eau	Capacité de stockage (m3)
ST 06 - LE GOLF	5 000
Capacité totale	**5 000**

Installation de reprise, de pompage ou surpresseur	Débit des pompes (m3/h)	Capacité de stockage (m3)
ST 09 - PISTE 214	45	250
ST 14 - HAMEAU DES BARONS	3	0
ST 16 - CAZAUX CAONE		500
ST 17 - CAMICAS	10	0
ST18 - GRANGENEUVE		620
Capacité totale		**1 370**

→ *L'exhaure de Cazaux Lac*



L'eau de surface est prélevée dans le lac par une prise d'eau et une station de pompage située à Cazaux. La station d'exhaure est d'une capacité de 1000 m3/h.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

La station de pompage joue aussi le rôle de station de surveillance (station d'alerte) de l'eau brute issue de la prise d'eau du Lac. Les paramètres mesurés toutes les 15 minutes (COT, température, pH, conductivité, turbidité, oxygène dissous) sont télétransmis sur le système de télégestion de l'exploitant.

Un plan d'alerte a été établi par le bureau d'études « ANTEA » courant 2012. Il aide à définir les modalités de gestion des risques de pollution au niveau de la prise d'eau.

En 2017, la mise en place de la régulation sur le pompage du Lac de Cazaux ainsi que le rapatriement de ces informations au niveau de la supervision globale a permis de gagner en efficacité d'exploitation.

La prise d'eau a subi en 2023 et début 2024, une rénovation complète par la COBAS suite à la rupture des points d'ancrage permettant de lester la conduite en PEHD. Cette opération a généré l'arrêt de la prise d'eau de novembre 2023 à Fin janvier 2024.

→ *Station Desbiey*

Cette station n'est composée que du forage d'Arcachon (Desbiey).

Cet ouvrage a été rétrocédé en 2018 à la COBAS dans le cadre de la vente du site situé au 55 cours Desbiey à Arcachon.

→ *Station l'Etoile*

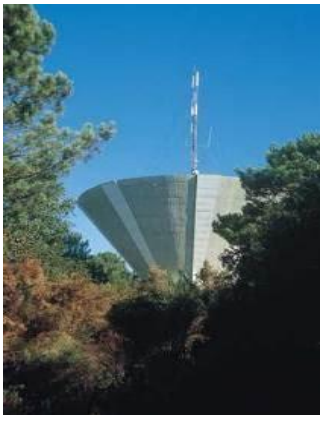

Cette station n'est composée que du château d'eau d'Arcachon d'une capacité de 3000 m3

Le refoulement du forage Desbiey se fait directement dans le réservoir. Les installations de traitement y ont été intégrées.

→ *Usine de Cabaret des pins*

Cette usine est alimentée par l'eau pompée au niveau de l'exhaure de Cazaux Lac. La filière de traitement comporte différentes étapes : traitement COT et pesticides par du charbon actif en poudre, une coagulation-floculation suivie d'une décantation par le procédé Actiflo, une ozonation, une filtration bicouche, une remise à l'équilibre et une désinfection avant envoi de l'eau dans le réseau.

La qualité physico-chimique et microbiologique des eaux du lac de Cazaux est ainsi améliorée et respecte les critères énoncés dans le décret.

L'eau du forage après désinfection est envoyée dans la bâche 1000 puis dans le réseau.

Le forage du site de Cabaret a été régénéré en 2023.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

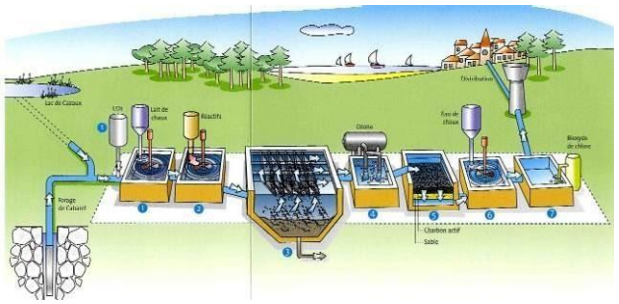

→ *Station Le Golf*

Cette station n'est composée que d'une bâche d'une capacité de 5000 m3.

→ *Usine de Pissens*

Cette station est composée de 3 entités :

- La production, composée du Forage de Pissens
- Les réservoirs de Pyla s/ mer (3 réservoirs d'une capacité totale de 6000 m3) alimentant le pyla gravitaire
- Le surpresseur de Pyla s/ Mer alimentant le pyla surpressé et la route des plages océanes (en secours, lorsque la vanne automatique des Pompiers du Pyla est ouverte).

→ *Station Piste 214*

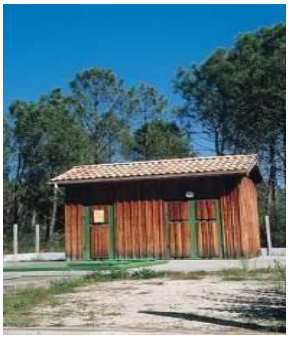

Cette station est composée d'un surpresseur équipé d'une bâche de 300 m^3 et de 3 pompes à vitesse variable. Il assure l'alimentation des réseaux des plages océanes et le Pyla surpressé (en secours, lorsque la vanne automatique des Pompiers du Pyla est ouverte).

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

→ *Vanne des Pompiers du Pyla*

Cette installation est équipée d'une vanne motorisée, permettant de mailler les réseaux des plages océanes (Piste 214) et celui du Pyla surpressé (Pissens)

→ *Usine de La Hume*

Cette usine de production est composée de 2 forages La Hume 1 et 2 d'une bâche de 1000 m3 et de 4 pompes de reprise.

En 2016, il a été effectué une régénération partielle du forage1 et pour le forage2, une régénération complète en 2023..

Une vanne automatique a été ajoutée à ce niveau du réseau afin de mailler les secteurs de La Teste de Buch et Gujan Mestras.

→ *Station La Passerelle*

Elle est composée du château d'eau de Gujan Mestras, alimenté par le forage de la passerelle.

En 2016, le forage a été régénéré. A noter, une forte dégradation du crépi a été constatée avec des chutes d'agrégats pouvant générer un risque au pied du réservoir pour les passants.

→ *Station de Caplande*

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Cette usine de production est composée de 2 forages Caplande 1 et 2, d'une bâche de 250 m3, de 2 pompes de reprise et du château d'eau du Teich d'une capacité de 650 m3.

Le forage 1 a été remis en service en 2023 et le forage2 a été régénéré en 2023 ;

→ *Station de Villemarie*

Cette station de production est composée du forage de Villemarie, d'une bâche de 1000 m3 et de 3 pompes de reprise.

En 2016 et 2023, le forage a été régénéré.

→ *Station du Hameau des Barons*

Il s'agit d'un surpresseur en ligne avec 2 pompes à vitesse variable alimentant le point haut de ce quartier. Il a été construit en 1999 et mis en service en 2000 en remplacement du surpresseur « Portes de l'Océan ».

→ *Station de Cazaux-Libération*

Cette station est composée d'un forage sur site, d'un point

de désinfection et d'un château d'eau de 350 m3. Le forage de

Caône alimente également ce réservoir en amont de la désinfection.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

→ *Station de Cazaux Caône*

Cette station est composée de :

- d'un forage qui alimente le réservoir de libération.
- d'une bâche de 500 m3
- de surpresseurs qui alimentent une partie de la ville de Cazaux dont 1 qui assure la défense incendie.

→ *Station de Camicas*

Afin d'assurer l'alimentation et la défense incendie du réseau d'alimentation de la zone de Camicas, un surpresseur est installé sur le réseau de distribution de La Teste de Buch.

→ *Station de Grangeneuve :*

Cette station est composée d'un surpresseur équipé d'une bâche de 620 m3 et de 3 pompes à vitesse variable. Il assure l'alimentation des réseaux des quartiers de Sylvabelle, Balanos et Lamothe sur l'est de la COBAS.

PYRAMIDE DES RÉSEAUX

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

I0260 - COBAS-AEP

ANNEE 2024

I0260

Matériau	Diamètre en mm	Lineaire en ml
	indéterminé	155
	<=50	0
	65	25 125
	80	12 044
	100	85 597
	125	4 318
	150	45 524
	175	1 514
	200	58 288
	250	55 096
	300	7 381
	350	240
	400	3 943
	450	0
FONTE	>450	8 562
TOTAL FONTE		307 789
	indéterminé	0
	<=32	131
	40	258
	50	2 444
	63	360
	75	0
	90	0
	110	34
	125	0
	140	0
POLYETHYLENE	>140	0
TOTAL POLYETHYLENE		3 226
	indéterminé	1 196
	<=32	404
	40	3 085
	50	8 600
	63	42 710
	75	1 651
	90	30 402
	110	111 260
	125	47 771
	140	10 955
	160	74 216
PVC	>160	7 839
TOTAL PVC		340 089

Matériau	Diamètre en mm	Lineaire en ml
	indéterminé	0
	<=65	0
	80	0
	100	6 853
	150	6 990
	200	3 746
	300	0
ACIER	>300	0
TOTAL ACIER		17 589
	indéterminé	0
	<=80	2 090
	100	2 151
	150	440
	200	0
	300	0
FIBRO CIMENT - BETON	>300	0
TOTAL FIBRO CIMENT - BETON		4 682
	indéterminé	821
	<=40	85
	60	60
	100	569
	150	276
AUTRES	>150	2 745
TOTAL AUTRES		4 556
	indéterminé	0
	<=63	0
	75	0
	90	0
	125	0
	140	0
	160	0
	200	0
	225	0
	250	0
PVC BI-ORIENTE	>250	0
TOTAL PVC BI-ORIENTE		0
	indéterminé	0
	<=100	0
INCONNU	>100	0
TOTAL INCONNU		0
TOTAL		677 931

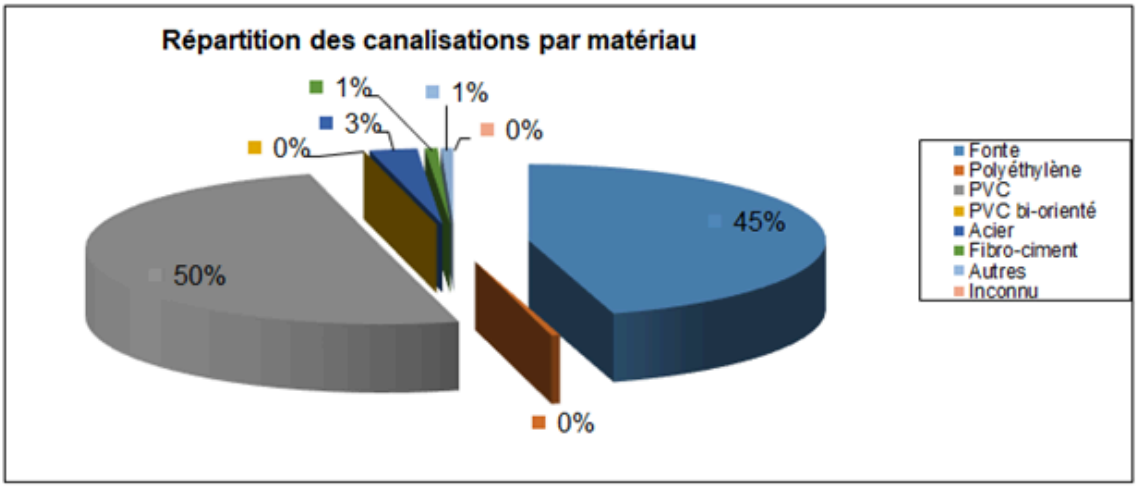

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

PYRAMIDE DES COMPTEURS

L'âge du parc compteur est de 7 ans et 5 mois

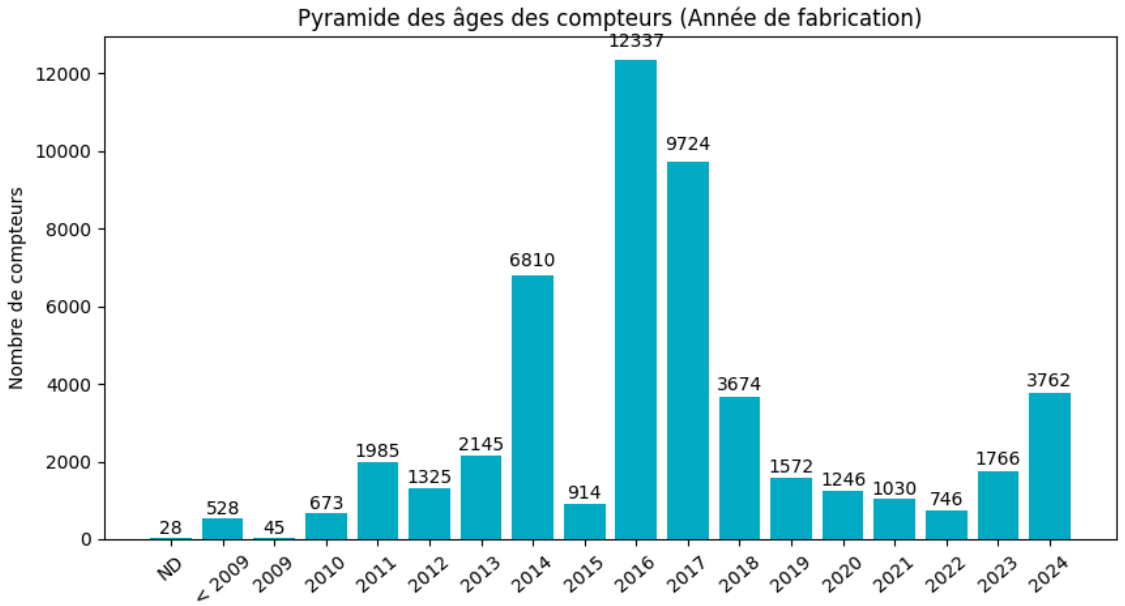

98,5% des compteurs du Parc sont équipés d'un module de télérelève

95,2% des compteurs du parc sont avec un abonnement actif

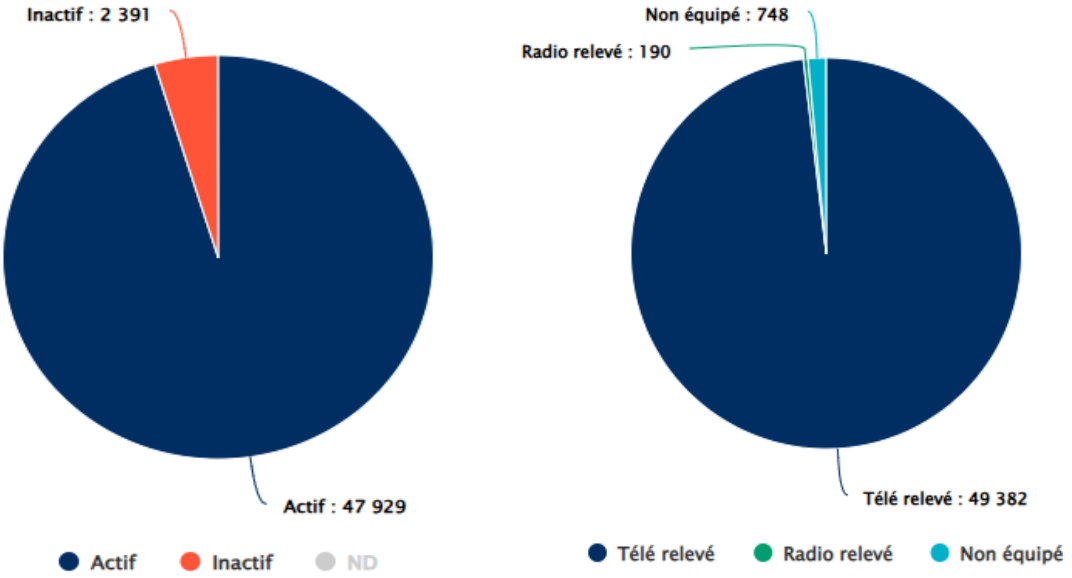

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Répartition des compteurs par diamètre:

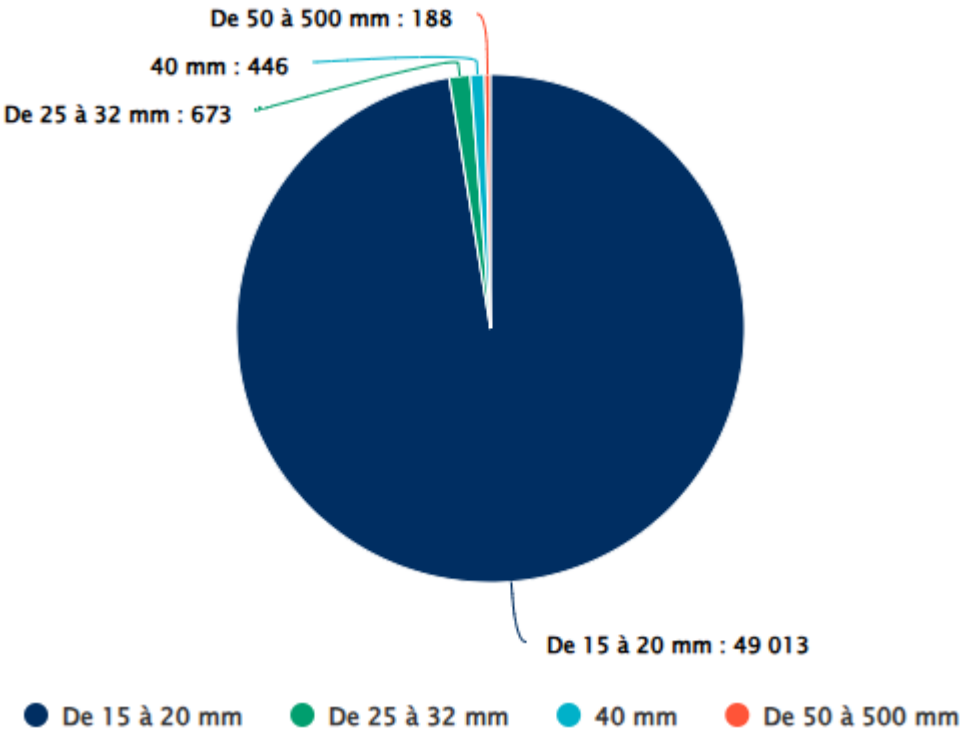

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

5.7. RÉSEAUX

INDICE DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES RÉSEAUX

Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau	2020	2021	2022	2023	2024
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux	110	110	110	110	110

Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau		Barème	Valeur ICGPR
Code VP	**Partie A : Plan des réseaux (15 points)**		
VP.236	Existence d'un plan des réseaux	10	10
VP.237	Mise à jour annuelle du plan des réseaux	5	5
Code VP	**Partie B : Inventaire des réseaux (30 points qui ne sont comptabilisés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)**		
VP.238	Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques		Oui
VP.239	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres.		99 %
VP.240	Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux à partir d'une procédure formalisée pour les informations suivantes relatives aux tronçons de réseaux : linéaire, catégorie d'ouvrage, précision cartographique, matériaux et diamètres		Oui
Combinaison des variables VP238, VP239 et VP240	Informations structurelles complètes sur tronçon (diamètre, matériaux)	15	15
VP.241	Connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations	15	15
	Total Parties A et B	**45**	**45**
Code VP	**Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points qui ne sont comptabilisés que si 40 points au moins ont été obtenus pour la partie A et B)**		
VP.242	Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes	10	10
VP.243	Inventaire pompes et équipements électromécaniques	10	10
VP.244	Dénombrement et localisation des branchements sur les plans de réseaux	10	10
VP.245	Inventaire caractéristiques compteurs et références carnet métrologique	10	10
VP.246	Inventaire secteurs de recherche de pertes eau	10	10
VP.247	Localisation des autres interventions	10	10
VP.248	Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations	10	0
VP.249	Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux	5	5
	Total:	**120**	**110**

La valeur de l'indice atteint le seuil des 40 premiers points du barème. En conséquence, le service dispose au 31 décembre 2024 du descriptif détaillé tel qu'exigé par la réglementation. Toutefois, un plan d'action visant à compléter l'inventaire des canalisations pourra être utilement mis en œuvre pour consolider ce descriptif détaillé. SEEBAS se tient à la disposition de vos services pour établir ce plan d'action.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

INVENTAIRES DES RÉSEAUX

	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
Canalisations						
Longueur totale du réseau (km)	922,3	926,0	931,5	935,2	939,6	0,5%
Longueur d'adduction (ml)	29 582	29 582	29 582	29 582	29 582	0,0%
Longueur de distribution (ml)	892 672	896 392	901 902	905 600	910 025	0,5%
dont canalisations	666 500	668 554	672 265	674 759	677 931	0,5%
dont branchements	226 172	227 838	229 637	230 841	232 094	0,5%
Equipements						
Nombre d'appareils publics	1 491	1 480	1 760	1 783	1 514	-15,1%
dont poteaux d'incendie	1 491	1 480	776	794	804	1,3%
dont bouches d'incendie	0	0	694	697	710	1,9%
dont bornes fontaine	0	0	1	1		
dont bouches d'arrosage		0	3	3		
Branchements						
Nombre de branchements	32 870	33 108	33 365	33 568	33 747	0,5%

	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1	Qualification
Compteurs							
Nombre de compteurs	48 144	48 724	49 161	49 895	50 320	0,9%	Bien de retour
dont sur abonnements en service	45 572	46 358	47 023	47 537	47 929	0,8%	
dont sur abonnements résiliés sans successeur	2 572	2 366	2 138	2 358	2 391	1,4%	

→ *Les équipements de surveillance du réseau*

Les sondes Gutermann (prélocalisateurs fixes)

Les 520 sondes Gutermann posées sur le réseau de la COBAS sont aujourd'hui utilisées dans le cadre de la recherche des fuites pour les secteurs de sectorisation urbains. Lors de la détection, dans l'hypervision, de bruits anormaux par une sonde, un agent est envoyé sur le terrain pour vérifier la présence de la fuite et procéder à la réparation.
Elles sont réparties sur les communes d'Arcachon, la Teste et Gujan. Les secteurs du Pyla, le Teich et Cazaux ne sont pas équipés de prélocalisateurs fixes. Seebas utilise des prélocalisateurs mobiles, posés en fonction des débits de nuit.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Les 520 sondes utilisent le protocole NBIOT.

Plan de localisation des prélocalisateurs fixes sur le territoire de la Cobas

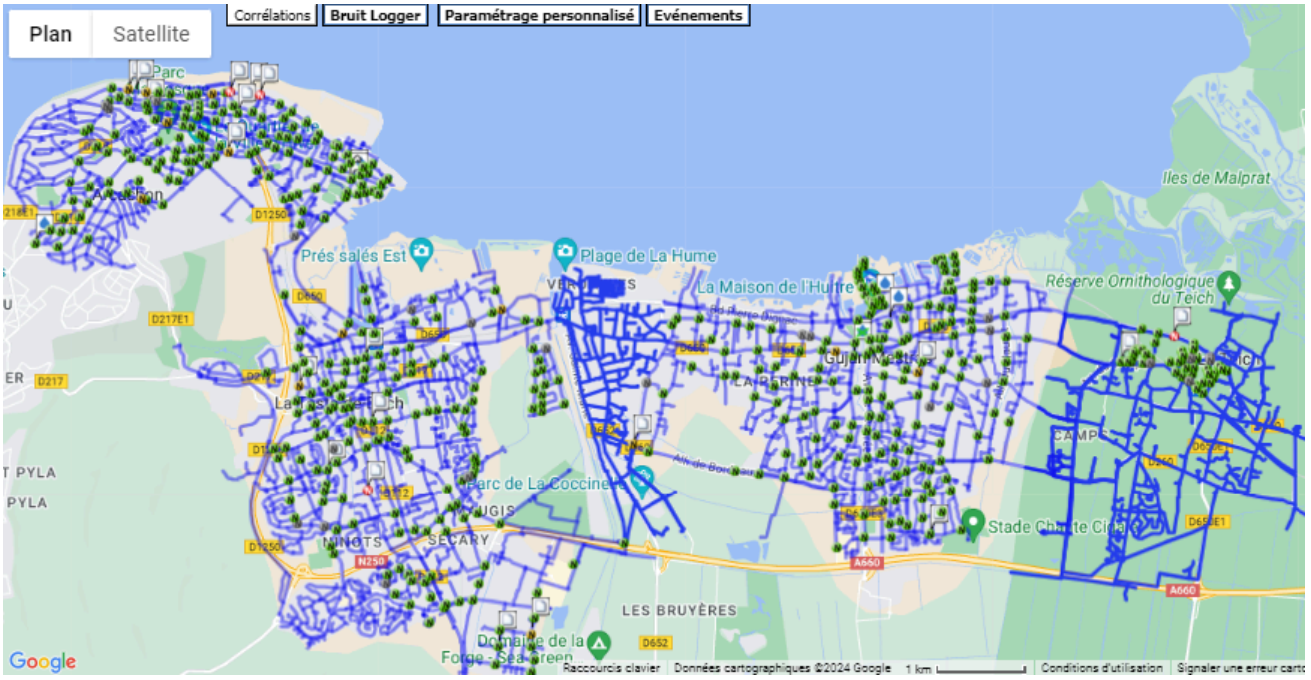

Les Apilink

Les Apilink sont les capteurs installés sur 300 poteaux incendie du réseau pour surveiller les ouvertures sauvages de poteaux et les vols d'eau associés.
Le but est d'identifier ces poteaux à risque et de quantifier le volume d'eau perdu.

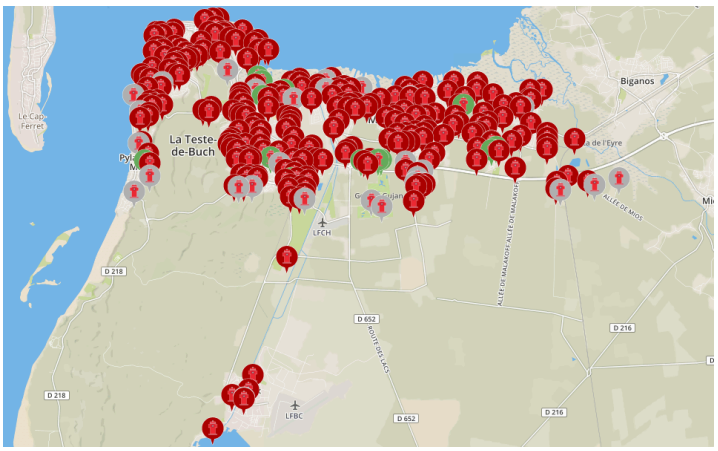

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

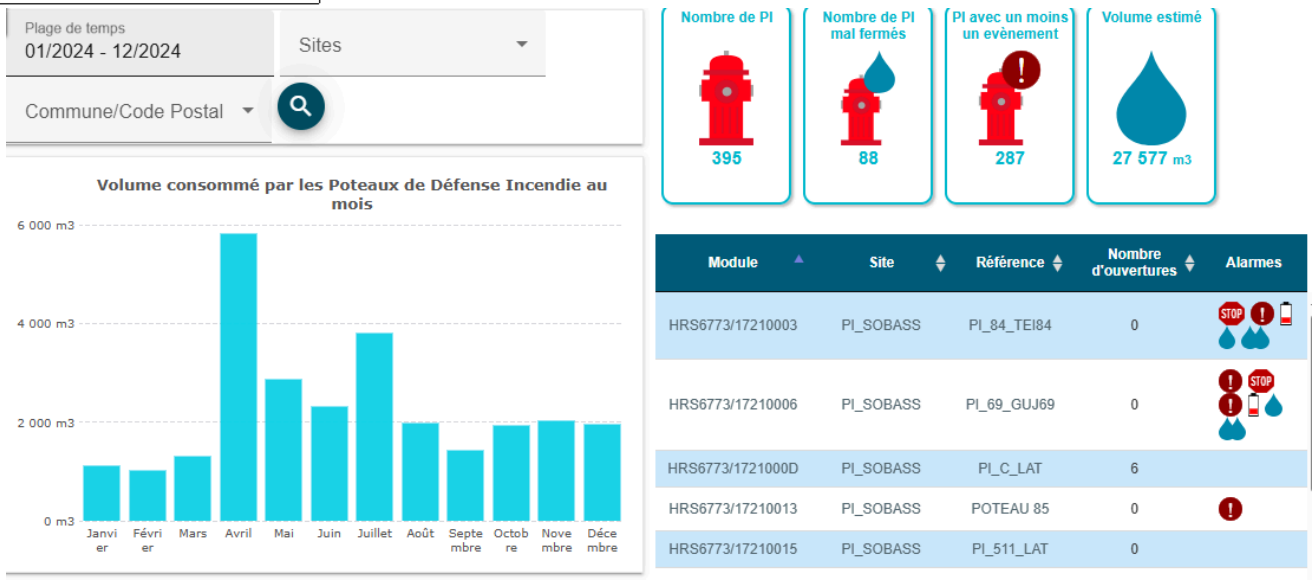

Les sondes Kapta

Cinq sondes Kapta mesurant le chlore actif, la température, la pression et la conductivité sont actuellement installées. Elles sont positionnées sur des points stratégiques du réseau : Aqualand, Centre de Dialyse, Centre Hospitalier et 2 extrémités du réseau.

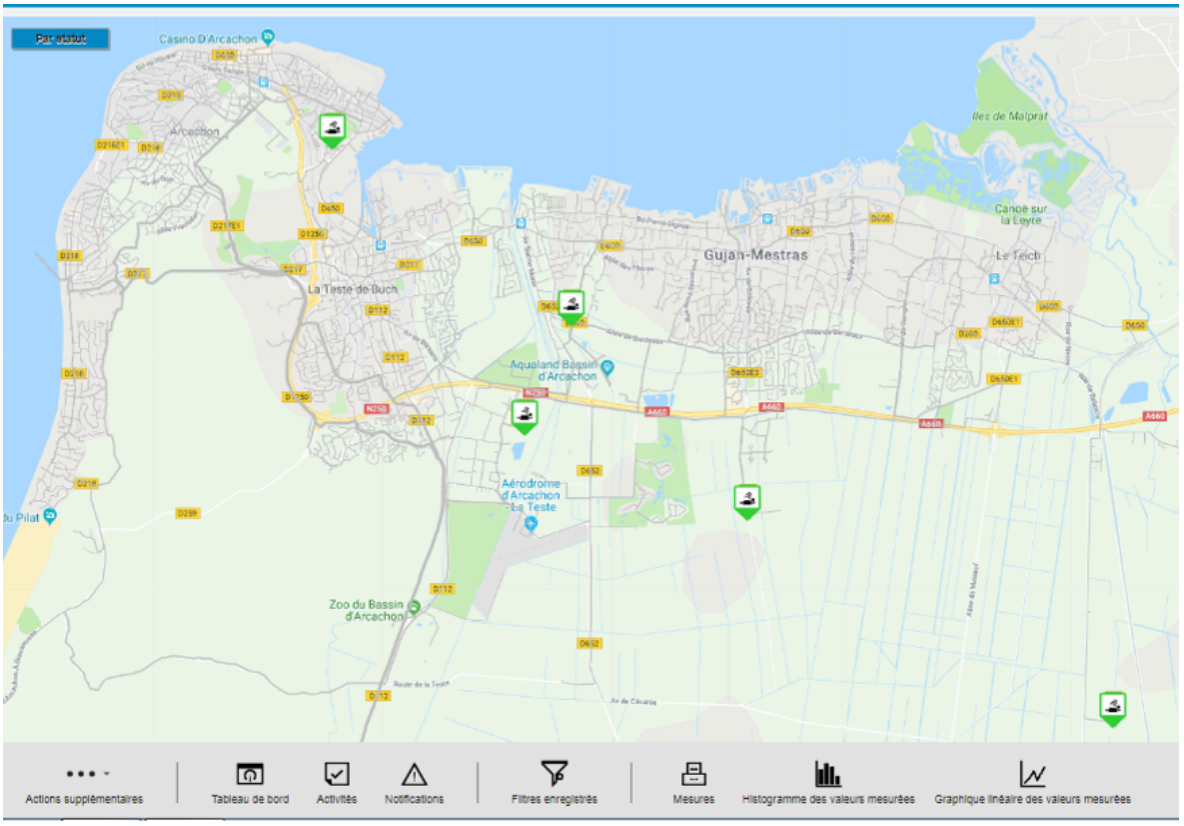

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

RENOUVELLEMENT DES CANALISATIONS

	2020	2021	2022	2023	2024
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (%)	**0,74**	**0,70**	**0,74**	**0,68**	**0,58**
Longueur du réseau de desserte (hors adduction et hors branchements) (ml)	666 500	668 554	672 265	674 759	677 931
Longueur renouvelée totale (ml)	2 783	4 625	4 045	4 240	3 890
Longueur renouvelée par le délégataire (ml)	0	0	0	0	0

RENOUVELLEMENTS DES BRANCHEMENTS

Renouvellement des branchements plomb	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
Nombre de branchements	32 870	33 108	33 365	33 568	33 747	0,5%
Branchements plomb supprimés pendant l'année (**)	0	0	0	0	0	0%

(*) inventaire effectué au vu de la partie visible au droit du compteur
(**) par le Délégataire et par la Collectivité

RENOUVELLEMENTS DES COMPTEURS

Renouvellement des compteurs	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
Nombre de compteurs	48 144	48 724	49 161	49 895	50 320	0,9%
Nombre de compteurs remplacés	439	513	477	1 002	4 003	299,5%
Taux de compteurs remplacés	0,9	1,1	1,0	2,0	8,0	300,0%

RÉPARATION DES FUITES

	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
Nombre de fuites sur canalisations	31	45	27	59	34	-42,4%
Nombre de fuites par km de canalisations	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0%
Nombre de fuites sur branchement	200	256	262	260	301	15.7%
Nombre de fuites pour 100 branchements	0,6	0,8	0,8	0,8	0.9	15.8%
Nombre de fuites sur compteur	116	114	139	185	99	-46.4%
Nombre de fuites sur équipement	24	27	13	36	34	-5,6%
Nombre de fuites réparées	371	442	441	540	468	-13.3%
Linéaire soumis à recherche de fuites	65 659	44 410	3 898	74 095	180 900	144,1%

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

5.8. GESTION DES INSTALLATIONS

MAINTENANCE DES INSTALLATIONS

Lors de ces passages sur les installations, SEEBAS réalise des opérations d'exploitation courantes telles que :

- Pilotage des installations avec réglage et contrôle de son fonctionnement ;
- Suivi analytique de l'eau produite ;
- Maintenance et réglage des appareils de chloration ;
- Etalonnage des équipements de mesures et de contrôles ;
- Paramétrage des transmetteurs et des sondes ;
- Maintenance préventive des installations ;
- Contrôle des installations électriques par un organisme agréé ;
- Nettoyage des ouvrages et entretien des espaces verts.

- Lavage des réservoirs annuel

Pour cet exercice, les dates de lavages des ouvrages de stockage sont listées dans le tableau ci-dessous :

Nom de l'installation	Descriptif	Capacité en m³	Date Nettoyage année n
ST01 - ETOILE	*Château d'eau*	3 000	29/01/2024
ST04 – CAZAUX LAC	*Bâche de reprise*	120	16/01/2024
ST05 - CABARET DES PINS	*Bâche de reprise*	1 000	15/01/2024
ST05 - CABARET DES PINS	*Bâche eau traitée*	300	15/01/2024
ST06 - LE GOLF	*Réservoir au sol*	5 000	01/02/2024
ST07 - PISSENS 500 droite	*Réservoir au sol*	500	31/01/2024
ST07 - PISSENS 500 gauche	*Réservoir au sol*	500	31/01/2024
ST07 - PISSENS 5000	*Réservoir au sol*	5 000	18/01/2024
ST09 - PISTE 214	*Bâche de reprise*	250	30/01/2024
ST10 – LA HUME	*Bâche de reprise*	1000	16/01/2024
ST11 - PASSERELLE	*Château d'eau*	1500	30/01/2024
ST12 - CAPLANDE	*Château d'eau*	650	17/01/2024
ST12 - CAPLANDE	*Bâche de reprise*	250	17/01/2024
ST13 - VILLEMARIE	*Bâche de reprise*	1000	29/01/2024
ST15 - CAZAUX LIBERATION	*Château d'eau*	350	29/01/2024
ST16 - CAZAUX CAONE	*Bâche de reprise*	500	12/02/2024
ST17 - GRANGENEUVE	*Bâche de reprise*	620	16/01/2024

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Réservoir Golf Réservoir de Passerelle


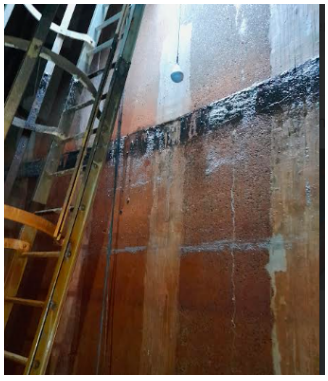

Etoile Bâche 1000 Cabaret

Des travaux hydrauliques seront à prévoir sur les réservoirs suivants:

- Réservoir de l'Etoile
- Réservoir de Passerelle

Les travaux sur la Rotonde ont été réalisés en 2023 avec reprise des canalisations hydrauliques sur la Rotonde.
Des réfection totales ou partielles (génie Civil, revêtement intérieur) devront être programmées sur les ouvrages suivants :

- Bâche 1000 usine de Cabaret (prévu au second semestre 2025)
- Réservoir sur tour de Passerelle

- Le suivi permanent du niveau des nappes et des débits de prélèvement de chaque forage

Quotidiennement, une analyse des niveaux de nappe et des débits prélevés de chaque forage est réalisée pour s'assurer du bon fonctionnement de l'ouvrage.

- Temps de marche des pompes de forage
- Débit de prélèvements
- Nombre de démarrage de la pompe de forage
- Niveau de la nappe

En 2024, SEEBAS a déployé Hubgrade Ressources pour suivre la productivité de chaque ressource.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Exemple de suivi sur le Forage de Passerelle en 2024:

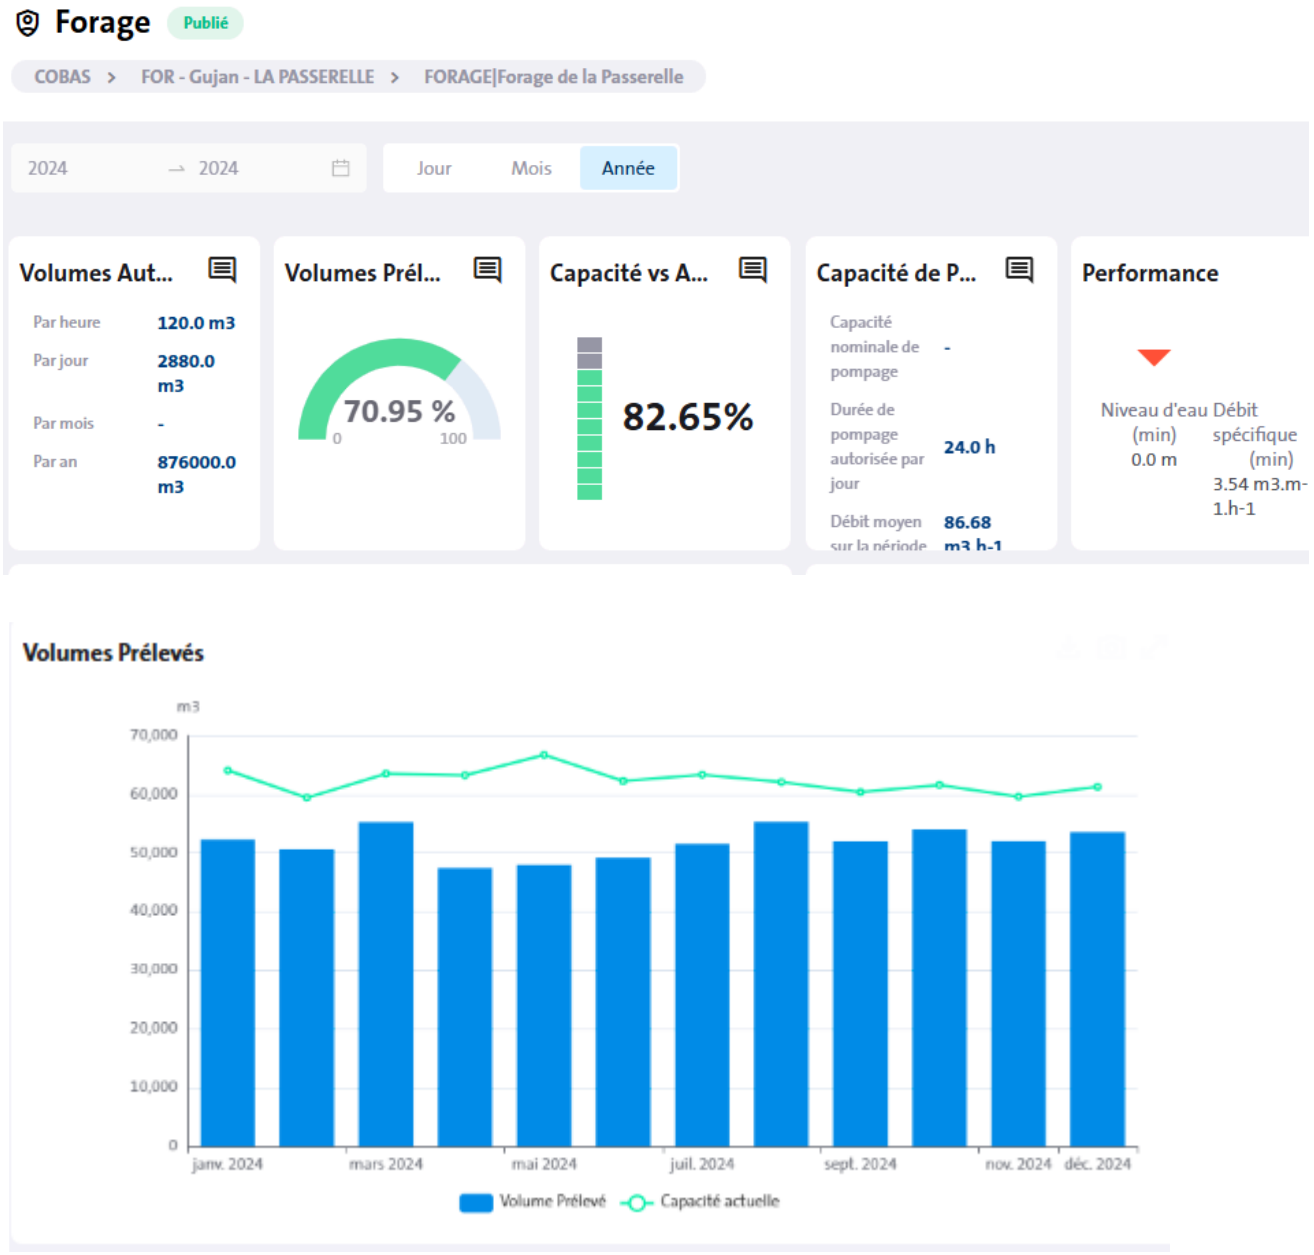

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Suivi de la performance des pompes

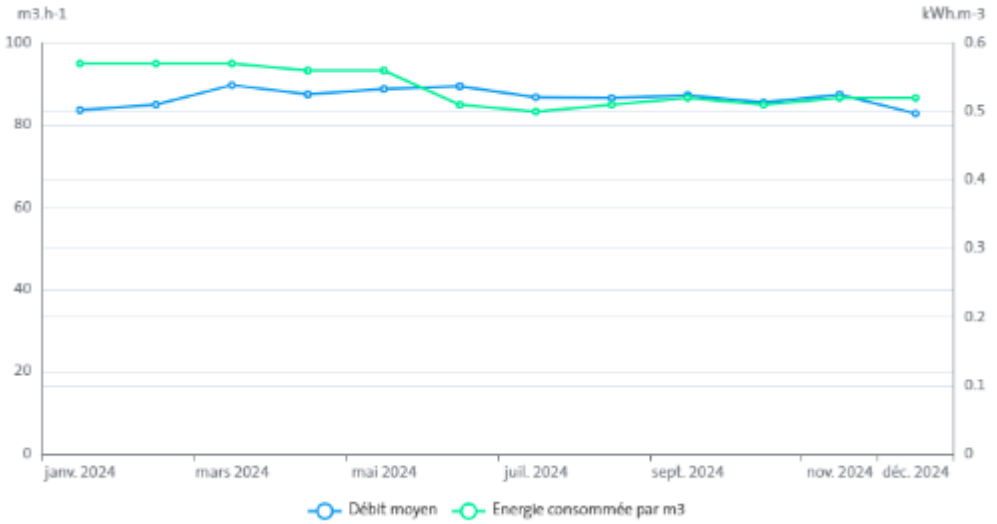

Niveau d'eau

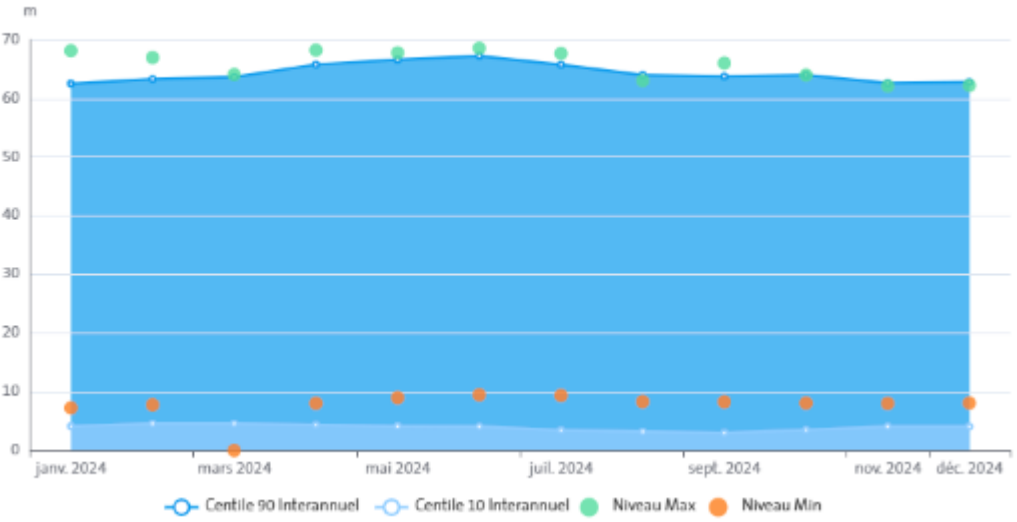

Performance du puits

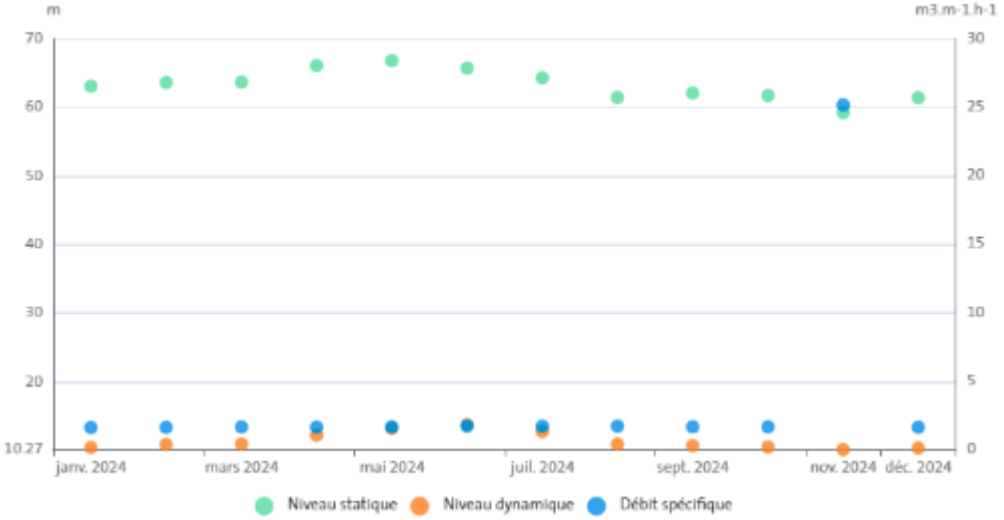

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

- Le suivi permanent du fonctionnement des installations:

- *Suivi **quotidien** des paramètres de pilotage, mesures et qualité à partir de la supervision usine et superviseur LERNE*

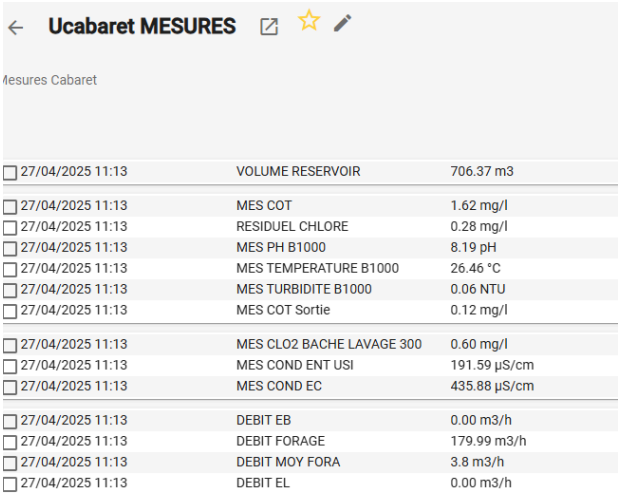

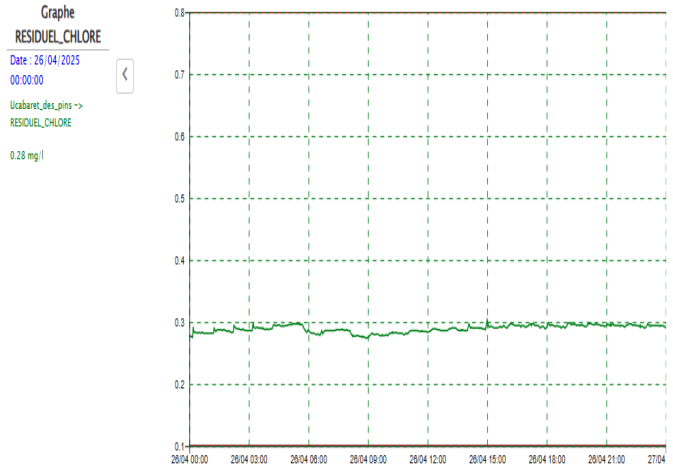

Suivi des marnages de réservoirs

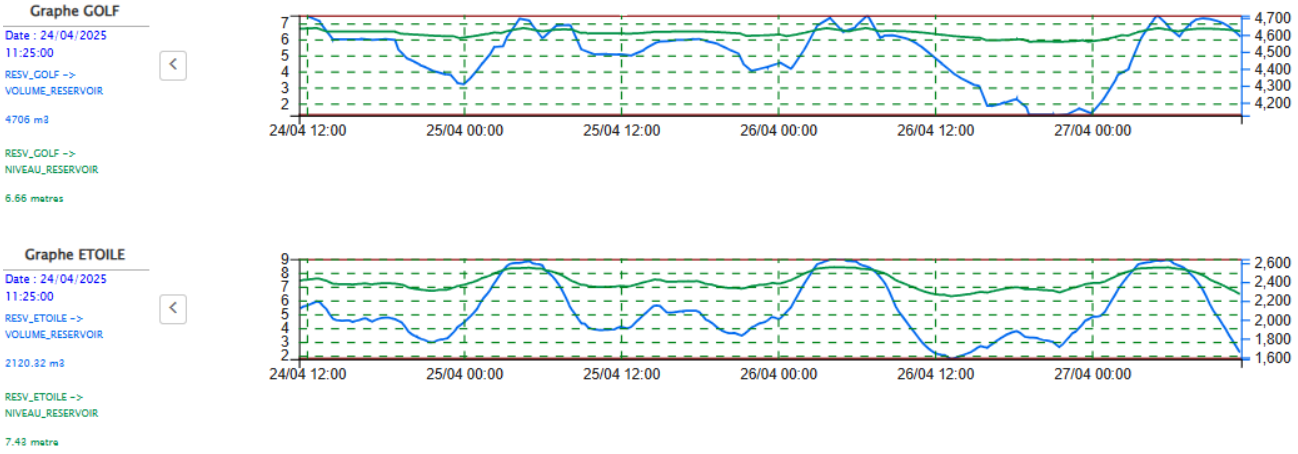

- *Suivi **hebdomadaire et mensuel** de l'ensemble des installations avec visite de chaque site pour contrôle qualité, débit et étalonnage des équipements de mesures.*

Lors de chaque visite, l'agent d'exploitation effectue la maintenance préventive, le contrôle des périmètres de protection (clôtures, portails, trappes d'accès).

L'ensemble des informations recueillies lors de chaque visite terrain est consigné dans un cahier d'exploitation

Une attention particulière est menée sur le rendement de production de l'usine de Cabaret qui s'établit à **89,6%** en 2024

CF Annexe complémentaire au RAD (détail du calcul)

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Cahier d'exploitation:

USINE DE CABARET DES PINS			NOM : GC		NOM : JF		NOM : GC		NOM : JF	
			DATE : 01/07/2024		DATE : 24/06/2024		DATE : 17/06/2024		DATE : 10/06/2024	
Actions à réaliser lors de la tournée usine										
Lecture	Temperature		21,77		20,3		21,88		19,7	
	Debit entrée usine	m3/h	690,5		700		693,1		697	
	Turbidité	± 0,1 FNU si Turb ≤ 1 ± 10 % si Turb > 1	1		1,13		1,38		1,11	
Analyse laboratoire	TAC	2°F	2		2,1		2,2		2	
Filiere										
Coagulation		**Objectif / reference**	**valeur lue**	**valeur mesurée**	**valeur lue**	**valeur mesurée**	**valeur lue**	**valeur mesurée**	**valeur lue**	**valeur mesurée**
Lecture	pH	5,9 - 6,1 / ± 0,2	6,1	6,287	6,3	6,5	6,05	6,102	6	6,11
Analyse laboratoire	TAC	4 à 5 °F	4,5		4,8		4,8		4,4	
Verifier	Presence de CAP		ok		ok		ok		ok	
Injection		**Objectif / reference**	**valeur lue**	**valeur mesurée**	**valeur lue**	**valeur mesurée**	**valeur lue**	**valeur mesurée**	**valeur lue**	**valeur mesurée**
Mesure terrain	Volume recirculation microsable	350 -550 ml	300		300		275		375	
Maturation		**Objectif / reference**	**Resultat**	**Verification**	**Resultat**	**Verification**	**Resultat**	**Verification**	**Resultat**	**Verification**
Verifier	Etat des flocs		ok		ok		ok		ok	
	Fonctionnement des pales de l'agitateur		ok		ok		ok		ok	
Actiflo		**Objectif / reference**	**Resultat**	**Verification**	**Resultat**	**Verification**	**Resultat**	**Verification**	**Resultat**	**Verification**
Verifier	Etat general		ok		propre		nettoyage à prévoir, pas d'urgence		ok	
	Turbidité	< 1 NTU	0,44		0,5		0,6		0,42	
	retour eau pompe échantillon		ok		ok		ok		ok	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

5.9. Opérations de renouvellement, de maintenance et travaux réalisés

Renouvellement installations

En 2024, nous avons finalisé le renouvellement des filtres bi-couches, 2 filtres sur 3 réalisés comprenant le remplacement du matériau Charbon actif en grain.

Nous avons également procédé au renouvellement de la pompe de forage de Cabaret (utilisation de la pompe de secours) avec modification des raccords de la colonne et l'ajout de 12 ml.

Remplacement pompe de Forage de Cabaret et renouvellement des raccords sur la colonne.

Variateur Cazaux lac Ballon hydrofort Camicas Pompe doseuse eau de chaux Débitmètre Etoile

Débimètre Golf Débitmètre Ozone Débitmètre Pissens

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Collecteur refoulement

Clapet pompe HPOC 200

Installations électromécaniques	Opération réalisée dans l'exercice	Mode de gestion
CAZAUX LAC		
CONTROLE / COMMANDE - CONTROLE / COMMANDE		
VARIATEUR P4	Renouvellement	Compte
CABARET DES PINS		
FILE EAU - ALIMENTATION EAU BRUTE		
COLONNE DE FORAGE	Rénovation	Compte
FILE EAU - TRANSFERT EAUX USINE		
CLAPET - POMPE HOPC200	Renouvellement	Compte
FILE EAU - DISTRIBUTION EAU TRAITEE		
COLLECTEUR DE REFOULEMENT LA TESTE	Renouvellement	Compte
DEBITMETRE GOLF	Renouvellement	Compte
DEBITMETRE ETOILE	Renouvellement	Compte
COMPTEUR PISSENS	Renouvellement	Compte
PRODUITS DE TRAITEMENT - CAP / CAG		
TREMIE	Renouvellement	Compte

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

CAG FILTRE BICOUCHE 1	Renouvellement	Compte
CAG FILTRE BICOUCHE 3	Renouvellement	Compte
PRODUITS DE TRAITEMENT - MICRO-SABLE POUR TRAITEME		
VIS DOSEUSE MICROSABLE	Renouvellement	Compte
CONVOYEUR / TRANSPORTEUR MICROSABLE	Renouvellement	Compte
PRODUITS DE TRAITEMENT - CHAUX ETEINTE		
DEVOUTEUR SILO CHAUX 1	Renouvellement	Compte
PRODUITS DE TRAITEMENT - OZONE		
DEBITMETRE D'OZONE	Renouvellement	Compte
PRODUITS DE TRAITEMENT - EAU DE CHAUX		
POMPE DOSEUSE EAU DE CHAUX AJUSTEMENT 3	Renouvellement	Compte
EAU DE SERVICE - DISTRIBUTION / REPARTITION / MAIL		
CONDUITE	Renouvellement	Compte
PISSENS		
DESINFECTION - CHLORE GAZEUX		
TUBING CHLORE PVDF	Renouvellement	Compte
GRANGENEUVE		
GC ET ANNEXES - AMENAGEMENTS EXTERIEURS		
CLOTURE	Renouvellement	Compte
REGENERATION FORAGES		
REGENERATION FORAGES		
REGENERATION PARTIELLE FORAGES Lot 2	Rénovation	Programme
LA PASSERELLE		
CONTROLE / COMMANDE - ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE		
VARIATEUR DE FREQUENCE	Renouvellement	Compte
CAPLANDE		
POMPAGE - ALIMENTATION EAU BRUTE		
COMPTAGE F1	Renouvellement	Programme
CAMICAS		
FILE EAU - SURPRESSION		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

BALLON HYDROFORT	Renouvellement	Programme

RENOUVELLEMENT PATRIMOINE RÉSEAUX

L'année 2024 est marquée par le renouvellement de 9 compteurs de sectorisation afin d'identifier plus précisément les secteurs fuyards:

CPT BORDEAUX		
FILE EAU - DISTRIBUTION / REPARTITION / MAILLAGE E		
DEBITMETRE	Renouvellement	Programme
CONTRÔLE/COMMANDE - DISTRIBUTION / REPARTITION /		
SUPPORT DE TELETRANSMISSION	Renouvellement	Programme
CPT CAMPS		
FILE EAU - DISTRIBUTION / REPARTITION / MAILLAGE E		
DEBITMETRE	Renouvellement	Programme
CONTRÔLE/COMMANDE - DISTRIBUTION / REPARTITION /		
SUPPORT DE TELETRANSMISSION	Renouvellement	Programme
CPT GAMBETTA		
FILE EAU - DISTRIBUTION / REPARTITION / MAILLAGE E		
DEBITMETRE	Renouvellement	Programme
CONTRÔLE/COMMANDE - DISTRIBUTION / REPARTITION /		
SUPPORT DE TELETRANSMISSION	Renouvellement	Programme
CPT MOZART		
FILE EAU - DISTRIBUTION / REPARTITION / MAILLAGE E		
DEBITMETRE	Renouvellement	Programme
CONTRÔLE/COMMANDE - DISTRIBUTION / REPARTITION /		
SUPPORT DE TELETRANSMISSION	Renouvellement	Programme
CPT GERVAIS		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

FILE EAU - DISTRIBUTION / REPARTITION / MAILLAGE E		
DEBITMETRE	Renouvellement	Compte
CONTROLE/COMMANDE - DISTRIBUTION / REPARTITION / M		
SUPPORT DE TELETRANSMISSION	Renouvellement	Compte
CPT FUSILLE		
FILE EAU - DISTRIBUTION / REPARTITION / MAILLAGE E		
DEBITMETRE	Renouvellement	Compte
CONTROLE/COMMANDE - DISTRIBUTION / REPARTITION /		
SUPPORT DE TELETRANSMISSION	Renouvellement	Compte
CPT VERDUN		
FILE EAU - DISTRIBUTION / REPARTITION / MAILLAGE E		
DEBITMETRE	Renouvellement	Programme
CONTRÔLE/COMMANDE - DISTRIBUTION / REPARTITION /		
SUPPORT DE TELETRANSMISSION	Renouvellement	Programme
CPT VIGNES		
FILE EAU - DISTRIBUTION / REPARTITION / MAILLAGE E		
DEBITMETRE	Renouvellement	Programme
CONTRÔLE/COMMANDE - DISTRIBUTION / REPARTITION /		
SUPPORT DE TELETRANSMISSION	Renouvellement	Programme
CPT VILLEMARIE		
FILE EAU - DISTRIBUTION / REPARTITION / MAILLAGE E		
DEBITMETRE	Renouvellement	Programme
CONTRÔLE/COMMANDE - DISTRIBUTION / REPARTITION /		
SUPPORT DE TELETRANSMISSION	Renouvellement	Programme

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Cpt villemarie

cpt Verdun

Cpt Mozart

CP Vignes

CP Gervais

CP Fusillé

Cp Camps

Cp BordeauX

Date	Commune	Adresse	Entreprise	Diametre	commentaires
25/11/24	La Teste de Buch	SQ des baies	sobass	DN65	renouvellement d'une ventouse

DIVERS RESEAU		
DIVERS		
200 sondes Guterman	Renouvellement	Compte

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

50 CAPTEURS SURVEILLANCE PI\BI	Rénovation	Compte
Renouvellement ventouses	Renouvellement	Compte
Vanne DN100 Rue Jehenne Arcachon	Renouvellement	Compte
Vanne DN150 Avenue Chênes vert angle Hermitage	Renouvellement	Compte

RENOUVELLEMENT VANNES RÉSEAUX

Vanne DN150 Chênes verts Pyla - Vanne DN100 Rue Jehenne Arcachon - Vanne DN100 Miquelots La Teste
50 Apilink remplacés sur PI 200 sondes Gutterman avec nouvelle technologie NBIOT

Réseaux	Quantité renouvelée dans l'exercice	Mode de gestion
Réseau (lot)		
COMPTEURS EAU	4003	Programme
BRANCHEMENTS EAU	424	Programme
BRANCHEMENTS EAU ISOLÉ	58	Programme

En 2024, les renouvellements de branchements n'ont pas occasionné de surcoût par rapport à la présence d'amiante dans les enrobés.

Détail des renouvellement de branchement à la rue:

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

2024	RUE VEYRIER MONTAGNERES	ARCACHON	SADE	4
2024	RUE A. DAISSON	GUJAN MESTRAS	SADE	5
2024	BD DU PYLA	LA TESTE DE BUCH	SADE	16
2024	RUE A. LALESQUE	LA TESTE DE BUCH	SADE	18
2024	BD COTE D ARGENT	ARCACHON	SADE	18
2024	PLACE JEAN HAMEAU	LA TESTE DE BUCH	SADE	8
2024	BD COTE D ARGENT PHASE 2	ARCACHON	SADE	18
2024	RUE E. DAUBRIC	GUJAN MESTRAS	SADE	15
2024	RUE PEYRET POQUE	LA TESTE DE BUCH	SADE	32
2024	ALLEE DE LA MULE	GUJAN MESTRAS	SADE	18
2024	RUE DU MARECHAL FOCH	GUJAN MESTRAS	SADE	60
2024	RUE PETITE FORET	LE TEICH	SADE	9
2024	RUE R. SANCHEZ	LA TESTE DE BUCH	SADE	63
2024	AV PASTEUR	LA TESTE DE BUCH	SADE	11
2024	RUE GUYNEMER	LA TESTE DE BUCH	SADE	45
2024	RUE EDMOND DORE	LA TESTE DE BUCH	SADE	29
2024	RUE BOSQUET DE CIGALE	GUJAN MESTRAS	SADE	41
2024	ROUTE DES LACS	GUJAN MESTRAS	SADE	14
2024	ISOLE			58
				482

Détail des renouvellements de branchements isolés

Rnvt brchts suite à fuite en 2024				
Date	**Communes**	**Rue**	**Diametre**	**Nature**
08/01/2024	La Teste de Buch	4 squares ludwig van beethoven	25	pebd
02/01/2024	La Teste de Buch	361 rue denis papin	25	pebd
03/01/2024	Gujan Mestras	port de larros	25	pebd
15/01/2024	Arcachon	residance lou bercail	32	pebd
23/01/2024	Gujan Mestras	rue jules barat	25	pebd
24/01/2024	Gujan Mestras	40 Rue du docteur Duffour	25	pebd
07/02/2024	Le Teich	28 avenue de la cote d'argent	25	pebd
21/02/2024	La Teste de Buch	RUE JEAN SAINT MARC	25	pebd
23/02/2024	Le Teich	145 avenue de camps	25	pebd
01/03/2024	Le Teich	50 route de balanos	50	pebd
18/03/2024	Gujan Mestras	11 impasse chante claire	25	pebd
18/04/2024	Gujan Mestras	11 allée chante claire	25	pebd
10/05/2024	Arcachon	23 Rue Albert 1er	25	pebd
16/05/2024	Gujan Mestras	12 Allée Chante clair	25	pebd
18/05/2024	Gujan Mestras	5 impasse de chante claire	25	pebd
28/05/2024	La Teste de Buch	17 rue des vieux chene	25	Pebd
03/06/2024	Gujan Mestras	10 route des lacs	25	pebd

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

05/06/2024	La Teste de Buch	10 allée des Sorbiers.	25	Pebd
07/05/2024	La Teste de Buch	5 allee l'airial	25	pebd
07/06/2024	Gujan Mestras	54 cour de verdun	25	pebd
17/06/2024	Gujan Mestras	152 avenue sainte marie	25	pebd
18/06/2024	La Teste de Buch	13 rue vieux chene	25	pebd
24/06/2024	Le Teich	1 allee fontaine saint jean	25	pebd
25/06/2024	Le Teich	40 avenue de la cote d'argent	25	pebd
04/07/2024	Gujan Mestras	allee edourd branly	50	pebd
22/06/2024	Arcachon	8 rue des subrocs	28	cuivre
17/07/2024	Gujan Mestras	83 cours de la republique	25	pebd
22/07/2024	La Teste de Buch(Cazaux)	1 allee du cap du mount	25	pebd
31/07/2024	Gujan Mestras	12 allee pierre ronsard	25	pebd
01/08/2024	Le Teich	1 chemin des catalans	25	pebd
01/07/2024	Gujan Mestras	Impasse privée Paul Bataille	32	pebd
01/07/2024	Gujan Mestras	Impasse privée Paul Bataille	32	pebd
01/07/2024	Gujan Mestras	Impasse privée Paul Bataille	32	pebd
01/07/2024	Gujan Mestras	Impasse privée Paul Bataille	32	pebd
09/08/2024	La Teste de Buch	7 square Beethoven	25	pebd
09/08/2024	La Teste de Buch	5 Square Beethoven	25	pebd
26/08/2024	Le Teich	15 rue mauras	25	pebd
27/08/2024	La Teste de Buch	8 rue des sorbiers	25	pebd
21/08/2024	Gujan Mestras	13 allée de bordeaux	25	pebd
11/09/2024	Arcachon	rue marguerite	22	cuivre
20/09/2024	Gujan Mestras	avenue sainte marie	25	pebd
28/09/2024	La Teste de Buch	32 rue dade	32	pebd
02/10/2024	La Teste de Buch(Cazaux)	2 rue des ecureuils	25	pebd
07/10/2024	Le Teich	22 rue du Bouscaut	25	PVC
08/10/2024	Arcachon	11 allée Jules Vernes	22	Cuivre
09/10/2024	Arcachon	1 Allée Chambrelent	22	Cuivre
14/10/2024	Gujan Mestras	5 impasse chante clair	25	pebd

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

18/10/2024	Gujan Mestras	3 rue d'arcole	25	pebd
24/10/2024	Gujan Mestras	10 allée des chenes	25	pebd
25/10/2024	Arcachon	2 allee de chambrelent	22	Cuivre
25/10/2024	Arcachon	5 allee de chambrelent	22	Cuivre
04/11/2024	Arcachon	7 allee de chambrelent	28	Cuivre
04/11/2024	Arcachon	3 allee de chambrelent	22	Cuivre
04/11/2024	Arcachon	1 allee de chambrelent	32	Cuivre
15/11/2024	Gujan Mestras	9 B allée de Cazaux	32	PEBD
10/12/2024	Arcachon	10 rue alfred dejean	28	Cuivre
11/12/2024	La Teste de Buch	18 rue jean mermoz	28	Cuivre
24/12/2024	Gujan Mestras	14 allee des vanneaux	50	pebd

TRAVAUX NEUFS DÉLÉGATAIRE INSTALLATIONS

En 2024, nous avons installé un Groupe électrogène sur le site de l'exhaure de Cazaux lac permettant de sécuriser énergétiquement la production à partir du lac de Cazaux ainsi qu'un inverseur de souce sur le site de Caplande. Ces dépenses ont été intégrées au fond de sécurisation contractuel..

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

TRAVAUX NEUFS DÉLÉGATAIRE RÉSEAUX

Les principales opérations réalisées par le délégataire figurent au tableau suivant :

✓ Pas d'extension de réseau réalisée par le délégataire.

✓ Les branchements neufs : **179** unités

39,7% des branchements neufs sont réalisés sur la commune de Gujan Mestras

✓ Les compteurs neufs : **490** unités,

93% des compteurs neufs sont de diamètre 15mm
37% posés sur la commune de Gujan

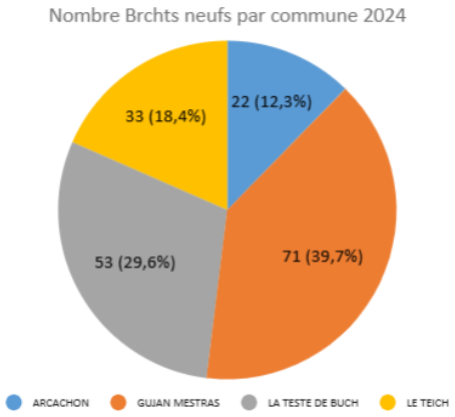

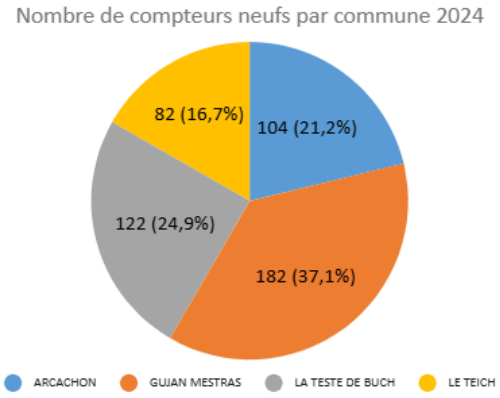

OPÉRATIONS DE MAINTENANCE RÉSEAUX

- **Contrôle des ventouses**

Une campagne de contrôles de ventouse sur la conduite d'eau brute entre la prise d'eau du lac de Cazaux et l'usine de production a été lancée fin 2024. A l'issue des diagnostics, 2 ventouses ont été renouvelées début 2025.
SEEBAS a également contrôlé les ventouses sur les secteurs du Pyla courant 2024. Une ventouse a été renouvelée au niveau du square des baies, Pyla sur mer.

- **Purge de canalisation et branchement**

Mensuellement, les purges automatiques sont contrôlées pour vérifier le bon fonctionnement.

- Volume comptabilisé
- Contrôle des paramètres physico-chimique
- Teneur en chlore

Lors des pesées des équipements incendie et suite aux réclamations qualité eau des usagers, **38** purges manuelles ont été réalisées sur les canalisations et branchements d'eau potable.

- **Manœuvre de vanne réseau et arrêt d'eau**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

107 arrêts d'eau sur canalisation ont été réalisés pour effectuer des travaux correctifs et préventifs (travaux de renouvellement de canalisation). Cette activité est accompagnée d'un contrôle systématique des vannes.

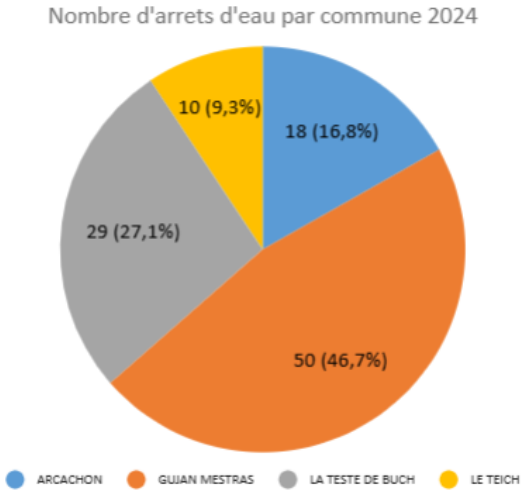

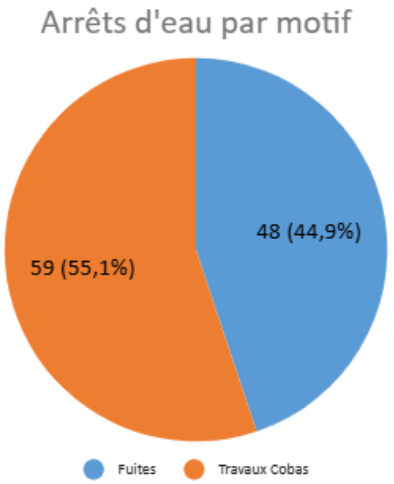

Date	Commune	Adresse	Nature	date arret	heures arrêt	commentaires
09/01/24	La Teste de Buch	rue des facteurs	Fuite	09/01/2024	10h00 - 12h00	changement collier
16/01/24	Gujan Mestras	rue docteur dufourg	Travaux	16/01/2024	09h00-12 h00	pose des vannes
13/01/24	Arcachon	boulevard de La teste	Fuite	13/01/2024	8h30 - 11h15	Fuite 200 Fonte
16/01/24	Gujan Mestras	boulevard pierre dignac	Fuite	16/01/2024	11h-13h	fuite sur conduite 63 PVC
15/01/24	La Teste de Buch	rue roger dubois	Fuite	15/01/2024	09h00-14 h30	fuite sur 125 PVC
19/01/24	Arcachon	rue jehenne	Travaux	22/01/2024	13h00-17 h00	changement vanne et réparation branchement
23/01/24	Gujan Mestras	avenue de chante cigale	Travaux	26/01/2024	08h00-12 h00	prélèvement de la conduite cobas
24/01/24	La Teste de Buch	rue president carnot	Travaux	30/01/2024	09h00_12 h00	raccordement vanne pour la cobas
24/01/24	La Teste de Buch	rue president carnot	Travaux	31/01/2024	09h00_12 h00	raccodement vanne pour la cobas
24/01/24	La Teste de Buch	rue desbiey	Travaux	01/02/2024	09h00_12 h00	raccodement vanne pour la cobas
30/01/24	Gujan Mestras	cour de la marne	Fuite	30/01/2024	09h00-12 hoo	fuite sur robinet de prise
01/02/24	Gujan Mestras	rue de la pelouse	Fuite	01/02/2024	15h00-17 h30	fuite sur conduite de 40 fonte
02/02/24	Gujan Mestras	cours de la marne	Travaux	06/02/2024	13h00-17 h00	raccordement conduite pour la cobas

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

02/02/24	Arcachon	rue grenier	Travaux	06/02/2024	13h00-17 h00	raccordement vanne pour la cobas
05/02/24	Le Teich	75 avenue de la cote d'argent	Fuite	05/02/2024	10h00-12 h00	reparation conduite 63 PVC
07/02/20 24	La Teste de Buch	rue du bois de rome	Travaux	16/02/2024	08h00-12 h00	raccordement conduite pour cobas
12/02/20 24	Arcachon	rue grenier	Travaux	15/02/2024	13h00-17 h00	raccordement conduite pour la cobas
15/02/20 24	Arcachon	rue grenier	Travaux	20/02/2024	08h00-12 h00	raccordement conduite pour cobas
21/02/20 24	Gujan Mestras	rue de paul pouget	Travaux	27/02/2024	08h00-12 h00	raccordement conduite por cobas
22/02/20 24	La Teste de Buch	rue des poilus	Fuite	22/02/2024	08h00-12 h00	fuite sur conduite de 100 fonte
28/02/20 24	Arcachon	boulevard prom veyrie montagnere	Fuite	28/02/2024	11h18-13 h30	fuite suite a un branchement neuf collier
29/02/20 24	Gujan Mestras	rue de paul pouget	Travaux	29/02/2024	08h30-12 h00	raccordement conduite pour cobas
01/03/20 24	Le Teich	route de balanos	Travaux	01/03/2024	08h30-12 h00	Fuite sur un collier
14/03/20 24	Arcachon	boulevard de la plage	Fuite	14/03/2024	09h00-10 h00	Fuite sur un collier
15/03/20 24	Arcachon	boulevard de la plage	Fuite	15/03/2024	09h00-10 h00	Fuite sur un collier
15/03/20 24	Gujan Mestras	rue du haurats	Fuite	15/03/2024	09h00-15 h30	fuite sur conduite 160 pvc
20/03/20 24	Arcachon	rue du capitaine allégre	Fuite	20/03/2024	08h30-19 h30	fuite sur conduite 200 fonte
20/03/20 24	La Teste de Buch	10 joliot curie	Fuite	20/03/2024	10h00-12 h00	fuite sur conduite 90 PVC
20/03/20 24	La Teste de Buch	49 avenue de louis gaume	Travaux	20/03/2024	15h30-16 h30	travaux branchement
23/03/20 24	La Teste de Buch	boulevard du pyla	Travaux	23/03/2024	13h00-17 h00	travaux branchement
24/03/20 24	Gujan Mestras	avenue de la gare	Travaux	26/03/2024	15h00-17 h00	travaux branchement
24/03/20 24	Arcachon	rue george méran	Travaux	27/03/2024	08h00-12 h00	pose d'un PI pour cobas
04/04/20 24	La Teste de Buch	place jean hameau	Travaux	04/04/2024	08h00-12 h00	travaux conduite
30/03/20 24	La Teste de Buch	boulevard des miquelot	Fuite	30/03/2024	17h00-23 h59	fuite sur une vanne de 100 branchee sur du 250 fonte
05/04/20 24	La Teste de Buch	RUE PResident COTY	Fuite	05/04/2024	13H30-17 H00	FUITE SUR CONDUITE 60 FONTE
08/04/20 24	Arcachon	rue du capitaine allégre	Travaux	15/04/2024	19H00-00 H00	raccordement conduite pour cobas

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

17/04/2024	La Teste de Buch	rue andre lesca	Fuite	17/04/2024	10h00-12h00	fuite au niveau du collier de prise
18/04/2024	La Teste de Buch	place jean hameau	Travaux	24/04/2024	08h00-12h00	raccordement conduite pour cobas
22/04/2024	Gujan Mestras	port de larros	Fuite	22/04/2024	09h00-10h00	fuite conduite
26/04/2024	Gujan Mestras	port de larros	Fuite	26/04/2024	09h00-10h00	fuite conduite
02/05/2024	Le Teich	avenue de camps	Travaux	02/05/2024	10h00-12h30	changement debimetre
15/05/2024	Gujan Mestras	rue Edmond Daubric	Travaux	22/05/2024	08H00-12H00	raccordement conduite pour cobas
15/05/2024	Gujan Mestras	rue jules barat	Travaux	21/05/20204	08H00-12H00	raccordement conduite pour cobas
21/05/2024	Gujan Mestras	rue jules barat	Travaux	28/05/2024	08H00-12H00	raccordement conduite pour cobas
22/05/2024	Le Teich	rue de l'industrie	Fuite	22/05/2024	13h30-15h00	fuite sur collier
22/05/2024	Gujan Mestras	rue du port	Travaux	29/05/2024	13h00-17h00	pose d'une vanne de 200
22/05/2024	Gujan Mestras	avenue de saint marie	Travaux	24/05/2024	09h00-12h00	raccordement conduite pour cobas
27/05/2024	La Teste de Buch	boulevard des cretes	Manoeuvres	27/05/2024	11h00-13h00	manoeuvre de vanne
28/05/2024	Gujan Mestras	allee de la mule	Fuite	28/05/2024	13h30 -16h00	casse de conduite 63 pvc
29/05/2024	Gujan Mestras	RUE GAMBETTA	Travaux	05/06/2024	08h00-12h00	raccordement conduite pour cobas
29/05/2024	Gujan Mestras	du theatre	Travaux	06/06/2024	08h00-12h00	raccordement conduite pour cobas
29/05/2024	Gujan Mestras	RUE DU DR DUFOURG	Travaux	11/06/2024	08h00-12h00	raccordement conduite pour cobas annulé
29/05/2024	Gujan Mestras	RUE DU DR DUFOURG	Travaux	12/06/2024	08h00-12h00	raccordement conduite pour cobas
31/05/2024	Le Teich	rue de la gare	Fuite	31/05/2024	08h30-12h00	fuite sur branchement
03/06/2024	Gujan Mestras	allee des pre sales	Travaux	07/06/2024	13h-17h00	raccordement conduite pour cobas
05/06/2024	Gujan Mestras	impasse de cazeaux	Fuite	05/06/2024	13h30-15h00	fuite conduite
05/06/2024	Arcachon	Boulevard de la plage	Fuite	05/06/2024	15h00-17h00	fuite au niveau d'une bouche incendie casse par service mairie
06/06/2024	La Teste de Buch	Boulevard de l'ocean	Fuite	06/06/2024	21h00-04h00	reparation conduite 100 fonte avec sade
10/06/2024	Gujan Mestras	13 route des lacs	Fuite	10/06/2024	10h00-12h00	reparation conduite 100 fonte

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

10/06/2024	Gujan Mestras	allee des lavandieres	Travaux	17/06/2024	08h00-12h00	raccordement conduite pour cobas
10/06/2024	Gujan Mestras	allee des violettes	Travaux	18/06/2024	08h00-12h00	raccordement conduite pour cobas
10/06/2024	Gujan Mestras	allee des tulipes	Travaux	19/06/2024	08h00-12h00	raccordement conduite pour cobas
11/06/2024	Gujan Mestras	rue du port	Travaux	17/06/2024	08h00-12h00	raccordement conduite pour cobas
13/06/2024	La Teste de Buch	boulevard de l'ocean	Fuite	13/06/2024	13h30-16h30	fuite au niveau d'branchement
17/06/2024	Gujan Mestras	Avenue sainte marie	Travaux	25/06/2024	08h00-12h00	raccordement conduite pour cobas
17/06/2024	Gujan Mestras	Avenue sainte marie	Travaux	26/06/2024	08h00-12h00	raccordement conduite pour cobas
18/06/2024	Arcachon	rue de saint-elme	Fuite	18/06/2024	16h30-20h00	fuite conduite
20/06/2024	Le Teich	avenue de la cote d'argent	Fuite	20/06/2024	08h00-10h00	fuite sur RP
02/07/2024	Le Teich	avenue des fleurs	Fuite	02/07/2024	13h30-15h00	fuite sur RP
08/07/2024	Arcachon	rue lydia	Fuite	08/07/2024	13H30-15H00	fuite sur conduite 125 PVC
12/07/2024	Gujan Mestras	allee marc nouaux	Travaux	18/07/2024	08h00-12h00	raccordement conduite pour cobas
19/07/2024	Gujan Mestras	allee marc nouaux	Travaux	24/07/2024	08h00-12h00	raccordement conduite pour cobas
22/07/2024	Le Teich	avenue de la cote d'argent	Fuite	22/07/2024	09h30-12h00	fuite sur collier
24/07/2024	Gujan Mestras	allee de marc nouaux	Travaux	01/08/2024	08h00-12h00	raccordement conduite pour cobas
24/07/2024	Gujan Mestras	allee des lilas	Travaux	31/07/2024	08h00-12h00	raccordement conduite pour cobas
26/07/2024	Gujan Mestras	allee de marc nouaux	Fuite	26/07/2024	15h00-16h00	fuite sur collier
04/09/2024	Gujan Mestras	allée des grives	Fuite	04/09/2024	13h-21h30	casse conduite 110 pvc
04/09/2024	Gujan Mestras	RUE DU DR DUFOURG	Travaux	10/09/2024	08h00-12h00	raccordement conduite pour cobas
05/09/2024	Gujan Mestras	rue des douves	Travaux	12/09/2024	13h00-17h00	raccordement pi
12/09/2024	Arcachon	rue guynemer	Fuite	12/09/2024	10h30-12h30	fuite sur collier
22/10/2024	Gujan Mestras	avenue césaré	Fuite	22/10/2024	07h30-11h00	fuite conduite
22/10/2024	La Teste de Buch (Cazaux)	avenue raymond sanchez	Fuite	23/10/2024	08h30-12h00	diver fuite sur des colliers de branchement

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

23/10/2024	Gujan Mestras	allée de la peguiller	Travaux	28/10/2024	08h30-12h00	raccordement conduite pour cobas
24/10/2024	Gujan Mestras	allee des chenes	Fuite	24/10/2024	14h00-15h00	diver fuite sur des colliers de branchement
24/10/2024	Arcachon	1 allee des primeveres	Fuite	24/10/2024	15h00-16h00	diver fuite sur des colliers de branchement
24/10/2024	Le Teich	allee de canteranne	Travaux	29/10/2024	13h00-17h00	raccordement conduite pour cobas
4/11/2024	La Teste de Buch (Cazaux)	avenue raymond sanchez	Fuite	04/11/2024	08h30-12h00	diver fuite sur des colliers de branchement
05/11/2024	La Teste de Buch	rue de lagrua	Travaux	06/11/2024	05h00-07h00	changement vanne casse
05/11/2024	La Teste de Buch	rue camille pelletan	Fuite	05/11/2024	17:00-22:00	fuite conduite 100 fonte
12/11/2024	Gujan Mestras	rue des domaine	Travaux	18/11/2024	08h-12h00	raccordement conduite pour cobas
12/11/2024	Gujan Mestras	rue du muguet	Travaux	19/11/2024	08h-12h00	raccordement conduite pour cobas
12/11/2024	Gujan Mestras	rue des lilas	Travaux	20/11/2024	08h-12h00	raccordement conduite pour cobas
12/11/2024	Gujan Mestras	rue des mimosas	Travaux	21/11/2024	08h-12h00	raccordement conduite pour cobas
13/11/2024	La Teste de Buch	rue eugene chevreul	Travaux	20/11/2024	13h-17h00	raccordement conduite pour cobas
14/11/2024	Gujan Mestras	rue des fauvettes	Fuite	14/11/2024	15h00-17h00	fuite sur conduite de 60 fonte
25/11/2024	La Teste de Buch	SQ des baies	Travaux	25/11/2024	14h00-14h30	renouvelement d'une ventouse
28/11/2024	La Teste de Buch	allee des bouvreuils	Fuite	28/11/2024	12h00-15h00	fuite au niveau de la conduite de 100
6/12/2024	Gujan Mestras	route des lacs	Travaux	10/12/2024	08h00-12h00	raccordement conduite pour cobas
12/12/2024	Arcachon	allee elisee reclus	Fuite	12/12/2024	13h30-15h30	fuite sur conduite de 80 fonte
13/12/2024	La Teste de Buch	rue des boiens	Fuite	13/12/2024	08k30-12h00	fuite sur conduite de 125 pvc
13/12/2024	Arcachon	allee jules verne	Travaux	18/12/2024	10h00-12h00	raccordement conduite pour cobas
13/12/2024	La Teste de Buch	rue president carnot	Travaux	17/12/2024	13H00-17H00	raccordement conduite pour cobas
15/12/2024	La Teste de Buch	Boulevard de l'industrie	Fuite	15/12/2024	08H00-11HOO	fuite sur conduite
17/12/2024	La Teste de Buch	rue president carnot	Travaux	18/12/2024	13H00-17H00	raccordement conduite pour cobas
18/12/2024	Le Teich	allee canteranne	Travaux	18/12/2024	08H00-11HOO	raccordement conduite pour cobas

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

25/12/2024	Gujan Mestras	allee de bordeaux	Fuite	25/12/2024	13H00-17H00	fuite sur conduite 110 PVC
28/12/2024	Gujan Mestras	allee de bordeaux	Travaux	28/12/2024	08H00-11HOO	changement de la coquille par 2 gibots

RECHERCHE DE FUITES

Suite à l'augmentation importante des fuites et à l'analyse des débits de nuit via la sectorisation, des campagnes de recherche de fuite ont été lancées (180,9 Km inspectés, +144% par rapport à 2023) en complément de l'analyse quotidienne des prélocalisateurs fixes.
105 fuites ont été décelées par la recherche de fuite, soit par prélocalisateurs mobiles soit par prélocalisateurs fixes.

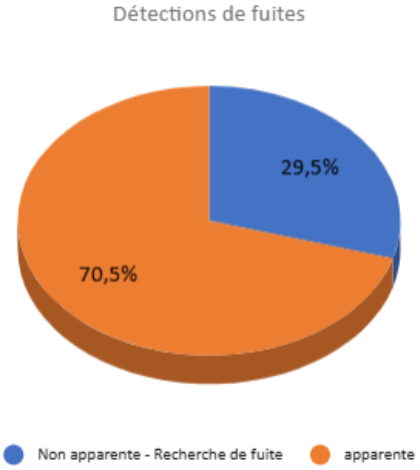

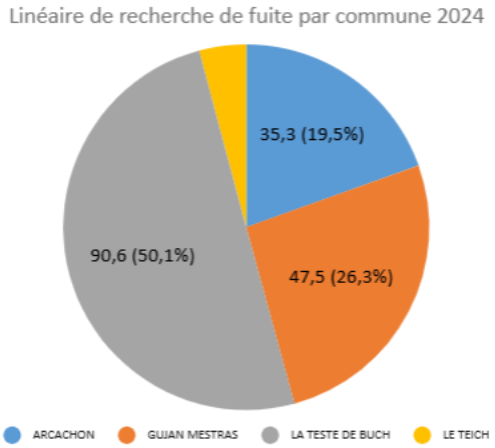

En complément de la recherche de fuite par oreilles acoustique, SEEBAS a missionné une équipe de recherche cynophile:

4 fuites trouvées dont 1 en domaine privatif sur 41 marquages:

- 8 rue des Sorbiers La Teste de Buch
- 6 rue des Prunus La Teste de Buch
- 3 chemin des Pigues La Teste de Buch
- 12 rue des Magnolias La Teste de Buch

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

QUARTIERS	SECTEURS	LINEAIRE PVC INSPECTE
Chapelle Forestière La Teste	*I0260_15 Le Pyla-Gravitaire*	4,40
	I0260_17 Le Pyla-Surpresse Sud	2,60
Coutoum La Teste	*I0260_09 La Teste-Centre*	6,32
Front de Mer Gujan	*I0260_07 Gujan Mestras-Est*	7,31
La Salie	*I0260_14 Piste 214*	2,52
Parking de la Dune du Pyla	*I0260_14 Piste 214*	1,22
Petit Nice Pyla	*I0260_14 Piste 214*	0,77
Reserve Ornithologique	*I0260_13 Le Teich-Nord*	2,17
TOTAL		**27,30**

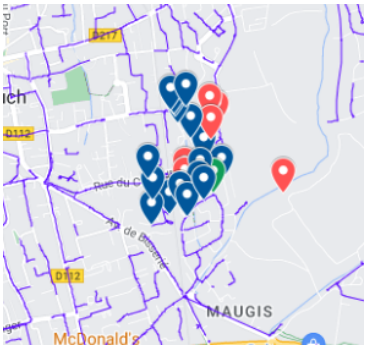

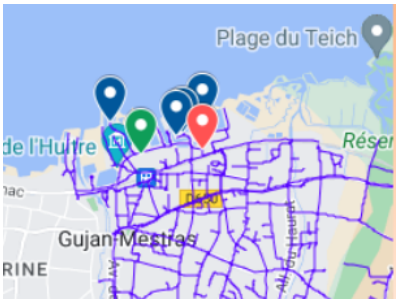

INTERVENTIONS D'URGENCE:

1798 interventions d'urgence ont été effectuées en 2024:

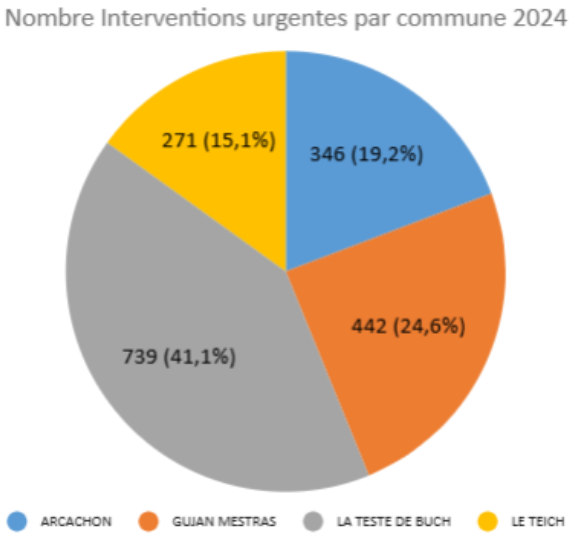

RÉPARATION DE FUITES

Nombre de fuites canalisations:

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Commune	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Arcachon	6	5	5	4	6	4	6	**5**
La Teste	20	19	11	8	19	14	21	**11**
Gujan Mestras	17	13	6	16	17	9	29	**17**
Le Teich	2	11	2	3	3	0	3	**1**
TOTAL	**45**	**48**	**24**	**31**	**45**	**27**	**59**	**34**

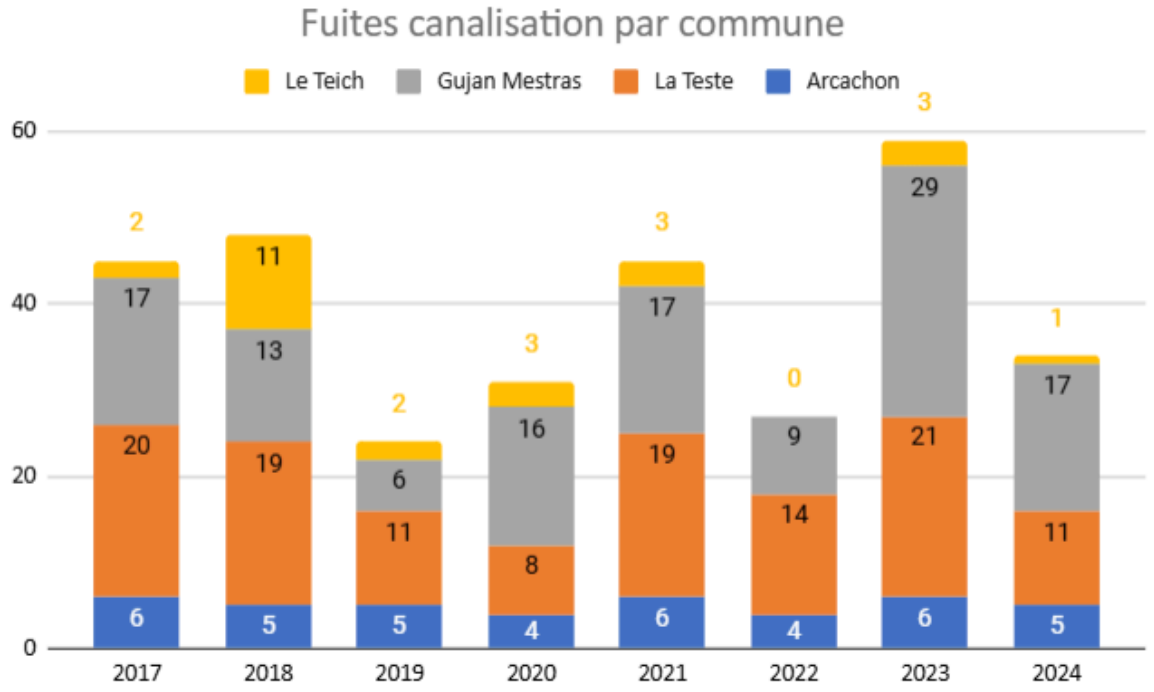

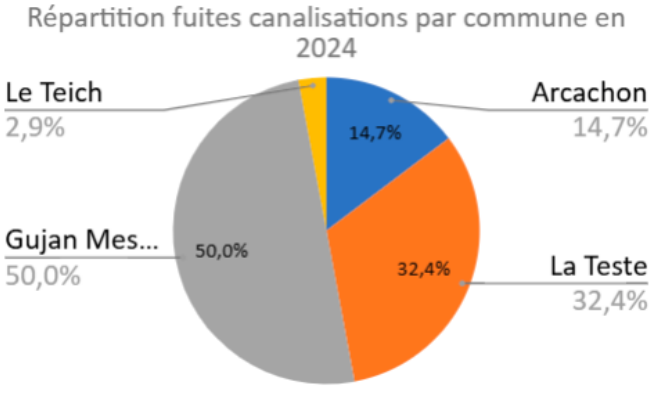

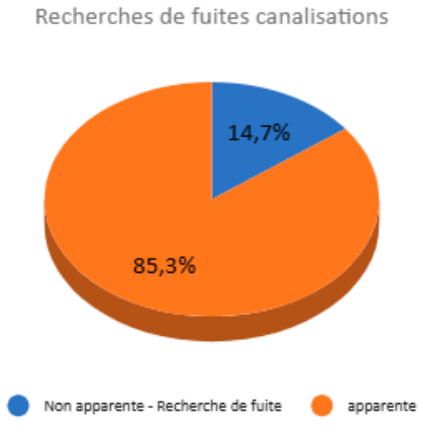

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

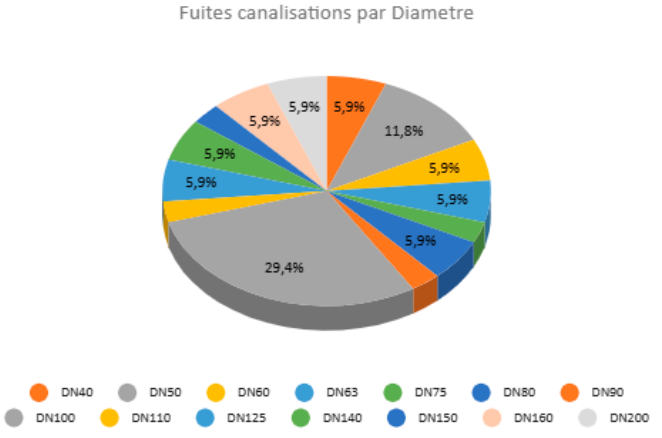

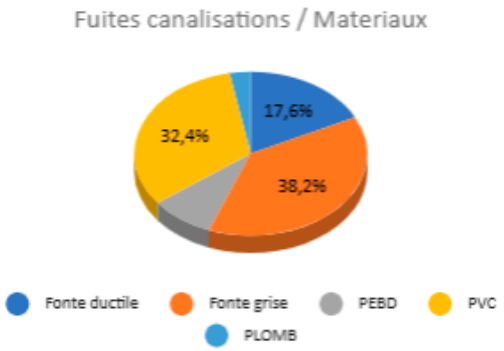

Les fuites canalisations sont majoritairement sur la commune de Gujan Mestras, avec un matériau fonte grise et de diamètre 100

<u>Nombre de fuites branchements:</u>

Commune	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Arcachon	37	63	66	31	56	48	51	**73**
La Teste	81	88	99	38	80	70	77	**97**
Gujan Mestras	123	116	54	102	84	96	95	**91**
Le Teich	43	40	37	29	36	48	37	**40**
TOTAL	**284**	**307**	**256**	**200**	**256**	**262**	**260**	**301**

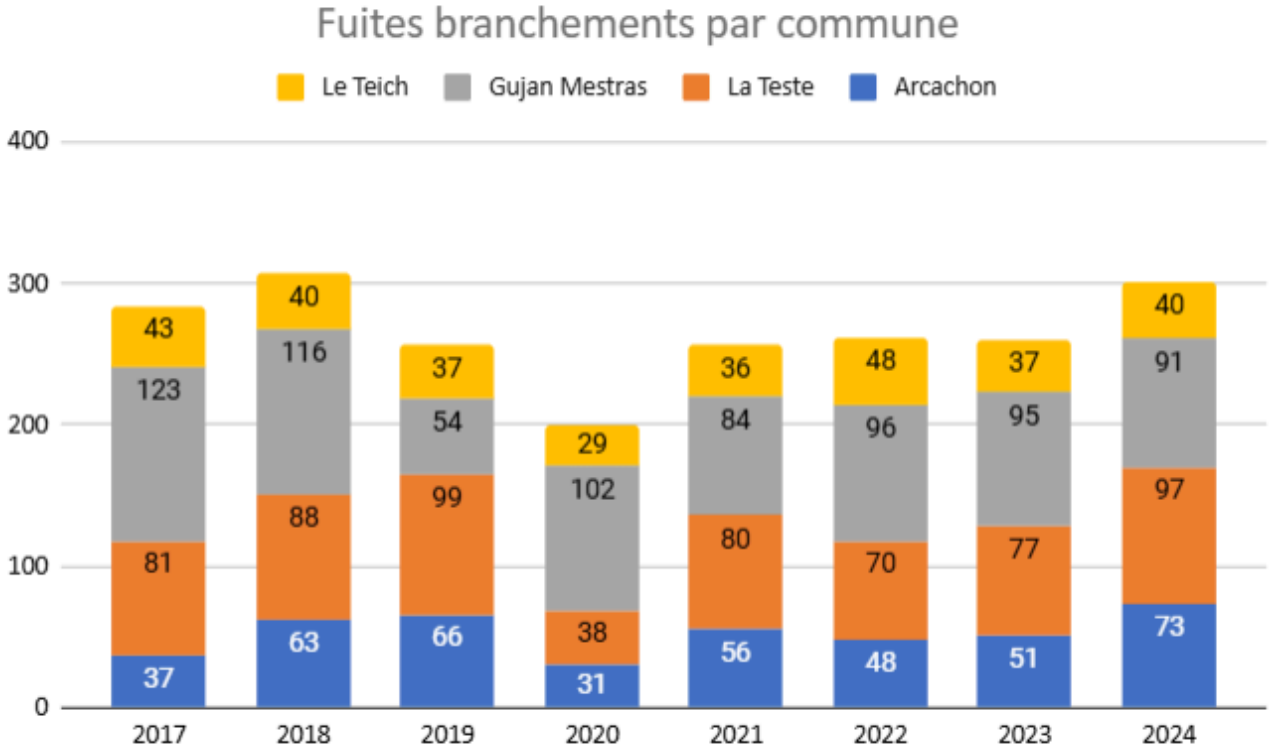

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

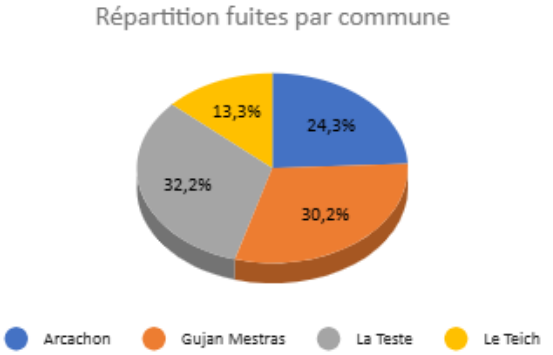

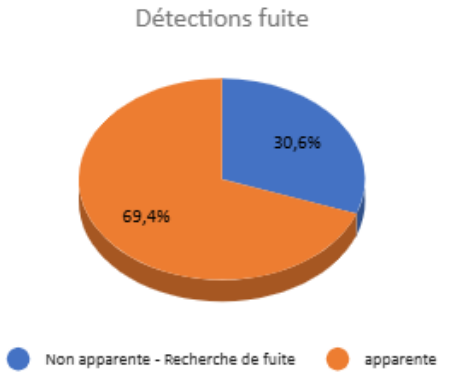

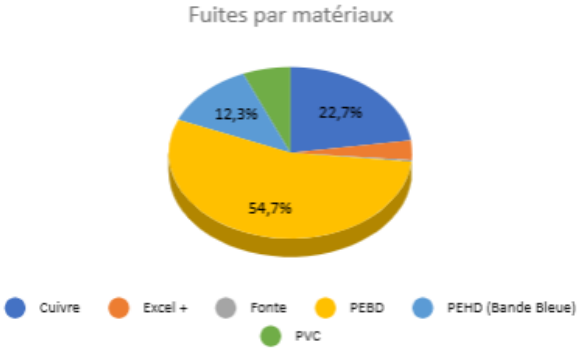

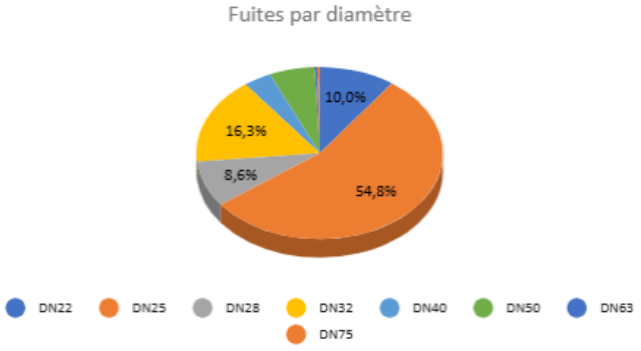

Les fuites branchements sont majoritairement sur les communes de Gujan Mestras et la Teste de Buch, avec un matériau PEBD et de diamètre 25.

A noter, une recrudescence des fuites sur branchements cuivre et PVC est observée nécessitant d'intégrer ce matériau dans le programme de renouvellement 2025 2026 et 2027.

<u>Nombre de fuites équipements du réseau:</u>

fuite ayant été détectée sur d'autres éléments du réseau : vannes, robinets de prise, ventouses…

Commune	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Arcachon	3	10	5	1	6	1	4	9
La Teste	14	10	12	6	6	3	8	19
Gujan Mestras	18	17	15	8	11	5	13	3
Le Teich	8	9	2	9	4	4	11	3
TOTAL	**43**	**46**	**34**	**24**	**27**	**13**	**36**	**34**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

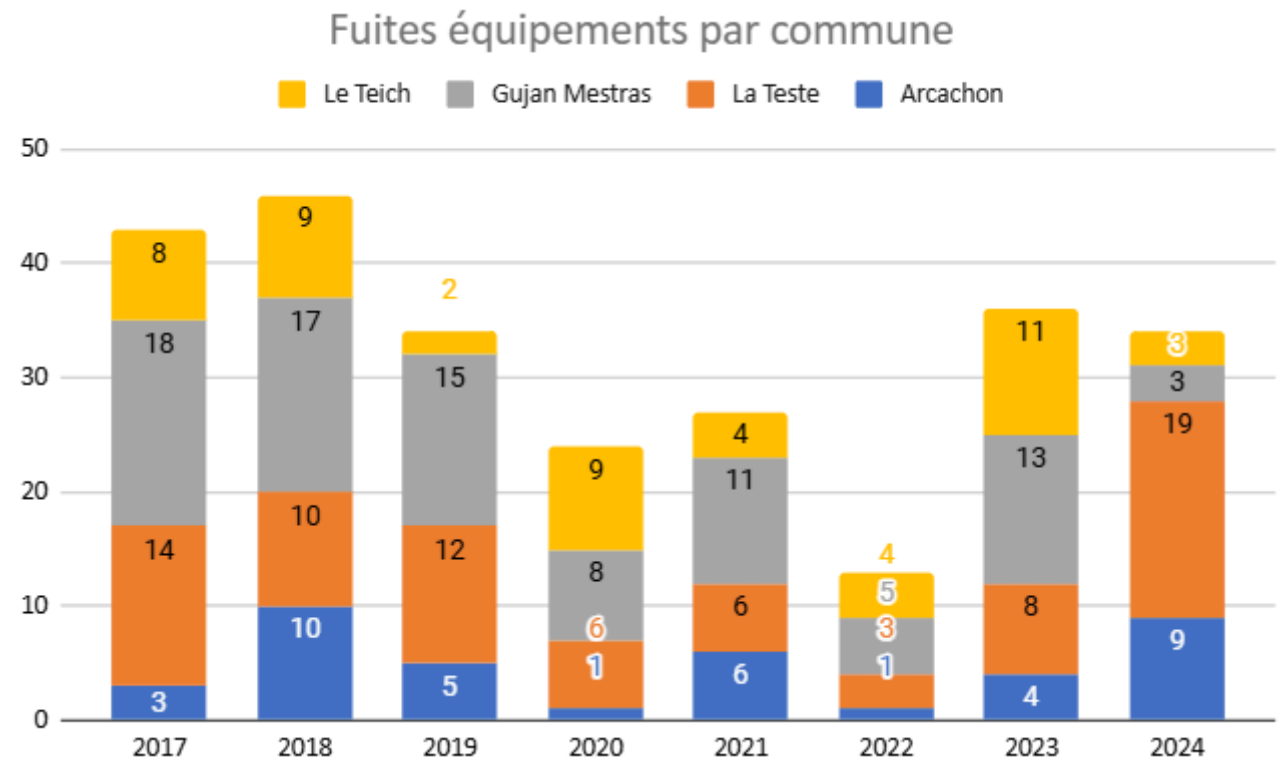

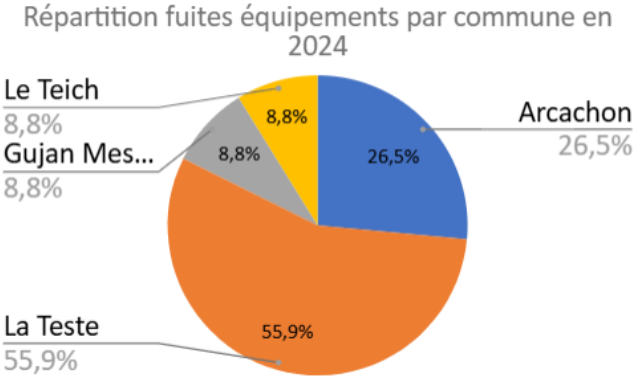

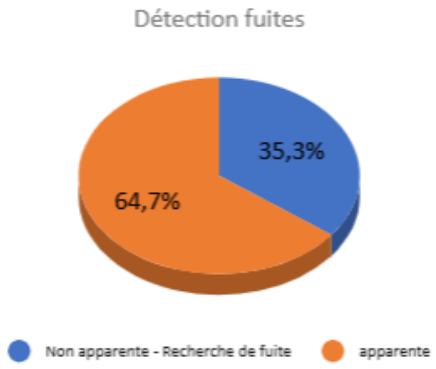

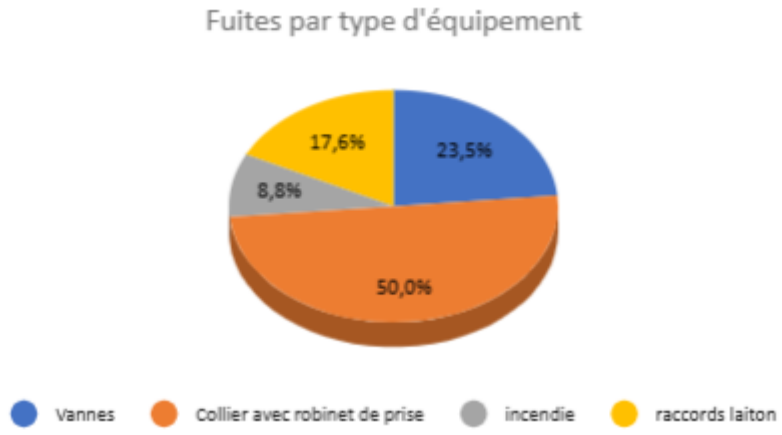

OPÉRATION DE MAINTENANCE SUR LES MODULES DE TÉLÉRELEVÉ

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

En 2024, nous avons effectué 5461 maintenances de tête sur le parc compteur de la COBAS

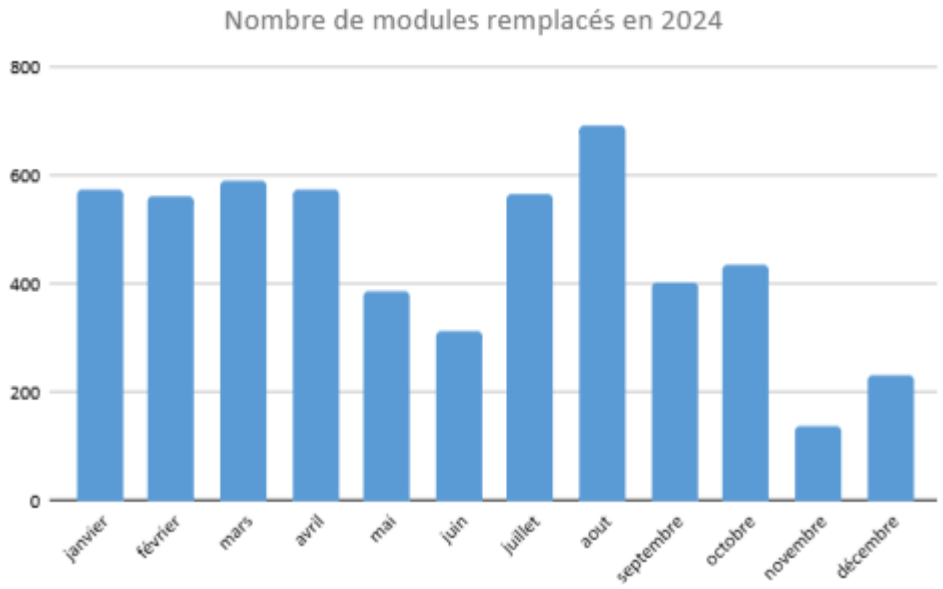

5.10. Les consommateurs de votre service

Données économiques

	2020	2021	2022	2023	2024
Taux d'impayés	**1,35 %**	**1,37 %**	**1,21 %**	**0,95 %**	**0,98 %**
Montant des impayés au 31/12/N en € TTC (sur factures N-1)	324 785	315 426	148 654	117 584	121 083
Montant facturé N - 1 en € TTC	24 056 962	23 007 630	12 331 342	12 369 593	12 336 087

	2020	2021	2022	2023	2024
Nombre de demandes d'abandon de créance à caractère social	26	15	13	11	4
Montant des abandons de créances ou des versements à un fonds de solidarité (€)	792,00	582,00	2 529,00	822,00	1 072,00
Volume vendu selon le décret (m3)	5 678 068	5 745 269	5 941 077	5 492 710	5 268 740

	2020	2021	2022	2023	2024
Nombre d'échéanciers de paiements ouverts au cours de l'année	275	337	341	226	193

Données consommateurs par commune

	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

ARCACHON						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	11 528	11 825	11 898	11 391	11 579	1,7%
Nombre d'abonnés (clients)	10 679	10 785	10 825	11 043	11 253	1,9%
Volume vendu (m3)	1 331 231	1 457 379	1 483 649	1 371 359	1 286 603	-6,2%
GUJAN MESTRAS						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	21 602	21 991	22 334	22 485	22 854	1,6%
Nombre d'abonnés (clients)	12 703	13 058	13 349	13 442	13 535	0,7%
Volume vendu (m3)	1 468 023	1 346 336	1 488 177	1 376 493	1 316 424	-4,4%
LA TESTE DE BUCH						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	26 438	26 626	26 546	26 648	26 923	1,0%
Nombre d'abonnés (clients)	17 870	18 121	18 389	18 466	18 527	0,3%
Volume vendu (m3)	2 425 553	2 488 228	2 486 143	2 297 700	2 194 230	-4,5%
LE TEICH						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	8 059	8 378	8 679	8 980	9 197	2,4%
Nombre d'abonnés (clients)	4 121	4 240	4 317	4 407	4 463	1,3%
Volume vendu (m3)	453 261	453 326	483 108	447 158	471 483	5,4%
Autre(s)						
Volume vendu (m3)	0	0	0	0	0	0%

LES INTERRUPTIONS NON-PROGRAMMÉES DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU

	2020	2021	2022	2023	2024
Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (pour 1 000 abonnés)	**0,68**	**0,97**	**0.85**	**1,08**	**0.71**
Nombre d'interruptions de service	31	45	27	59	34
Nombre d'abonnés (clients)	45 374	46 205	46 881	47 359	47 779

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

6. ANNEXES

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

6.1. DÉTAIL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES

Chaque année, une sélection annuelle des principaux textes parus vous est proposée. Veolia se tient à disposition pour vous aider dans la mise en œuvre de ces textes et évaluer leurs conséquences pour votre service.

Commande Publique

Données essentielles à publier

Deux arrêtés publiés le 22 mars ont modifié ceux du 22 décembre 2022 relatifs respectivement aux données essentielles des marchés publics et aux données essentielles des contrats de concession. Ils ont pour objet d'étendre le régime de déclaration des données essentielles aux actes d'exécution, pris après le 1er janvier 2024, relatifs aux marchés publics notifiés et aux contrats de concession conclus avant cette date.

Dans leur version antérieure, les arrêtés du 22 décembre 2022 ne soumettaient pas au nouveau régime des données essentielles les actes d'exécutions relatifs aux contrats de la commande publique notifiés ou conclus après le 1er janvier 2024. Dès lors, ces actes d'exécution restaient soumis au régime fixé par le précédent arrêté du 22 mars 2019 relatif aux données essentielles dans la commande publique, posant par là même des difficultés pratiques et techniques.

Afin de remédier à ces difficultés, les arrêtés du 18 mars 2024 précisent que les données essentielles relatives aux actes spéciaux de sous-traitance, aux actes de sous-traitance modificatifs et aux modifications (pour les marchés publics), et aux modifications et aux données d'exécution (pour les contrats de concession) des contrats de la commande publique notifiés ou conclus avant le 1er janvier 2024 doivent être transmises et publiées dans les conditions fixées par les arrêtés du 22 décembre 2022 susmentionnés. Ces modifications entreront en vigueur le 1er mai.

- Arrêté du 18 mars 2024 ECOM2404396A modifiant l'arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles des marchés publics
- Arrêté du 18 mars 2024 ECOM2404387A modifiant l'arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles des contrats de concession

Seuil de dispense de publicité et mise en concurrence préalables pour les marchés de travaux dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT.

Cette exception pour les marchés de travaux de moins de 100 000 €, instaurée par un décret en date du 28 décembre 2022, devait prendre fin au 31 décembre 2024. Le décret n°2024-1217 du 28 décembre 2024 proroge cette exception jusqu'au 31 décembre 2025.

Ces dispositions sont également applicables aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 100 000 € HT, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Toutefois, les acheteurs bénéficiant de cette exception ont toujours l'obligation de veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin.

Simplification du droit de la commande publique

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Le décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024, publié au Journal officiel du 31 décembre 2024, apporte des modifications au code de la commande publique afin notamment de simplifier l'accès des entreprises à la commande publique et d'assouplir les règles d'exécution financière des marchés publics, notamment :

- Les conditions de constitution et de modification de la composition de groupement dans le cadre de procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue sont précisées (2142-3 du CCP) et rendues possibles sous réserve de :
  - de disposer des garanties économiques, financières, techniques et professionnelles exigées par l'acheteur pour participer à la procédure ;
  - de ne pas porter atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats ni à une concurrence effective entre ceux-ci.
- Il relève de 10 % à 20 % (3114-5 du CCP) la part minimale que le titulaire s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans dans le cadre des marchés globaux, des marchés de partenariat et des contrats de concession. Il abaisse de 5 % à 3 % le montant maximum de la retenue de garantie pour les marchés publics conclus par certains acheteurs avec une petite ou moyenne entreprise (2191-33 du CCP). Enfin, il intègre les mesures réglementaires d'application de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte s'agissant de la possibilité pour une entité adjudicatrice de rejeter une offre contenant des produits provenant de certains pays tiers à l'Union européenne).

Services publics locaux

Modifications de principales instructions budgétaires et comptables applicables aux collectivités locales au 1er janvier 2025

Les instructions budgétaires et comptables M4 et M57 ont été modifiées à compter du 1er janvier 2025 en particulier pour tenir compte de la réforme des redevances des Agences de l'eau par un arrêté du 20 décembre 2024 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux services publics industriels et commerciaux et arrêté du 20 décembre 2024 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 57 applicable aux collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs. Les modifications portent en particulier sur la création de nouveaux comptes de redevances eau et assainissement

Etablissement des budgets verts locaux

Conformément à l'article 191 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, les collectivités doivent présenter un état annexé au compte administratif ou au compte financier unique intitulé "Impact du budget pour la transition écologique" pour les budgets principaux et les budgets annexes soumis aux instructions budgétaire et comptables M57 et M4 pour les collectivités et leurs groupements de plus de 3 500 habitants. Le décret du 16 juillet 2024 pris en application de l'article 191 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation.

Ainsi, à partir de l'exercice 2024 la contribution aux objectifs de transition écologique doit être présentée pour certaines dépenses comme par exemple les réseaux de voirie, installations de voirie. Dès l'exercice 2025, la contribution aux objectifs de transition écologique doit être présentée pour toutes les dépenses réelles d'investissement (sauf annuités d'emprunt à l'exception de celles liées à la part investissements des marchés de partenariat).

Les objectifs de transition écologique correspondent aux 6 axes suivants : atténuation du changement climatique ; adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ; gestion des ressources en eau ; transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ; préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

Service public de l'eau potable

Réforme des redevances des agences de l'eau

Cette réforme structurante a été adoptée dans la loi de finances de l'année 2024. Elle est effective à compter de l'année 2025 pour l'entrée en vigueur des douzièmes programmes des agences de l'eau (2025 - 2030). Plusieurs textes d'application ont été publiés en 2024 pour préciser ses modalités et son calendrier d'application.

Cette réforme supprime certaines redevances existantes : pollution non-domestique et modernisation des réseaux de collecte (usage domestique et non-domestique). De même, cette réforme acte la fin de la prime pour performance épuratoire et le doublement possible de la redevance de prélèvement sur la ressource en eau pour cause de maîtrise insuffisante des pertes en eau sur le réseau d'eau (doublement dit 'Grenelle', encadré par un décret de janvier 2012).

Dans le même temps, ces différentes suppressions s'accompagnent de nouvelles redevances :

- une redevance pour consommation d'eau potable dont devront s'acquitter les abonnés au service ;
- deux redevances auxquelles seront assujetties directement les autorités organisatrices des services publics d'eau et d'assainissement portant sur la performance des services.

Ces deux dernières redevances seront modulées au regard d'un certain nombre de critères de performance des services, à savoir :

- pour les services d'eau : le niveau des pertes en eau et la gestion du patrimoine ;
- pour les services d'assainissement : la conformité en équipement et en performance ainsi que l'effectivité de l'autosurveillance du système d'assainissement (réseau de collecte et stations d'épuration) et l'efficacité du système d'assainissement.

Les services, en tant qu'autorité organisatrice peuvent dès l'année 2025, et après délibération en 2024, reporter la contrepartie de ces deux redevances, assises sur la performance, sur une ligne spécifique de la facture des abonnés au service à travers un mécanisme de contre-valeur. Pour l'année 2025, cette contre-valeur correspond au taux fixé par l'agence de l'eau multiplié par le coefficient de modulation par défaut de l'année 2025 (0,2 pour l'eau, 0,3 pour l'assainissement).

Les modulations sur performance indiquées plus haut deviendront pleinement effectives en 2026, sur la base des performances constatées au terme de l'année 2024.

Le décret 2024-787 du 9 juillet 2024 (JO du 10 juillet 2024), lui-même modifié par le décret 2025-66 du 24 janvier 2025 (JO du 25 janvier 2025), portant modifications des dispositions relatives aux redevances des agences de l'eau précise les dispositions essentielles de la réforme. Ce décret est complété par cinq arrêtés, à savoir :

- L'arrêté du 5 juillet 2024 (JO du 10 juillet 2024) modifiant l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d'eau et aux modalités de calcul de l'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau ;
- L'arrêté du 5 juillet 2024 (JO du 9 juillet 2024), lui-même modifié par l'arrêté du 20 décembre 2024 (JO du 26 décembre 2024), relatif aux modalités d'établissement de la redevance sur la consommation d'eau potable et des redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif ;

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

- L'arrêté du 5 juillet (JO du 7 juillet 2024) relatif au montant forfaitaire maximal de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif pris en compte pour l'application de la redevance d'eau potable et d'assainissement prévue à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales ;
- L'arrêté du 2 octobre 2024 (JO du 30 octobre 2024) modifiant l'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte et de traitement des eaux usées) ;
- L'arrêté du du 23 décembre 2024 (JO du 26 décembre 2024) est venu modifier et mettre à jour l'arrêté du 13 décembre 2007 relatif aux modalités particulières de versement des redevances pour pollution d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte définies aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 du code de l'environnement pour le rendre compatible avec le nouveau cadre réglementaire encadrant désormais les redevances.

A noter qu'une instruction dédiée aux préfets, en date du 4 décembre 2024, est venue préciser les points essentiels de cette réforme des redevances sur lesquels les services de l'Etat et des collectivités locales se devaient de se mobilier.

Enfin, cette réforme structurante des redevances s'accompagne d'une refonte des indicateurs de performance du Système d'Information des Services Publics d'Eau et d'Assainissement (SISPEA) qui était supposée aboutir durant l'année 2024.

Transposition de la directive européenne 2020/2184 et qualité des eaux destinées à la consommation humaine

La directive 2020/2184 du 16 décembre 2020 actualise celle de 1998. Elle "revalorise l'eau du robinet". Cette directive a été transposée en droit français à la toute fin de l'année 2022 à travers une ordonnance, deux décrets et une quinzaine d'arrêtés.

Ces textes législatifs et réglementaires ont été complétés par une note d'information de la Direction Générale de la Santé (DGS) aux ARS (note d'information N° DGS/EA4/2023/61 du 14 avril 2023, publiée le 28 avril 2023). Cette note d'information réaffirme les points fondamentaux du cadre réglementaire promulgué fin décembre 2022 et pour partie effectif depuis le 1er janvier 2023. Notamment :

- Elle renforce, dès le 1er janvier 2023, les normes de qualité exigées pour l'eau potable sur de nouveaux polluants, avec une obligation de résultats sur sept nouveaux paramètres qui couvrent différentes familles de substances (sous-produits de désinfection, perturbateurs endocriniens, l'uranium) et notamment la somme de 20 substances alkyl perfluorées (famille de substances communément nommées 'PFAS') à laquelle est associée une limite de qualité de 0,1 microgramme/L ;
- Elle confirme que la vérification permanente de la qualité de l'eau relève de la responsabilité du service public d'eau, au travers la mise en œuvre d'un plan de surveillance conforme aux exigences de qualité en vigueur et aux vulnérabilités identifiées. Le contrôle sanitaire officiel opéré par les ARS présente un caractère strictement ponctuel et en aucun cas permanent. Ainsi, sur les sept nouveaux paramètres mentionnés plus haut, le contrôle sanitaire réalisé par les ARS sera opérationnel au plus tard le 1er janvier 2026 ;
- Elle instaure une approche de gestion préventive des risques sanitaires, qui rend obligatoires les plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) élaborés sous la responsabilité de la personne responsable de la production et de la distribution de l'eau (PRPDE). Cette approche passe par une meilleure maîtrise du patrimoine des services d'eau et la compréhension de leur vulnérabilité, avec pour objectif d'améliorer l'efficacité du plan de surveillance mentionné plus haut.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Ce nouvel enjeu de gestion préventive des risques et les dispositions qui s'y rattachent ont été rappelés dans un courrier du Directeur Général de la Santé, daté du 30 janvier 2024 adressé à l'Association des Maires de France, à Intercommunalités de France, à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) et à la Fédération Professionnelle des Entreprises de l'Eau (FP2E). Ce courrier réaffirme les échéances de juillet 2027 puis de janvier 2029 pour que les services d'eau élaborent, mettent en œuvre, évaluent et mettent à jour leur PGSSE, d'abord sur la ressource en eau puis sur la production et la distribution (seconde échéance citée).

Ce rappel survient alors que les sujets des substances alkyl perfluorées (famille de substances communément nommées 'PFAS'), des métabolites de pesticide ou la présence de chlorure de vinyle monomère (instruction de la DGS aux ARS du 29 avril 2020 concernant les mesures correctives que les services doivent mettre en œuvre pour répondre à cet enjeu et, ce, sans attendre l'échéance du PGSSE "système de distribution" de janvier 2029), ont jalonné l'année 2024 : sur le plan législatif, réglementaire, institutionnel et, voire même, médiatique.

- ***PFAS (et autres paramètres nouvellement réglementés)***

Sur le plan réglementaire, l'instruction DGS/EA4/2024/30 du 12 mars 2024 (BO Santé du 29 mars 2024), est venue préciser les modalités de gestion des risques sanitaires liés à la présence de composés perfluorés (PFAS) dans les eaux destinées à la consommation humaine. Cette instruction de la DGS à destination des ARS et des Préfets précise les recommandations de gestion des situations locales de non conformités pour les PFAS dans les EDCH en réaffirmant l'obligation d'une information transparente des populations concernées (conformément à l'article R1321-30 du Code de la Santé Publique). Elle rappelle les incertitudes scientifiques concernant cette famille de substances et dresse l'état d'avancement des expertises sanitaires en cours, dont la campagne exploratoire de l'Anses sur les PFAS dans les eaux brutes et les eaux distribuées. Pour les PFAS, cette campagne exploratoire porte sur 34 composés, incluant les 20 composés dont la somme est soumise à une une limite de qualité depuis le 1er janvier 2023 et des PFAS à chaîne dite "courte", aujourd'hui non réglementés en France, dont l'acide trifluoroacétique (communément nommé TFA).

Sur le plan européen, une communication de la Commission (C/2024/4910) publiée au JOUE du 7 août 2024 est venue préciser les lignes directrices techniques relatives aux méthodes d'analyse pour la surveillance des substances alkylées per- et polyfluorées (PFAS) dans les eaux destinées à la consommation humaine.

- ***Métabolites de pesticides***

L'année 2024 a été marquée par la publication de trois avis de l'Anses :

- Dans deux avis publiés début mai 2024, l'Anses a confirmé le caractère pertinent du métabolite R417888 du chlorothalonil et a classé comme non-pertinent le métabolite R471811 du même chlorothalonil. Le métabolite R471811 se trouve dès lors affecté d'une norme sanitaire, considérée comme une valeur indicative, de 0,9 µg/L (et non plus une limite de qualité de 0,1 µg/L comme c'est encore le cas pour le métabolite R417888). A noter que la précédente campagne exploratoire menée par l'Anses, sous l'égide de la DGS, sur les polluants émergents susceptibles d'être présents dans les ressources en eau et les EDCH et publiée en avril 2023 avait montré la détection très fréquente du métabolite Chlorothalonil R471811 dans les eaux brutes et distribuées.
- Dans un avis publié début août 2024, l'Anses fixe les valeurs sanitaires maximales de la desphényl-chloridazone et de la méthyldesphényl-chloridazone, deux métabolites de la chloridazone confirmés comme pertinents dans deux avis de 2023 de l'Anses. Ces valeurs sanitaires maximales sont respectivement de 11 µg/L et 110 µg/L. S'agissant de deux métabolites pertinents, ils sont tous deux soumis à une limite de qualité de 0,1 µg/L qui fixe la conformité de l'eau à atteindre, le cas échéant, après une période dérogatoire de trois ans, renouvelable une fois.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Fin novembre 2024, la publication d'un rapport mené par trois inspections ministérielles (IGEDD, CGAAER et IGAS) sur la gestion des aires d'alimentation des captages a dressé un constat sévère sur la fréquence de détection des pesticides et de leurs métabolites dans les ressources en eau en proposant différentes dispositions pour la reconquête de leur qualité dont l'harmonisation européenne du classement de la pertinence / non-pertinence des métabolites de pesticide. Cette disposition a été initiée en 2024 par la Commission avec l'appui scientifique de l'OMS dont les travaux sont attendus en 2025.

- ***Matériaux en contact avec l'eau***

Trois décisions et trois règlements européens publiés au Journal Officiel de l'Union Européenne du 23 avril 2024 sont venus compléter la réglementation relative aux matériaux en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine. Ces six textes découlent de la révision de la directive 2020/1184 de décembre 2020 relative aux eaux destinées à la consommation humaine et qui harmonise le cadre européen sur ce sujet.

Ces dispositions s'appliqueront à partir du 31 décembre 2026. En attendant, les dispositions françaises continuent à s'appliquer. Un texte réglementaire viendra préciser les modalités d'application de ces nouvelles dispositions en France.

- ***Microplastiques dans les eaux destinées à la consommation humaine***

Par une décision déléguée du 11 mars 2024, publiée au Journal Officiel de l'Union Européenne du 21 mai 2024, la Commission européenne a défini la méthodologie à suivre pour mesurer les microplastiques dans l'eau destinée à la consommation humaine. Cette décision déléguée répond à une disposition de la directive 2020/2184 relative aux eaux destinées à la consommation humaine publiée en décembre 2020. L'objectif est d'inscrire ensuite ces substances sur la liste de vigilance qui comprend les substances ou composés préoccupants pour les citoyens ou les milieux scientifiques. Pour mémoire, à date, cette liste de vigilance supposée s'étendre comprend le bêta-œstradiol et le nonylphénol.

Repérage de l'amiante avant travaux

L'arrêté du 4 juin 2024 (JO du 30 juin 2024) est venu préciser les modalités de réalisation du repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles autres que bâtis tels que les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers. Cet arrêté qui couvre les enrobés routiers et les réseaux entrera pleinement en application le 1er juillet 2026 afin de permettre au préalable la mise en œuvre des formations des opérateurs en charge de réaliser ces opérations de repérage, selon la norme norme NF X 46-102 de novembre 2020.

Les dispositions de cet arrêté précisent que le donneur d'ordre des travaux est tenu d'adresser au propriétaire de l'ouvrage une copie du rapport de repérage afin que ce dernier puisse mettre à jour le dossier de traçabilité.

Cet arrêté précise également les conditions d'exemption de ce repérage : situation d'urgence ou lorsque les informations provenant des documents de traçabilité sont antérieurement connues.

Travaux à proximité des réseaux

Plusieurs fois refondue au gré des retours d'expérience, la réglementation "anti-endommagement", qui encadre depuis 2012 les travaux effectués à proximité des réseaux à risque aériens et enterrés, connaît une série d'ajustements à compter du 1er janvier 2025. A noter que le décret du 2024-1022 du 13 novembre 2024 (JO du 15 novembre 2024) et l'arrêté du 23 décembre 2024 (JO du 29/12/24) sont venus renforcer la sécurité des interventions sur les réseaux en modifiant certaines dispositions contenues dans plusieurs arrêtés relatifs à l'exécution des travaux à proximité des réseaux, notamment en matière de déclaration, d'entretien et de contrôle des infrastructures.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Par une décision du 30 janvier 2024 (BO du 17 février 2024), le fascicule 2 du guide d'application de la réglementation anti-endommagement intitulé « guide technique des travaux » mentionné à l'article R. 554-29 du code de l'environnement a vu ses annexes complétées de nouvelles fiches techniques.

L'arrêté du 7 mai 2024 (JO du 22 mai 2024) est venu fixer, pour l'année 2024, le barème hors taxes des redevances prévues à l'article L. 554-2-1 du code de l'environnement au titre du financement, par les exploitants des réseaux enterrés, du «Guichet Unique» administré par l'Ineris. Ce téléservice (www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) référencie les réseaux de transport et de distribution en vue de prévenir leur endommagement lors de travaux.

Trois arrêtés en date du 5 juillet 2024 ont été publiés au JO du 7 juillet 2024 :

- un premier arrêté précise les normes définissant les modalités recommandées pour l'exécution des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ou pour l'exécution d'opérations non électriques dans l'environnement d'ouvrages et d'installations électriques sous tension ;
- un second arrêté porte sur les conditions d'équivalence entre l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux prévue par l'article R. 554-31 du code de l'environnement et l'habilitation prévue à l'article R. 4544-33 du code du travail ;
- le troisième arrêté porte spécifiquement sur la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains.

Gestion quantitative et partage de la ressource en eau

Dans la continuité du Plan Eau adopté fin mars 2023, plusieurs instructions et arrêtés sont venus préciser durant l'année 2024 les modalités de gestion quantitative et de partage de la ressource en eau.

- L'instruction du 18 décembre 2023 relative à la mise en œuvre du décret n° 2021-795 du 23 juin 2021 et du décret n° 2022-1078 du 29 juillet 2022 relatifs à la gestion quantitative de la ressource en eau a été publiée le 8 janvier 2024.

Cette instruction précise les modalités de gestion quantitative de la ressource en eau. En particulier, elle encadre l'étude des volumes prélevables à l'étiage, qui constituent la base de toute démarche de retour à l'équilibre hydrique, en rappelant la nécessité de définir une stratégie d'études des volumes prélevables par le préfet coordonnateur de bassin. Elle détaille la nécessaire articulation entre les différents outils de gestion de la ressource en eau (SAGE, PTGE,, etc.) pour atteindre le retour à l'équilibre.

- L'instruction interministérielle du 1er juillet 2024 (BO du 9 juillet 2024) précise les actions du Plan Eau, parmi les 53 mesures de ce plan, qui doivent être mises en œuvre dans les territoires sous l'impulsion des préfets. Aussi l''objet de cette instruction est de détailler, pour certaines mesures, quelles actions sont attendues et à quelle échelle.
- L'arrêté du 3 juillet 2024 (JO du 6 juillet 2024) modifie l'arrêté du 30 juin 2023 concernant les mesures de restriction à mettre en œuvre en période de sécheresse dans les ICPE.
  Dans un souci de simplification, il modifie le site internet sur lequel l'exploitant transmet ses consommations d'eau lors des épisodes de sécheresse. Il précise que les réductions doivent être appliquées sur les prélèvements dans les ressources qui sont concernées par la sécheresse. Il apporte également des modifications concernant la déduction d'un volume de « sécurité » du volume de référence auquel l'exploitant doit appliquer des réductions de sa consommation d'eau en cas de sécheresse.
- Le décret n° 2024-1098 du 2 décembre 2024 (JO du 4 décembre 2024) révise les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (Sage). Créé par la loi sur l'eau de 1992, cet outil de planification essentiel à la gestion locale de l'eau est adapté par ce décret pour répondre aux nouveaux enjeux, notamment du changement climatique et aux épisodes de rareté de la

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

ressource en eau. Ce décret vise à accélérer l'élaboration des SAGE en resserrant, notamment, les liens entre le SAGE et les documents d'urbanisme et les trajectoires des prélèvements sur un territoire.

D'autre part, le Plan Eau présenté fin mars 2023 comporte cinq mesures visant à faciliter le recours aux eaux non-conventionnelles (ENC - incluant les eaux usées traitées, mais également les eaux de pluie, les eaux grises, les eaux d'exhaure, etc.) et à contribuer ainsi aux économies de prélèvement d'eau sur un territoire. Ce plan a pour objectif de développer 1000 projets opérationnels d'ici à 2027.

En 2024, de nouveaux textes réglementaires, complétant ceux publiés en 2023, ont été publiés pour faciliter le recours aux ENC tout en encadrant les risques inhérents à ces pratiques :

- **Le décret 2024-33 du 24 janvier 2024** (JO du 25 janvier 2024) puis **le décret 2024 - 769 du 8 juillet 2024** (JO du 9 juillet 2024) fixent les modalités de recours aux ENC dans les entreprises du secteur alimentaire. Ce dernier décret est accompagné d'un arrêté daté du 8 juillet 2024 (JO du 9 juillet 2024) qui précise les niveaux de garantie sanitaire à atteindre en fonction des usages prévus ;
- **Le décret 2024-796 et l'arrêté du 12 juillet 2024** (JO du 13 juillet 2024) encadrent les conditions sanitaires d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine (EICH) pour des usages domestiques. Ces deux textes ont été complétés et précisés par la note d'information DGS/EA4/2024/147 du 23 octobre 2024 (BO Santé du 31 octobre 2024) à destination des ARS et des préfets.

Protection et surveillance des masses d'eau

Un avis publié au JO du 6 octobre 2024 est venu préciser les modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement, et conformément à l'arrêté du 26 juin 2023. Cet avis liste les méthodes analytiques, et les normes associées, des couples « élément de qualité biologique - méthode » à appliquer ainsi que leur date d'entrée en vigueur.

Transition énergétique & environnementale

Autorisation environnementale

Promulguée en octobre 2023, la loi Industrie verte vise à accélérer la réindustrialisation du pays, dans le respect de l'environnement. Afin de traduire cette ambition, deux décrets ont été pris en application de cette loi pour accélérer la libération de foncier industriel et l'implantation de nouvelles usines, notamment via la réduction des délais d'examen des demandes d'autorisation environnementale. Une instruction ministérielle est venue compléter ultérieurement le dispositif mis en place.

Le décret n° 2024-704 du 5 juillet 2024 permet tout d'abord la mise en œuvre des accélérations de certaines procédures d'urbanisme ou environnementales pour des projets industriels stratégiques. Plus précisément :

- Il définit la liste des secteurs des technologies favorables au développement durable pour lesquels les projets industriels sont rendus explicitement éligibles à la procédure de déclaration de projet prévue par l'article L.300-6 du code de l'urbanisme. Ainsi, parmi ces secteurs, est mentionné celui des technologies de décarbonations du bâtiment, celui des technologies de production, de réseau et de stockage de l'énergie bas-carbone ou encore celui du recyclage des déchets de matériaux.
- Il détaille les informations à fournir pour se voir reconnaître de manière anticipée la raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM), au sens de l'article L.411-2 du code de l'environnement, pour des projets industriels visés par une déclaration d'utilité publique,

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

identifiés par décret comme projet d'intérêt national majeur (PINM) ou faisant l'objet d'une déclaration de projet au sens du code de l'urbanisme.

- Enfin, le décret précise que le préfet sera l'autorité compétente pour autoriser les travaux, installations, constructions et aménagement d'un projet industriel qualifié par décret de projet d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale (article R* 422-2 i) du code de l'urbanisme).

Ensuite, **le décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024** permet, à travers des dispositions clés, de réduire les délais d'implantation industrielle et de favoriser la libération de fonciers industriels. Plus précisément :

- Il accélère l'examen des demandes d'autorisation environnementale. En application du nouvel article L. 181-10-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la Loi Industrie Verte, la phase d'enquête publique est, sauf exception, remplacée par une procédure de consultation du public parallélisée menée sous le contrôle du commissaire enquêteur. Cette consultation est désormais réalisée en parallèle de la phase d'examen de la demande par les services de l'Etat durant une période de 3 mois (portée à 4 mois lorsque l'avis de l'autorité environnementale est requis), là où ces deux étapes étaient précédemment conduites de manière successive sur une durée de 7 à 8 mois. D'autres délais de procédure sont par ailleurs raccourcis. A titre d'exemple, le pétitionnaire ne disposera plus que de 5 jours pour formuler des observations sur les remarques et propositions du public, contre les 15 jours prévus dans le cadre actuel de l'enquête publique.
  Ces dispositions sont entrées en vigueur le 22 octobre 2024 et sont applicables aux demandes déposées à compter de cette date.
- Il améliore la gestion des cessations d'activité ICPE. Tout d'abord, le texte précise les conditions permettant à un exploitant, dont la cessation d'activité a été notifiée avant le 1er juin 2022, de bénéficier de la nouvelle procédure de cessation d'activité introduite par la loi d'accélération et de simplification de l'action publique (« Loi ASAP »). Le décret apporte également des précisions substantielles quant au contenu du mémoire de réhabilitation que l'exploitant est tenu de transmettre au Préfet. A ce titre, le traitement des sources de pollutions et des pollutions concentrées est rendu obligatoire (sauf dérogation encadrée), là où cette pratique relevait jusqu'ici de la simple recommandation issue de la Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués de 2017. Le décret modifie en outre l'ensemble des articles du code de l'environnement relatifs à la procédure de tiers demandeur afin, entre autres, de faciliter sa substitution à l'exploitant pour la mise en sécurité du site (en plus de sa réhabilitation). Le texte prévoit aussi le renforcement des exigences de garanties financières à constituer pour le tiers demandeur et ouvre la possibilité aux collectivités d'être leur propre assureur lorsqu'elles interviennent en tant que tiers demandeur.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 7 juillet 2024.

ICPE

Face à l'importance de la sinistralité dans les installations de gestion des déchets, le ministère de la Transition écologique a renforcé les prescriptions en matière de prévention des incendies en prenant une succession d'arrêtés fin 2023 (pour les installations soumises au régime de l'enregistrement et les installations soumises à autorisation) et début 2024 (pour les installations soumises à déclaration).

Ainsi, l'arrêté du 8 janvier 2024 (TREP2330764A), qui modifie les prescriptions applicables aux installations de gestion de déchets soumises à déclaration, s'inscrit dans cette volonté de réforme.

En premier lieu, le nouveau texte modifie :

- l'arrêté du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à déclaration sous la rubrique

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

n° 2710-1 (installations de collecte de déchets dangereux apportés par leur producteur initial) ;

- l'arrêté du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial).

Au sein de ces arrêtés, il introduit des exigences, applicables à compter du 1er janvier 2025, en ce qui concerne le stockage des déchets d'équipements électriques et électroniques. A ce titre, il prévoit que ces déchets susceptibles de contenir des batteries au lithium doivent être séparés des autres déchets d'équipements électriques et électroniques lors de leur réception dans l'installation. Ils sont entreposés dans des conditions garantissant l'absence d'endommagement par des opérations de manutention.

En second lieu, il modifie :

- l'arrêté du 23 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique 2791 (installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782) ;
- l'arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n°s 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées ;
- l'arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2718.

Les modifications consistent à introduire de nouvelles exigences qui seront mises en place progressivement (certains entreront en vigueur en juillet 2024, d'autres en janvier 2025, et les dernières en janvier 2026). Parmi les exigences à mettre en œuvre le plus tôt possible, on notera l'obligation pour l'exploitant de réaliser et tenir à jour un plan de défense contre l'incendie dont le texte fixe le contenu minimum. De même, il doit organiser un exercice de défense contre l'incendie, lequel doit être renouvelé au moins tous les trois ans.

Notons qu'un arrêté du 4 juin 2024 (TREP2412145A) a ultérieurement corrigé certaines incohérences et erreurs rédactionnelles introduites par les textes de fin 2023 et début 2024.
Enfin, l'instruction ministérielle du 3 décembre 2024 (TCEP2421014) a défini les actions nationales 2025 de l'inspection des installations classées, qui sont au nombre de cinq : libération du foncier industriel, maîtrise des risques accidentels, installations de combustion, lutte contre le trafic de déchets et plan d'action interministériel « PFAS ».

Encadrement des émissions chimiques

Dans une communication publiée au journal officiel de l'Union Européenne le 26 avril 2024, la Commission européenne est venue préciser les critères et les principes directeurs de la notion "d'utilisations essentielles" d'une substance chimique. Ces critères permettent d'évaluer s'il est justifié, d'un point de vue sociétal, d'utiliser les substances les plus nocives. Dans les cas où l'utilisation est nécessaire pour la santé et/ou la sécurité et/ou si elle est essentielle au fonctionnement de la société, et s'il n'existe pas de solutions de remplacement acceptables, une substance chimique peut continuer à être utilisée à cette fin pendant un certain temps, précise ainsi l'exécutif européen.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

6.2. ASSURANCES

Dans le cadre de ses obligations contractuelles, Veolia a souscrit aux polices d'assurance suivantes :

- **Assurance de responsabilité civile** : cette assurance couvre Veolia des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, quel qu'en soit le fondement juridique, que Veolia est susceptible d'encourir vis-à-vis des tiers à raison des dommages corporels, matériels et immatériels qui trouvent leur origine dans l'exécution de ses obligations.
- **Assurance de dommages aux biens :** cette assurance est souscrite par Veolia pour son propre compte. Elle a pour objet de garantir les biens affermés contre les dommages résultant de l'exploitation du service.

Pour des **raisons de confidentialité**, les attestations d'assurance ne peuvent pas être intégrées directement dans le rapport annuel du délégataire qui est un document public.

L'ensemble de ces attestations d'assurance vous est communiqué chaque année par courrier postal ou électronique ou sur simple demande.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

6.3. SYNOPTIQUE

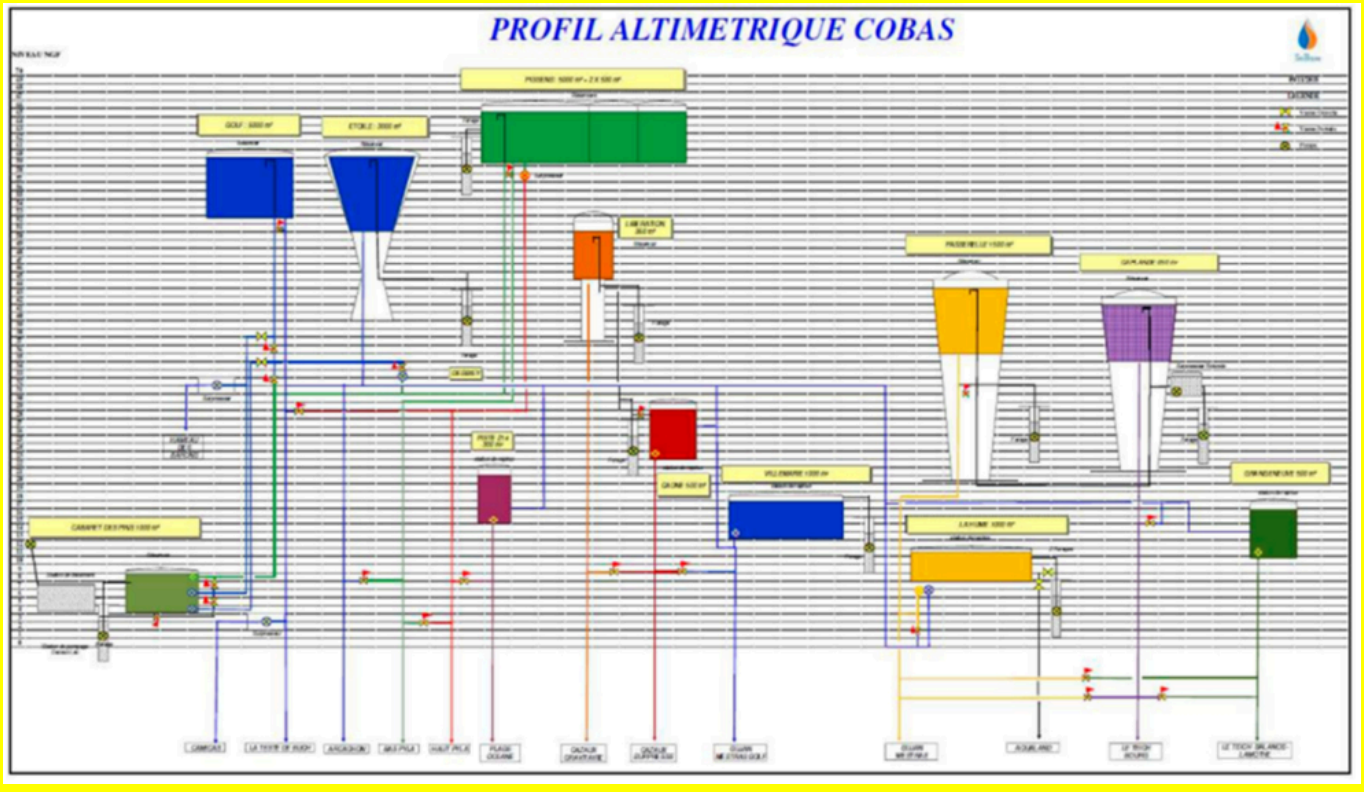

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

6.4. CERTIFICATS ISO

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Certificat
Certificate

N° 2015/69287.11

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

pour les activités suivantes :
for the following activities:

**PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU POTABLE & D'EAU DE PROCESS.
COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES. ACCUEIL ET SERVICE AUX CONSOMMATEURS.**

***DRINKING WATER & PROCESS WATER PRODUCTION AND DISTRIBUTION.
WASTEWATER COLLECTION AND TREATMENT. CUSTOMER SERVICE.***

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 9001 : 2015

et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations:

21 RUE LA BOETIE FR-75008 PARIS

Liste des sites certifiés en annexe(s) */ List of certified locations on appendix(ces)*

Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour)
This certificate is valid from (year/month/day) **2024-11-10**

Jusqu'au
Until **2027-11-09**

Ce document est signé électroniquement. Il constitue un original électronique à valeur probatoire.
This document is electronically signed. It stands for an electronic original with probationary value.

Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

Flashez ce QR Code pour vérifier la validité du certificat

Seul le certificat électronique, consultable sur www.afnor.org, fait foi en temps réel de la certification de l'organisme. *The electronic certificate only, available at www.afnor.org, attests in real-time that the company is certified.* Accréditation COFRAC n° 4-0001, Certification de Systèmes de Management, Portée disponible sur www.cofrac.fr
COFRAC accreditation n° 4-0001, Management Systems Certification, Scope available on www.cofrac.fr
AFAQ est une marque déposée. *AFAQ is a registered trademark* - CERTI F 0998.9.107-2020

11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France - T. +33 (0)1 41 62 80 00 - F. +33 (0)1 49 17 90 00
SAS au capital de 18 187 000 € - 479 076 002 RCS Bobigny - www.afnor.org

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Certificat
Certificate

Annexe / Appendix n° 4

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

Liste complémentaire des sites entrant dans le périmètre de la certification :
Complementary list of locations within the certification scope:

SOCIETE D'EXPLOITATION D'EAU DU BASSIN D'ARCACHON SUD (SEEBAS)
18 RUE JEHENNE FR 33120 ARCACHON

Système de management évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
Management system assessed and found to meet the requirements of:

ISO 9001 : 2015

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Certificat
Certificate

N° 2015/69286.11

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

pour les activités suivantes :
for the following activities:

**PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU POTABLE & D'EAU DE PROCESS.
COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES. ACCUEIL ET SERVICE AUX CONSOMMATEURS.**

***DRINKING WATER & PROCESS WATER PRODUCTION AND DISTRIBUTION.
WASTEWATER COLLECTION AND TREATMENT. CUSTOMER SERVICE.***

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 14001 : 2015

et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations:

21 RUE LA BOETIE FR-75008 PARIS

Liste des sites certifiés en annexe(s) */ List of certified locations on appendix(ces)*

Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour)
This certificate is valid from (year/month/day) **2024-11-10**

Jusqu'au
Until **2027-11-09**

Ce document est signé électroniquement. Il constitue un original électronique à valeur probatoire.
This document is electronically signed. It stands for an electronic original with probationary value.

Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

Flashez ce QR Code pour vérifier la validité du certificat

Seul le certificat électronique, consultable sur www.afnor.org, fait foi en temps réel de la certification de l'organisme. *The electronic certificate only, available at www.afnor.org, attests in real-time that the company is certified.* Accréditation COFRAC n° 4-0001, Certification de Systèmes de Management. Portée disponible sur www.cofrac.fr. *COFRAC accreditation n° 4-0001, Management Systems Certification. Scope available on www.cofrac.fr.*
AFAQ est une marque déposée. *AFAQ is a registered trademark* - CERTIF 0998.9.107.2020

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Certificat
Certificate

Annexe / *Appendix* n° 4

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

Liste complémentaire des sites entrant dans le périmètre de la certification :
Complementary list of locations within the certification scope:

SOCIETE D'EXPLOITATION D'EAU DU BASSIN D'ARCACHON SUD (SEEBAS)
18 RUE JEHENNE FR 33120 ARCACHON

Système de management évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
Management system assessed and found to meet the requirements of:

ISO 14001 : 2015

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Certificat
Certificate

N° 2015/69288.12

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

pour les activités suivantes :
for the following activities:

**PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU POTABLE ET D'EAU DE PROCESS.
COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES. ACCUEIL ET SERVICE AUX CONSOMMATEURS.**

***DRINKING WATER AND PROCESS WATER PRODUCTION AND DISTRIBUTION.
WASTEWATER COLLECTION AND TREATMENT. CUSTOMER SERVICE.***

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 50001 : 2018

et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations:

Adresse	N° SIREN
21 RUE LA BOETIE FR-75008 PARIS	572025526

Liste complémentaire des sites certifiés en annexe / *Complementary list of certified locations on appendix*

(L'ensemble des activités de l'entreprise sur le(s) site(s) donné(s) est couvert par la certification)
(The scope of certification covers all activities carried out on the above-mentioned location(s))

Ce certificat est valable à compter du (année-mois-jour)
This certificate is valid from (year/month/day) **2024-11-11** - jusqu'au / until **2027-11-10**

Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

Flasher ce QR Code pour vérifier la validité du certificat

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Certificat
Certificate

Annexe / Appendix n° 4

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

Liste complémentaire des sites entrant dans le périmètre de la certification :
Complementary list of locations within the certification scope:

Adresse	N° SIREN
SOCIETE D'EXPLOITATION D'EAU DU BASSIN D'ARCACHON SUD (SEEBAS) 18 RUE JEHENNE FR-33120 ARCACHON	817489370

Système de management évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
Management system assessed and found to meet the requirements of:

ISO 50001 : 2018

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

6.5. INVENTAIRE DU PATRIMOINE

Vous trouverez ci-joint une extraction du patrimoine simplifiée sur le territoire de la COBAS. Une extraction détaillée avec la vétusté, la valeur de remplacement, et les caractéristiques techniques de chaque équipement est à votre disposition sur simple demande.

Equipements Usines et Réseau (hors vannes et canalisations)					
Libellé Installation	**Libellé Unité**	**Libellé Emplacement**	**Date Mise en Service**	**Fabricant Equipement**	**Modèle Equipement**
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC					
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	PERIMETRE DE PROTECTION	Bouée lestées	11/08/2017		
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	AMENAGEMENT EXTERIEURS	CLOTURE	25/07/2019		
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	AMENAGEMENT EXTERIEURS	PORTAIL	25/07/2019		
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	BATIMENTS EXPLOITATION	Appareil d'Eclairage Intérieur	31/12/2015		
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	BATIMENTS EXPLOITATION	Alarme Anti-Intrusion	14/06/2017	ALTEC	Altec
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	BATIMENTS EXPLOITATION	Bassin Eau Brute	01/12/2006		
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	BATIMENTS EXPLOITATION	Lecteur de Badge	01/12/2006	Sofrel	
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	BATIMENTS EXPLOITATION	Appareil d'Eclairage Extérieur	01/12/2006		
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	BATIMENTS EXPLOITATION	Palan	01/12/2006		
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	BATIMENTS EXPLOITATION	PORTE METALLIQUES	01/12/2006		
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	BATIMENTS EXPLOITATION	Monorail	01/12/2006		
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	SECURITE	Extincteur	01/12/2006	Desautel	
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	CONTROLE / COMMANDE	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	01/12/2006		
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	CONTROLE / COMMANDE	AUTOMATE	01/12/2006	TELEMECANIQUE	TSX 57
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	CONTROLE / COMMANDE	Inverseur de Source automatique	07/03/2022	SOCOMEC	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	CONTROLE / COMMANDE	TELEGESTION	31/12/2015	SOFREL	S550
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	CONTROLE / COMMANDE	VARIATEUR P1	01/03/2019	TELEMECANIQUE	ATV61
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	CONTROLE / COMMANDE	VARIATEUR P3	01/12/2006	TELEMECANIQUE	ATV61
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	CONTROLE / COMMANDE	VARIATEUR P2	31/12/2022	SCHNEIDER	ATV630D30N4
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	CONTROLE / COMMANDE	VARIATEUR P5	01/12/2006	TELEMECANIQUE	ATV61
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	CONTROLE / COMMANDE	VARIATEUR P4	01/06/2024	TELEMECANIQUE	ATV61
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	CONTROLE / COMMANDE	DISJONCTEUR GENERAL	01/12/2006	SCHNEIDER	
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	TRANSFERT	DEBITMETRE P1	22/09/2016	ENDRESS HAUSER	Promag10W2F-HD0A1AN2A4AA
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	TRANSFERT	DEBITMETRE P2	22/09/2016	ENDRESS HAUSER	Promag 10W2F-HD0A1AN2A4AA
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	TRANSFERT	DEBITMETRE P3	19/09/2017	ENDRESS HAUSER	Promag 10W
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	TRANSFERT	DEBITMETRE P4	29/09/2017	ENDRESS HAUSER	Promag 10W
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	TRANSFERT	DEBITMETRE P5	20/09/2017	ENDRESS HAUSER	Promag 10W
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	TRANSFERT	SONDE DE NIVEAU BACHE	31/12/2017	ENDRESS HAUSER	
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	TRANSFERT	CLAPETS P1	13/09/2017	SAPAG	CLASAR20111
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	TRANSFERT	CLAPETS P2	01/12/2010	SAPAG	CLASAR 20111
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	TRANSFERT	CLAPETS P3	31/12/2022	SAPAG	CLASAR 20111
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	TRANSFERT	CLAPETS P4	01/12/2010	SAPAG	CLASAR 20111
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	TRANSFERT	CLAPETS P5	31/12/2022	SAPAG	CLASAR 20111
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	TRANSFERT	CLAPETS POMPE AMORCAGE	01/12/2006	BAYARD	B610
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	TRANSFERT	CONDUITE DE REFOULEMENT P1	01/12/2006		
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	TRANSFERT	CONDUITE DE REFOULEMENT P3	01/12/2006		
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	TRANSFERT	CONDUITE DE REFOULEMENT P4	01/12/2006		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	TRANSFERT	CONDUITE DE REFOULEMENT P5	01/12/2006		
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	TRANSFERT	CONDUITE DE REFOULEMENT AMORCAGE	01/06/2020		
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	TRANSFERT	COLLECTEUR DE RFT	01/12/2006		
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	TRANSFERT	PRISE D'EAU LAC	01/12/2006		
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	TRANSFERT	CONDUITE DE REFOULEMENT P2	01/12/2006		
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	TRANSFERT	VANNE	01/12/2006	RAMUS	Papiram FTGS PN10
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	TRANSFERT	POMPE 1	26/09/2022	KSB	KRTK 150-403/304UEG-S
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	TRANSFERT	POMPE 2	27/09/2022	KSB	KRTK 150-403/304UEG-S
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	TRANSFERT	POMPE 4	01/12/2006	KSB	KRTK 150-315 / 294 UG-S
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	TRANSFERT	POMPE 5	01/12/2006	KSB	KRTK 150-315 / 294 UG-S
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	TRANSFERT	POMPE 3	28/09/2022	KSB	KRTK 150-403/304UEG-S
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	TRANSFERT	POMPE D'AMORCAGE	28/09/2022	KSB	AMAREX F 65-170/024F2USG-130
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	STATION D'ALERTE	SONDE PH	31/11/2022	HACH LANGE	
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	STATION D'ALERTE	SONDE CONDUCTIVITE	01/12/2009	HACH LANGE	
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	STATION D'ALERTE	TURBIDIMETRE	01/12/2008	HACH LANGE	
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	STATION D'ALERTE	OXYGENE DISSOUS	31/12/2015	HACH LANGE	
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	STATION D'ALERTE	HYDROCARBURES	31/12/2015	HACH LANGE	
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	STATION D'ALERTE	SONDE COT	01/04/2021	HACH LANGE	UVAS PLUS SC
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	STATION D'ALERTE	CENTRALISATEUR DE MESURE	31/06/2021	HACH LANGE	SC1000 LXG400.99.00031
ELV - La Teste de Buch - Exhaure CAZAUX LAC	STATION D'ALERTE	MESURE DE NIVEAU LAC	31/12/2015	ENDRESS HAUSER	
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE					
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	AMENAGEMENTS EXTERIEURS	CLOTURE	01/12/2012		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	AMENAGEMENTS EXTERIEURS	PORTAIL	01/12/2012		
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	AMENAGEMENTS EXTERIEURS	ECHELLE ACCES FORAGE	01/12/2012		
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	AMENAGEMENTS EXTERIEURS	TRAPPE ACCES FORAGE	01/12/2012		
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	BATIMENTS EXPLOITATION	Alarme Anti-Intrusion	01/06/2017	BOSCH	Solution 880-ICP-488ENCL508
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	BATIMENTS EXPLOITATION	Bassin	01/12/2012		
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	BATIMENTS EXPLOITATION	GC FORAGE	01/12/2012		
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	BATIMENTS EXPLOITATION	ECHELLE	01/12/2012		
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	BATIMENTS EXPLOITATION	Monorail	01/12/2012		
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	BATIMENTS EXPLOITATION	TRAPPE	01/12/2012		
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	BATIMENTS EXPLOITATION	VENTILATEUR AERATION	31/12/2015	UNELVENT	
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	SECURITE	Extincteur	01/12/2012	Desautel	
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	CONTROLE / COMMANDE	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	31/12/2015		
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	CONTROLE / COMMANDE	LIAISON ELCTRIQUE	01/12/2012		
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	CONTROLE / COMMANDE	TELEGESTION	19/03/2012	SOFREL	S550
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	CONTROLE / COMMANDE	VARIATEUR P1	15/11/2012	SCHNEIDER	ATV312
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	CONTROLE / COMMANDE	VARIATEUR POMPE INCENDIE	15/11/2012	SCHNEIDER	ATV 61
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	CONTROLE / COMMANDE	VARIATEUR P2	15/11/2012	SCHNEIDER	ATV 312
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	CONTROLE / COMMANDE	VARIATEUR P3	15/11/2012	SCHNEIDER	ATV 312
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	POMPAGE	LOT DE POIRES DE NIVEAU	03/05/2022	VEGA	Vegaflow SL1C EP
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	POMPAGE	CAPTEUR DE PRESSION	01/06/2022		
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	POMPAGE	CAPTEUR DE NIVEAU BACHE	03/05/2022	ENDRESS HAUSER	Water Pilot FMX21-1F6T7/0
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	POMPAGE	DEBITMETRE ALIMENTATION	02/05/2022	ENDRESS HAUSER	Promag W
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	POMPAGE	DEBITMETRE DISTRIBUTION	03/05/2022	ENDRESS HAUSER	Promag W

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	POMPAGE	CAPTEUR DE NIVEAU NAPPE FORAGE	26/04/2022	ENDRESS HAUSER	FMX21-1T873/0
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	POMPAGE	COMPTEUR FORAGE	10/10/2019	ITRON	WOLTEX DN 150 MID
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	POMPAGE	CLAPET RFT P1	19/03/2012	BAYARD	T105
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	POMPAGE	CLAPET RFT POMPE INCENDIE	19/03/2012	BAYARD	T105
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	POMPAGE	CLAPET ASP POMPE REPRISE	19/03/2012	BAYARD	T300
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	POMPAGE	CLAPET ASP POMPE INCENDIE	19/03/2012	BAYARD	T105
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	POMPAGE	CLAPET RFT P2	19/03/2012	BAYARD	T105
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	POMPAGE	CLAPET RFT P3	19/03/2012	BAYARD	T105
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	POMPAGE	CONDUITES	01/12/2012		
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	POMPAGE	TETE DE FORAGE	01/12/2012		
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	POMPAGE	COLONNE DE FORAGE	01/12/2012		
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	POMPAGE	BALLON ANTI-BELIER	21/01/2022	WILO	RESERV-300L-10B-VT-M-G1 1/4"
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	POMPAGE	VANNE BALLON	19/03/2012	AMRI KSB	Boax B T2 - 3g6k6g + CR165
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	POMPAGE	VANNE ASP P1	19/03/2012	AMRI KSB	Boax B T2 - 3g6k6g + CR300
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	POMPAGE	VANNE ASP POMPE INCENDIE	19/03/2012	AMRI KSB	Boax B T2 - 3g6k6g + cr300
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	POMPAGE	VANNE RFT P1	19/03/2012	AMRI KSB	Boax B T2 - 3g6k6g + mn12
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	POMPAGE	VANNE RFT POMPE INCENDIE	19/03/2012	AMRI KSB	Boax B T2 - 3g6k6g + mn12
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	POMPAGE	VANNE RFT P2	19/03/2012	AMRI KSB	Boax B T2 - 3g6k6g + mn12
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	POMPAGE	VANNE RFT P3	19/03/2012	AMRI KSB	Boax B T2 - 3g6k6g + mn12
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	POMPAGE	VANNE ASP P2	19/03/2012	AMRI KSB	Boax B T2 - 3g6k6g + CR300
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	POMPAGE	VANNE ASP P3	19/03/2012	AMRI KSB	Boax B T2 - 3g6k6g + CR300
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	POMPAGE	VANNE ASP POMPES REPRISE	01/12/2012		
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	POMPAGE	SONDE DE NIVEAU BACHE	02/06/2018	ENDRESS HAUSER	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	POMPAGE	POMPE 1	15/11/2012	KSB	MTC V 50/5C.4.1.11.61
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	POMPAGE	POMPE INCENDIE	15/11/2012	KSB	MTC V125/2.9.2.1.11.67
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	POMPAGE	POMPE 2	15/11/2012	KSB	MTC V 50/5C.4.1.11.61
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	POMPAGE	POMPE 3	15/11/2012	KSB	MTC V 50/5C.4.1.11.61
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	POMPAGE	POMPE DE FORAGE	20/03/2012	FLOWSERVE	PN81-6a + M6-530-2
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	Chlore Gazeux	Analyseur de Chlore	31/12/2015	SIEMENS	Depolox 5
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	Chlore Gazeux	Débitmètre	01/01/2017	PROMINENT	CL2 0-200 g/h
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	Chlore Gazeux	Vacuoastat	01/01/2017	PROMINENT	Vacuomètre 2 contacts CL2+TE -
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	Chlore Gazeux	Chloromètre 1	01/01/2017	PROMINENT	PM20AC/6F
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	Chlore Gazeux	Chloromètre 2	01/01/2017	PROMINENT	PM20AC/6F
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	Chlore Gazeux	Inverseur	01/01/2017	PROMINENT	PM400/1
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	Chlore Gazeux	Filtre dessicant	01/01/2017	PROMINENT	1080633-260 mm-32 mm-8/10
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	Chlore Gazeux	Hydroéjecteur	01/01/2017	PROMINENT	Hydro-éj.Cl2-DN20-PN 6-500g/h
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	Chlore Gazeux	Réducteur de Pression Eau de Service	01/01/2017		
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	Chlore Gazeux	Armoire de Stockage	01/01/2017	PROMINENT	
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	Chlore Gazeux	Bouteille 2	location	GAZECHIM	Bouteille chlore liquifié 49 Kgs
ELV - La Teste de Buch - CAZAUX-CAONNE	Chlore Gazeux	Bouteille 1	location	GAZECHIM	Bouteille chlore liquifié 49 Kgs
FOR - Arcachon - DESBIEY					
FOR - Arcachon - DESBIEY	BATIMENT TECHNIQUE	GC FORAGE	01/01/1947		
FOR - Arcachon - DESBIEY	BATIMENT TECHNIQUE	PLAQUE DE REGARD	01/06/2010		
FOR - Arcachon - DESBIEY	BATIMENT TECHNIQUE	Appareil d'Eclairage Intérieur	01/12/2017		
FOR - Arcachon - DESBIEY	BATIMENT TECHNIQUE	Alarme Anti-Intrusion	08/06/2017	ALTEC	ALTEC
FOR - Arcachon - DESBIEY	BATIMENT TECHNIQUE	Echelle	01/06/2017		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

FOR - Arcachon - DESBIEY	BATIMENT TECHNIQUE	Monorail	01/06/1995		
FOR - Arcachon - DESBIEY	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	ARMOIRE ELECTRIQUE	12/06/2019	ITECOM	
FOR - Arcachon - DESBIEY	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	TELEGESTION	31/12/2015	SOFREL	S500
FOR - Arcachon - DESBIEY	ALIMENTATION EAU BRUTE	SONDE HAUTEUR DE NAPPE	25/04/2022	ENDRESS HAUSER	FMX21-1T873/0
FOR - Arcachon - DESBIEY	ALIMENTATION EAU BRUTE	COMPTEUR	13/09/2023	ITRON	WE100KK250_01
FOR - Arcachon - DESBIEY	ALIMENTATION EAU BRUTE	POMPE EXHAURE	01/03/2023	GRUNDFOS	SP95-8
FOR - Arcachon - DESBIEY	HYDRAULIQUE	Ballon Anti-bélier	21/06/2011	CHARLATTE	HYDROCHOC
FOR - Arcachon - DESBIEY	HYDRAULIQUE	Clapet	31/12/2015		
FOR - Arcachon - DESBIEY	HYDRAULIQUE	COLONNE DE FORAGE	31/12/2015		
FOR - Arcachon - DESBIEY	HYDRAULIQUE	TETE DE FORAGE	31/12/2015		
FOR - Arcachon - DESBIEY	HYDRAULIQUE	Vanne Isolement Forage	31/12/2015		
FOR - Arcachon - DESBIEY	HYDRAULIQUE	Vanne Isolement Anti-Bellier	31/12/2015		
FOR - Arcachon - DESBIEY	ALIMENTATION ELECTRIQUE	ALIMENTATION EDF TARIF JAUNE	01/06/1994		
FOR - Arcachon - DESBIEY	Chlore Gazeux (stockage)	Armoire de Stockage	31/12/2015	PROMINENT	
FOR - La Teste de Buch - PISSENS					
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	DIVERS EXTERIEURS	CLOTURE	01/06/2006		
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	DIVERS EXTERIEURS	PORTAIL	01/06/2006		
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	BATIMENT TECHNIQUE	STRUCTURES METALLIQUES DIOXYDE	31/12/2015		
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	BATIMENT TECHNIQUE	Appareil d'Eclairage Intérieur	31/12/2015		
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	BATIMENT TECHNIQUE	Alarme Anti-Intrusion	01/06/2017	ALTEC	
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	BATIMENT TECHNIQUE	Bassin N°1	01/06/1987		
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	BATIMENT TECHNIQUE	Bassin N°2	01/06/1987		
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	BATIMENT TECHNIQUE	Bassin	01/06/1987		
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	BATIMENT TECHNIQUE	STRUCTURES METALLIQUES DIVERSES	31/12/2015		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

FOR - La Teste de Buch - PISSENS	BATIMENT TECHNIQUE	Lecteur de Badge	31/12/2015		
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	BATIMENT TECHNIQUE	Appareil d'Eclairage Extérieur	01/06/2008		
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	BATIMENT TECHNIQUE	ECHELLE 500 COMMUNE N°1 et 2	01/06/2008		
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	BATIMENT TECHNIQUE	ECHELLE 5000	01/06/2008		
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	BATIMENT TECHNIQUE	ECHELLE ACCES INTERIEUR BACHE 500 1	31/12/2015		
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	BATIMENT TECHNIQUE	ECHELLE ACCES INTERIEUR BACHE 500 2	31/12/2015		
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	BATIMENT TECHNIQUE	RAMPES ET GARDES CORPS	31/12/2015		
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	BATIMENT TECHNIQUE	CRINOLINE	31/12/2015		
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	BATIMENT TECHNIQUE	CAPOTAGE TETE DE FORAGE	01/06/2018		
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	SECURITE	Extincteur	31/12/2015	Desautel	
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	ARMOIRE ELECTRIQUE	01/12/2011	ITECOM	
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	TELEGESTION	01/12/2011	SOFREL	S550
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	VARIATEUR FORAGE	26/05/2020	SCHNEIDER	ATV630D75N4
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	VARIATEUR P1	01/12/2011	SCHNEIDER	ATV312HD11N4
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	VARIATEUR P4	01/12/2011	SCHNEIDER	ATV312HD11N4
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	VARIATEUR P3	01/12/2011	SCHNEIDER	ATV312HD11N4
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	VARIATEUR P2	01/12/2011	SCHNEIDER	ATV312HD11N4
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	ARMOIRE ELECTRIQUE GROUPE ELECTROGENE	Armoire de Commande	06/09/2021	SCHNEIDER	ATI 250
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	ALIMENTATION EAU BRUTE	COMPTAGE	01/06/2023	ITRON	WE150MK300_01

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

FOR - La Teste de Buch - PISSENS	ALIMENTATION EAU BRUTE	SONDE HAUTEUR DE NAPPE	31/12/2015	ENDRESS HAUSER	FMX167-A1AMH1A7
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	ALIMENTATION EAU BRUTE	POMPE	13/05/2019	FLOWSERVE	PN101-5A+M8-600-2
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	HYDRAULIQUE	CLAPET P1	31/12/2015		
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	HYDRAULIQUE	CLAPET CLASAR DN150	15/01/2016		DN150
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	HYDRAULIQUE	CLAPET P2	31/12/2015		
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	HYDRAULIQUE	CLAPET P3	31/12/2015		
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	HYDRAULIQUE	CLAPET P4	31/12/2015		
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	HYDRAULIQUE	COLLECTEUR DE RFT	01/01/1987		
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	HYDRAULIQUE	COLONNE DE FORAGE	01/06/2019		DN150 - HA/R2
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	HYDRAULIQUE	TETE DE FORAGE	01/06/2019		
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	HYDRAULIQUE	COLLECTEUR ASPIRATION	31/12/2015		
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	HYDRAULIQUE	COLONNES DES RESERVOIRS	01/12/2014		
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	HYDRAULIQUE	CANALISATION DE LIAISON	01/06/1996		
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	HYDRAULIQUE	BY-PASS	01/06/2011		
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	HYDRAULIQUE	COLONNES TP RESERV 5000	01/12/2011		
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	HYDRAULIQUE	CONE + CREPINE RESERV 5000	01/12/2011		
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	HYDRAULIQUE	BALLON ANTI-BELIER	27/12/2021	WILO	RESV-SUR-100L-16B-VT-V-G1´
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	HYDRAULIQUE	STABILISATEUR DN150	31/12/2015		
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	HYDRAULIQUE	VANNE DN80	31/12/2015	BAYARD	
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	HYDRAULIQUE	VANNE DN200	31/12/2015	BAYARD	
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	HYDRAULIQUE	VANNE DN100	15/01/2016	BAYARD	
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	HYDRAULIQUE	VANNE DN150	15/01/2016	BAYARD	
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	HYDRAULIQUE	VANNE PAPILLON DN150	15/01/2016	BAYARD	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

FOR - La Teste de Buch - PISSENS	DISTRIBUTION	DEBITMETRE ASPIRATION SURPRESSEUR	23/09/2020	ENDRESS HAUSER	PROMAG 10
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	DISTRIBUTION	COMPTEUR DN80	15/01/2016		
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	DISTRIBUTION	SONDE DE NIVEAU BACHES 500	15/01/2016	ENDRESS HAUSER	
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	DISTRIBUTION	SONDE DE NIVEAU BACHE 5000	15/01/2016	ENDRESS HAUSER	
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	DISTRIBUTION	POMPE P1	28/10/2015	KSB	Etanorm N 065-315 M11
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	DISTRIBUTION	POMPE P2	28/10/2015	KSB	Etanorm N 065-315 M11
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	DISTRIBUTION	POMPE P3	01/03/2022	KSB	Etanorm N 065-315 M11
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	DISTRIBUTION	POMPE P4	31/12/2015	KSB	Etanorm N 065-315 M11
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	ALIMENTATION GENERALE	Câbles Electriques Reprise	19/04/2016		
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	ALIMENTATION GENERALE	Câbles Electriques Forage	19/04/2016		
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	ALIMENTATION GENERALE	DISJONCTEUR	31/12/2015	SCHNEIDER	
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	PRODUCTION ENERGIE ELEC	GROUPE ELECTROGENE	03/09/2021	ENERSON	TJ123BD5L
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	Chlore Gazeux	Analyseur de Chlore	31/12/2015	SIEMENS	Depolox 5
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	Chlore Gazeux	Débitmètre	01/01/2017	PROMINENT	CL2 0-200 g/h
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	Chlore Gazeux	Vacuoastat	01/01/2017	PROMINENT	Vacuomètre 2 contacts CL2+TE -
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	Chlore Gazeux	Chloromètre 1	01/01/2017	PROMINENT	PM20AC/6F
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	Chlore Gazeux	Chloromètre 2	01/01/2017	PROMINENT	PM20AC/6F
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	Chlore Gazeux	Inverseur	01/01/2017	PROMINENT	PM400/1
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	Chlore Gazeux	Filtre dessicant	01/01/2017	PROMINENT	1080633-260 mm-32 mm-8/10
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	Chlore Gazeux	Hydroéjecteur	01/01/2017	PROMINENT	Hydro-éj.Cl2-DN20-PN 6-500g/h
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	Chlore Gazeux	Pompe d'Eau Motrice	01/01/2017	KSB	Movitec V 002/07-B
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	Chlore Gazeux	Réducteur de Pression Eau de Service	01/01/2017		
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	Chlore Gazeux	Electrovanne d'Injection	01/01/2017	BURKERT	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

FOR - La Teste de Buch - PISSENS	Chlore Gazeux	Armoire de Stockage	01/01/2017	PROMINENT	
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	Chlore Gazeux	Bouteille 2	location	GAZECHIM	Bouteille chlore liquifié 49 Kgs
FOR - La Teste de Buch - PISSENS	Chlore Gazeux	Bouteille 1	location	GAZECHIM	Bouteille chlore liquifié 49 Kgs
FOR - Gujan - LA HUME					
FOR - Gujan - LA HUME	DIVERS EXTERIEURS	CLOTURE	01/06/2006		
FOR - Gujan - LA HUME	DIVERS EXTERIEURS	PORTAIL	01/06/2006		
FOR - Gujan - LA HUME	DIVERS EXTERIEURS	Appareil d'Eclairage Extérieur	31/12/2015		
FOR - Gujan - LA HUME	BATIMENT TECHNIQUE	Bassin	01/06/1982		
FOR - Gujan - LA HUME	BATIMENT TECHNIQUE	ECHELLE INTERIEUR BACHE	01/06/2007		
FOR - Gujan - LA HUME	BATIMENT TECHNIQUE	PLAQUES DE REGARDS	31/12/2015		
FOR - Gujan - LA HUME	BATIMENT TECHNIQUE	VENTILLATEUR AERATION	31/12/2015	LEROY SOMER	LS100L1
FOR - Gujan - LA HUME	BATIMENT TECHNIQUE	CAPOTAGE TETE DE FORAGE 1			
FOR - Gujan - LA HUME	BATIMENT TECHNIQUE	CAPOTAGE TETE DE FORAGE 2			
FOR - Gujan - LA HUME	BATIMENT TECHNIQUE	Appareil d'Eclairage Intérieur	31/12/2015		
FOR - Gujan - LA HUME	BATIMENT TECHNIQUE	Alarme Anti-Intrusion	01/06/2017	ALTEC	
FOR - Gujan - LA HUME	BATIMENT TECHNIQUE	Lecteur de Badge	31/12/2015		
FOR - Gujan - LA HUME	BATIMENT TECHNIQUE	Convecteur Salle Reprise	31/12/2015		F117-T CHEP-4
FOR - Gujan - LA HUME	BATIMENT TECHNIQUE	Convecteur Salle Commande	31/12/2015		F117-T CHEP10-4
FOR - Gujan - LA HUME	SECURITE	Extincteur	31/12/2015	Desautel	
FOR - Gujan - LA HUME	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	31/12/2015	ITECOM	
FOR - Gujan - LA HUME	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	31/12/2015	ITECOM	
FOR - Gujan - LA HUME	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	TELEGESTION	31/12/2015	SOFREL	S550
FOR - Gujan - LA HUME	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	Démarreur Forage 2	31/12/2015	SCHNEIDER	ATS22D75Q

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

FOR - Gujan - LA HUME	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	Démarreur Forage 1	31/12/2015	SCHNEIDER	ATS22C11Q
FOR - Gujan - LA HUME	ALIMENTATION EAU BRUTE	SONDE HAUTEUR DE NAPPE 1	31/12/2015	ENDRESS HAUSER	FMX167-A1AMH1A7
FOR - Gujan - LA HUME	ALIMENTATION EAU BRUTE	SONDE HAUTEUR DE NAPPE 2	14/10/2023	ENDRESS HAUSER	Waterpilot FMW21
FOR - Gujan - LA HUME	ALIMENTATION EAU BRUTE	COMPTEUR FORAGE 1	21/12/2023	ITRON	WOLTEX WE150MK300_01
FOR - Gujan - LA HUME	ALIMENTATION EAU BRUTE	COMPTEUR FORAGE 2	22/10/2021	WOLTEX	M
FOR - Gujan - LA HUME	ALIMENTATION EAU BRUTE	Clapet Forage 1	31/12/2015	BAYARD	
FOR - Gujan - LA HUME	ALIMENTATION EAU BRUTE	POMPE FORAGE 1	12/12/2017	KSB	UPA 200B-80/7
FOR - Gujan - LA HUME	ALIMENTATION EAU BRUTE	POMPE FORAGE 2	15/01/2005	CAPRARI	E8S64/5M+MC850-8V
FOR - Gujan - LA HUME	ALIMENTATION EAU BRUTE	Vanne Bridage Forage 1	31/12/2015		
FOR - Gujan - LA HUME	ALIMENTATION EAU BRUTE	Vanne Bridage Forage 2	31/12/2015		
FOR - Gujan - LA HUME	HYDRAULIQUE	COLLECTEUR ASPIRATION DES PPES	31/12/2015		
FOR - Gujan - LA HUME	HYDRAULIQUE	COLONNE DE RFT F1	01/11/2018		
FOR - Gujan - LA HUME	HYDRAULIQUE	TETE DE FORAGE F1	01/03/2005		
FOR - Gujan - LA HUME	HYDRAULIQUE	TETE DE FORAGE F2	01/03/2005		
FOR - Gujan - LA HUME	HYDRAULIQUE	COLONNE DE RFT F2	01/03/2005		
FOR - Gujan - LA HUME	HYDRAULIQUE	TROP PLEIN BACHE	01/12/1982		
FOR - Gujan - LA HUME	HYDRAULIQUE	CANALISATION LIAISON F1	01/06/1982		
FOR - Gujan - LA HUME	HYDRAULIQUE	CANALISATION LIAISON F2	01/06/1986		
FOR - Gujan - LA HUME	HYDRAULIQUE	RAMPE DE PULVERISATION	01/06/2018		
FOR - Gujan - LA HUME	HYDRAULIQUE	Vanne d'Aspiration pompe 1	12/11/2018		MN.25 SX138801
FOR - Gujan - LA HUME	HYDRAULIQUE	Vanne d'Aspiration pompe 1	12/11/2018		
FOR - Gujan - LA HUME	HYDRAULIQUE	Vanne d'Aspiration pompe 2	12/11/2018		MN.25 SX138801
FOR - Gujan - LA HUME	HYDRAULIQUE	Vanne d'Aspiration pompe 3	12/11/2018		MN.25 SX138801
FOR - Gujan - LA HUME	HYDRAULIQUE	Vanne d'Aspiration pompe 4	12/11/2018		MN.25 SX138801
FOR - Gujan - LA HUME	HYDRAULIQUE	Vanne Alim Bâche par Forage 2	01/01/1986		
FOR - Gujan - LA HUME	HYDRAULIQUE	Vanne Alim Aqualand F1 (enterrée)	01/01/1986		
FOR - Gujan - LA HUME	HYDRAULIQUE	Vanne Alim Bâche F1	01/01/1986		
FOR - Gujan - LA HUME	HYDRAULIQUE	Vanne Alim Bâche F1 bis	01/01/1986		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

FOR - Gujan - LA HUME	HYDRAULIQUE	Vanne Retour Aqualand	01/01/1986		
FOR - Gujan - LA HUME	HYDRAULIQUE	VANNE AUTOMATIQUE SECOURS REMPLISSAGE BACHE	01/03/2017	MILLTRONICS	67599
FOR - Gujan - LA HUME	HYDRAULIQUE	Vanne Alim Aqualand F2	01/01/1986		
FOR - Gujan - LA HUME	HYDRAULIQUE	Vanne Manuelle Remplissage Bâche depuis Teich/Gujan	01/01/1986		
FOR - Gujan - LA HUME	HYDRAULIQUE	Vanne Mise à l'Egout	01/01/1986		
FOR - Gujan - LA HUME	HYDRAULIQUE	Vanne Vidange 1	01/01/1986		
FOR - Gujan - LA HUME	HYDRAULIQUE	Vanne Vidange 2	01/01/1986		
FOR - Gujan - LA HUME	HYDRAULIQUE	Vanne de Refoulement pompe 1	12/11/2018		MR 25
FOR - Gujan - LA HUME	HYDRAULIQUE	Vanne de Refoulement pompe 2	12/11/2018		MR 25
FOR - Gujan - LA HUME	HYDRAULIQUE	Vanne de Refoulement pompe 3	12/11/2018		MR 25
FOR - Gujan - LA HUME	HYDRAULIQUE	Vanne de Refoulement pompe 4	12/11/2018		MR 25
FOR - Gujan - LA HUME	DISTRIBUTION	LOT DE POIRE DE NIVEAU	13/05/2022	VEGA	VEGAFLO SL1CEP
FOR - Gujan - LA HUME	DISTRIBUTION	COMPTEUR AQUALAND ALLER	05/10/2016	ITRON	WE150MK300_01
FOR - Gujan - LA HUME	DISTRIBUTION	COMPTEUR AQUALAND RETOUR	05/10/2016	ITRON	WE150MK300_01
FOR - Gujan - LA HUME	DISTRIBUTION	COMPTEUR LA TESTE	06/10/2016	ITRON	WE250PN10
FOR - Gujan - LA HUME	DISTRIBUTION	COMPTEUR GUJAN	06/10/2016	ITRON	WE250PN10
FOR - Gujan - LA HUME	DISTRIBUTION	COMPTEUR REMPLISSAGE BACHE DEPUIS TEICH/GUJAN	31/12/2015		
FOR - Gujan - LA HUME	DISTRIBUTION	COMPTEUR ALIM LE TEICH	01/12/2012		
FOR - Gujan - LA HUME	DISTRIBUTION	SONDE DE NIVEAU BACHE	13/05/2022	ENDRESS HAUSER	WATERPILOT FMX21 1F6T7/0
FOR - Gujan - LA HUME	DISTRIBUTION	Clapet P1	01/06/2017	CLASAR	DN 200
FOR - Gujan - LA HUME	DISTRIBUTION	Clapet P2	01/06/2017	CLASAR	DN 200
FOR - Gujan - LA HUME	DISTRIBUTION	Clapet P3	01/06/2017	CLASAR	DN 200
FOR - Gujan - LA HUME	DISTRIBUTION	Clapet P4	01/06/2017	CLASAR	DN 200
FOR - Gujan - LA HUME	DISTRIBUTION	POMPE N°1	01/04/2010	CAPRARI	E10S50N/2B+MAC 850-8V
FOR - Gujan - LA HUME	DISTRIBUTION	POMPE N°2	31/12/2015	CAPRARI	E10S50N/2B+MAC 850-8V
FOR - Gujan - LA HUME	DISTRIBUTION	POMPE N°3	01/04/2010	PLEUGER	PN102-2A + M8-410Y3
FOR - Gujan - LA HUME	DISTRIBUTION	POMPE N°4	01/04/2010	PLEUGER	PN102-2A + M8-410Y3
FOR - Gujan - LA HUME	DISTRIBUTION	Vanne Aspiration P1	01/12/2014	AMRI KSB	MN25
FOR - Gujan - LA HUME	DISTRIBUTION	Vanne Aspiration P2	01/12/2014	AMRI KSB	MN25

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

FOR - Gujan - LA HUME	DISTRIBUTION	Vanne Aspiration P3	01/12/2014	AMRI KSB	MN25
FOR - Gujan - LA HUME	DISTRIBUTION	Vanne Aspiration P4	01/12/2014	AMRI KSB	MN25
FOR - Gujan - LA HUME	DISTRIBUTION	Vanne Refoulement P1	01/12/2014	AMRI KSB	MR25
FOR - Gujan - LA HUME	DISTRIBUTION	Vanne Refoulement P2	01/12/2014	AMRI KSB	MR25
FOR - Gujan - LA HUME	DISTRIBUTION	Vanne Refoulement P3	01/12/2014	AMRI KSB	MR25
FOR - Gujan - LA HUME	DISTRIBUTION	Vanne Refoulement P4	01/12/2014	AMRI KSB	MR25
FOR - Gujan - LA HUME	DISTRIBUTION	VANNE ASPIRATION POMPES DE REPRISE	01/12/2014		
FOR - Gujan - LA HUME	ENERGIE ELECTRIQUE	Câbles Electriques Pompe Reprise 1	20/04/2016		
FOR - Gujan - LA HUME	ENERGIE ELECTRIQUE	Câbles Electriques Pompe Reprise 2	20/04/2016		
FOR - Gujan - LA HUME	ENERGIE ELECTRIQUE	Câbles Electriques Forage 1	20/04/2016		
FOR - Gujan - LA HUME	ENERGIE ELECTRIQUE	Câbles Electriques Forage 2	20/04/2016		
FOR - Gujan - LA HUME	ENERGIE ELECTRIQUE	Répartiteur Electrique	05/07/2022	SOCOMEC	
FOR - Gujan - LA HUME	ENERGIE ELECTRIQUE	POSTE TRANSFO CABINE 160 KVA	01/06/2017		
FOR - Gujan - LA HUME	Chlore Gazeux	Analyseur de Chlore	31/12/2015	SIEMENS	Depolox 5 W3T158816
FOR - Gujan - LA HUME	Chlore Gazeux	Débitmètre 1	01/01/2017	PROMINENT	CL2 0-100 g/h PM200/3
FOR - Gujan - LA HUME	Chlore Gazeux	Débitmètre 2	01/01/2017	PROMINENT	CL2 0-200 g/h PM200/4
FOR - Gujan - LA HUME	Chlore Gazeux	Vacuoastat	01/01/2017	PROMINENT	Vacuomètre 2 contacts CL2+TE -
FOR - Gujan - LA HUME	Chlore Gazeux	Chloromètre 1	01/01/2017	PROMINENT	PM20AC/6F
FOR - Gujan - LA HUME	Chlore Gazeux	Chloromètre 2	01/01/2017	PROMINENT	PM20AC/6F
FOR - Gujan - LA HUME	Chlore Gazeux	Inverseur	01/01/2017	PROMINENT	PM400/1
FOR - Gujan - LA HUME	Chlore Gazeux	Filtre dessicant 1	01/01/2017	PROMINENT	1080633-260 mm-32 mm-8/10
FOR - Gujan - LA HUME	Chlore Gazeux	Filtre dessicant 2	01/01/2017	PROMINENT	1080633-260 mm-32 mm-8/10
FOR - Gujan - LA HUME	Chlore Gazeux	Hydroéjecteur 1	01/01/2017	PROMINENT	Hydro-éj.Cl2-DN20-PN 6-500g/h
FOR - Gujan - LA HUME	Chlore Gazeux	Hydroéjecteur 2	01/01/2017	PROMINENT	Hydro-éj.Cl2-DN20-PN 6-500g/h
FOR - Gujan - LA HUME	Chlore Gazeux	Réducteur de Pression Eau de Service	01/01/2017		
FOR - Gujan - LA HUME	Chlore Gazeux	Electrovanne d'Injection 1	01/01/2017	BURKERT	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

FOR - Gujan - LA HUME	Chlore Gazeux	Electrovanne d'Injection 2	01/01/2017	BURKERT	
FOR - Gujan - LA HUME	Chlore Gazeux	Armoire de Stockage	01/01/2017		
FOR - Gujan - LA HUME	Chlore Gazeux	Bouteille 2	location	GAZECHIM	Bouteille chlore liquifié 49 Kgs
FOR - Gujan - LA HUME	Chlore Gazeux	Bouteille 1	location	GAZECHIM	Bouteille chlore liquifié 49 Kgs
FOR - Gujan - LA PASSERELLE					
FOR - Gujan - LA PASSERELLE	DIVERS EXTERIEURS	CLOTURE	01/06/2006		
FOR - Gujan - LA PASSERELLE	DIVERS EXTERIEURS	PORTAIL	01/06/2006		
FOR - Gujan - LA PASSERELLE	BATIMENT TECHNIQUE	Bassin	01/12/1968		
FOR - Gujan - LA PASSERELLE	BATIMENT TECHNIQUE	STRUCTURES METALLIQUES	31/12/2015		
FOR - Gujan - LA PASSERELLE	BATIMENT TECHNIQUE	ECHELLE	01/061998		
FOR - Gujan - LA PASSERELLE	BATIMENT TECHNIQUE	CRINOLINE	01/061998		
FOR - Gujan - LA PASSERELLE	BATIMENT TECHNIQUE	REMBARDE	01/06/1989		
FOR - Gujan - LA PASSERELLE	BATIMENT TECHNIQUE	Appareil d'Eclairage Intérieur	31/12/2015		
FOR - Gujan - LA PASSERELLE	BATIMENT TECHNIQUE	Alarme Anti-Intrusion	01/06/2017	ALTEC	
FOR - Gujan - LA PASSERELLE	BATIMENT TECHNIQUE	Convecteur	31/12/2015		
FOR - Gujan - LA PASSERELLE	BATIMENT TECHNIQUE	PLAQUES DE REGARD EN GALVA	31/12/2015		
FOR - Gujan - LA PASSERELLE	SECURITE	Extincteur	31/12/2015	Desautel	
FOR - Gujan - LA PASSERELLE	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	ARMOIRE ELECTRIQUE	01/06/2016	ITECOM	
FOR - Gujan - LA PASSERELLE	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	COFFRET ELECTRIQUE DESYNFECTION	25/01/2016		
FOR - Gujan - LA PASSERELLE	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	ENSEMBLE DES LIAISONS ELECTRIQUES	25/01/2016		
FOR - Gujan - LA PASSERELLE	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	TELEGESTION	01/06/2016	SOFREL	S550
FOR - Gujan - LA PASSERELLE	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	VARAITEUR DE VITESSE FORAGE	29/10/2023	SCHNEIDER	ATV630D45N4 45KW

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

FOR - Gujan - LA PASSERELLE	MESURE NIVEAU RESERVOIR	SONDE DE NIVEAU RESERVOIR	25/01/2016	ENDRESS HAUSER	
FOR - Gujan - LA PASSERELLE	ALIMENTATION EAU BRUTE	DEBITMETRE DISTRIBUTION	01/06/2021	ABB	Aquamaster FEW32 - DN200
FOR - Gujan - LA PASSERELLE	ALIMENTATION EAU BRUTE	SONDE HAUTEUR DE NAPPE	26/04/2022	ENDRESS HAUSER	FMX21-1T873/0
FOR - Gujan - LA PASSERELLE	ALIMENTATION EAU BRUTE	COMPTEUR	29/09/2023	ITRON	WE150MK300_01
FOR - Gujan - LA PASSERELLE	ALIMENTATION EAU BRUTE	POMPE	01/06/2023	KSB	UPA 200B-130/7E
FOR - Gujan - LA PASSERELLE	HYDRAULIQUE	CLAPET DN100 CHARLATTE	31/12/2015		DN100
FOR - Gujan - LA PASSERELLE	HYDRAULIQUE	COLLECTEUR DE RFT	31/12/2015		
FOR - Gujan - LA PASSERELLE	HYDRAULIQUE	COLONNE DE FORAGE	31/12/2015		
FOR - Gujan - LA PASSERELLE	HYDRAULIQUE	TETE DE FORAGE	31/12/2015		
FOR - Gujan - LA PASSERELLE	HYDRAULIQUE	VANNE DN150	01/06/1998		
FOR - Gujan - LA PASSERELLE	HYDRAULIQUE	VANNE DN100 CHARLATTE	15/01/2016		
FOR - Gujan - LA PASSERELLE	ALIMENTATION ELECTRIQUE	TRANSFORMATEUR	01/06/2016		
FOR - Gujan - LA PASSERELLE	Chlore Gazeux	Analyseur de Chlore	16/01/2013	SIEMENS	Depolox 5
FOR - Gujan - LA PASSERELLE	Chlore Gazeux	Débitmètre	01/01/2017	PROMINENT	CL2 0-200 g/h
FOR - Gujan - LA PASSERELLE	Chlore Gazeux	Vacuoastat	01/01/2017	PROMINENT	Vacuomètre 2 contacts CL2+TE -
FOR - Gujan - LA PASSERELLE	Chlore Gazeux	Chloromètre 1	01/01/2017	PROMINENT	PM20AC/6F
FOR - Gujan - LA PASSERELLE	Chlore Gazeux	Chloromètre 2	01/01/2017	PROMINENT	PM20AC/6F
FOR - Gujan - LA PASSERELLE	Chlore Gazeux	Inverseur	01/01/2017	PROMINENT	PM400/1
FOR - Gujan - LA PASSERELLE	Chlore Gazeux	Filtre dessicant	01/01/2017	PROMINENT	1080633-260 mm-32 mm-8/10
FOR - Gujan - LA PASSERELLE	Chlore Gazeux	Hydroéjecteur	01/01/2017	PROMINENT	Hydro-éj.Cl2-DN20-PN 6-500g/h
FOR - Gujan - LA PASSERELLE	Chlore Gazeux	Pompe d'Eau Motrice	13/01/2016	KSB	Movitec V 002/07-B
FOR - Gujan - LA PASSERELLE	Chlore Gazeux	Réducteur de Pression Eau de Service	01/01/2017		
FOR - Gujan - LA PASSERELLE	Chlore Gazeux	Armoire de Stockage	01/01/2017	PROMINENT	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

FOR - Gujan - LA PASSERELLE	Chlore Gazeux	Bouteille 1	location	GAZECHIM	Bouteille chlore liquifié 49 Kgs
FOR - Gujan - LA PASSERELLE	Chlore Gazeux	Bouteille 2	location	GAZECHIM	Bouteille chlore liquifié 49 Kgs
FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE					
FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	DIVERS EXTERIEURS	CLOTURE	01/06/2017		
FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	DIVERS EXTERIEURS	PORTAIL	01/06/2000		
FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	BATIMENT TECHNIQUE	Bassin	01/06/2000		
FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	BATIMENT TECHNIQUE	Rampe d'aération	20/04/2016		
FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	BATIMENT TECHNIQUE	ECHELLE BASSIN	01/06/2000		
FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	BATIMENT TECHNIQUE	CRINOLINE	01/06/2000		
FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	BATIMENT TECHNIQUE	VENTILATEUR AERATION	31/12/2015	DELTA NEU	CENTRIPLAST 40 RD90 1500T
FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	BATIMENT TECHNIQUE	VENTILATEUR	31/12/2015	UNELVENT	HCBB/4-250/H
FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	BATIMENT TECHNIQUE	CAPOTAGE DE FORAGE	01/06/2000		
FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	SECURITE	Extincteur	31/12/2015	Desautel	
FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	ARMOIRE ELECTRIQUE	01/06/2018	ITECOM	
FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	AUTOMATE	01/06/2018	MODICON	TSX Micro
FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	TELEGESTION	31/12/2015	SOFREL	S50
FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	DEMARREUR POMPE FORAGE	01/06/2018	SCHNEIDER	ATS22D88Q
FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	VARIATEUR P1	01/06/2020	SCHNEIDER	ATV61
FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	VARIATEUR P2	31/12/2015	SCHNEIDER	ATV61
FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	VARIATEUR P3	31/12/2015	SCHNEIDER	ATV61

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	ALIMENTATION EAU BRUTE	SONDE HAUTEUR DE NAPPE	11/10/2023	ENDRESS HAUSER	Waterpilot FMW21
FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	ALIMENTATION EAU BRUTE	COMPTEUR	04/10/2023	ITRON	WOLTEX WE150
FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	ALIMENTATION EAU BRUTE	POMPE	06/05/2021	KSB	UPA250-120/03GB+UMA200-45
FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	HYDRAULIQUE	CLAPET	01/06/2000		
FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	HYDRAULIQUE	COLLECTEUR DE RFT	01/06/2000		
FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	HYDRAULIQUE	ACCESSOIRES HYDRAULIQUES	01/06/2000		
FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	HYDRAULIQUE	COLONNE DE FORAGE	31/12/2015		
FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	HYDRAULIQUE	TETE DE FORAGE	31/12/2015		
FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	HYDRAULIQUE	VANNE	01/06/2000		
FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	DISTRIBUTION	LOT DE POIRE DE NIVEAU	01/06/2010		
FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	DISTRIBUTION	SONDE DE NIVEAU	31/12/2015	ENDRESS HAUSER	
FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	DISTRIBUTION	DEBITMETRE ALIM RESEAU	21/09/2017	ENDRESS HAUSER	PROMAG 10W1F-RCOA1AA0A4AA
FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	DISTRIBUTION	POMPE 1	13/09/2016	KSB	80-065-200 GB AA11GD
FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	DISTRIBUTION	POMPE 2	31/12/2015	KSB	Etanorm-G 65-200 G10
FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	DISTRIBUTION	POMPE 3	31/12/2015	KSB	Etanorm-G 65-200 G10
FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	Chlore Gazeux	Analyseur de Chlore	01/08/2013	SIEMENS	SFL
FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	Chlore Gazeux	Débitmètre	01/01/2017	PROMINENT	CL2 0-200 g/h
FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	Chlore Gazeux	Vacuoastat	01/01/2017	PROMINENT	Vacuomètre 2 contacts CL2+TE -
FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	Chlore Gazeux	Chloromètre 1	01/01/2017	PROMINENT	PM20AC/6F
FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	Chlore Gazeux	Chloromètre 2	01/01/2017	PROMINENT	PM20AC/6F
FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	Chlore Gazeux	Inverseur	01/01/2017	PROMINENT	PM400/1
FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	Chlore Gazeux	Filtre dessicant	01/01/2017	PROMINENT	1080633-260 mm-32 mm-8/10

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	Chlore Gazeux	Hydroéjecteur	01/01/2017	PROMINENT	Hydro-éj.Cl2-DN20-PN6-500g/h
FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	Chlore Gazeux	Réducteur de Pression Eau de Service	01/01/2017		
FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	Chlore Gazeux	Armoire de Stockage	01/01/2017	PROMINENT	
FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	Chlore Gazeux	Bouteille 2	location	GAZECHIM	Bouteille chlore liquifié 49 Kgs
FOR - La Teste de Buch - VILLEMARIE	Chlore Gazeux	Bouteille 1	location	GAZECHIM	Bouteille chlore liquifié 49 Kgs
FOR - Le Teich - CAPLANDE					
FOR - Le Teich - CAPLANDE	DIVERS EXTERIEURS	CLOTURE	01/06/2006		
FOR - Le Teich - CAPLANDE	DIVERS EXTERIEURS	PORTAIL	01/06/2006		
FOR - Le Teich - CAPLANDE	DIVERS EXTERIEURS	Appareil d'Eclairage Extérieur	31/12/2015		
FOR - Le Teich - CAPLANDE	BATIMENT TECHNIQUE	Bassin	01/01/1968		
FOR - Le Teich - CAPLANDE	BATIMENT TECHNIQUE	STRUCTURES METALLIQUES	31/12/2015		
FOR - Le Teich - CAPLANDE	BATIMENT TECHNIQUE	PORTE METALLIQUE	01/06/2017		
FOR - Le Teich - CAPLANDE	BATIMENT TECHNIQUE	PLAQUES DE REGARD EN GALVA	14/10/2023		
FOR - Le Teich - CAPLANDE	BATIMENT TECHNIQUE	PLAQUES DE REGARD	01/06/2009		
FOR - Le Teich - CAPLANDE	BATIMENT TECHNIQUE	Bassin	01/01/1968		
FOR - Le Teich - CAPLANDE	BATIMENT TECHNIQUE	ECHELLE 9M	01/06/2008		
FOR - Le Teich - CAPLANDE	BATIMENT TECHNIQUE	ECHELLE	01/06/2011		
FOR - Le Teich - CAPLANDE	BATIMENT TECHNIQUE	ECHELLE 2M	01/06/2008		
FOR - Le Teich - CAPLANDE	BATIMENT TECHNIQUE	CRINOLINE	01/06/1997		
FOR - Le Teich - CAPLANDE	BATIMENT TECHNIQUE	STRUCTURES METALLIQUES	01/06/2017		
FOR - Le Teich - CAPLANDE	BATIMENT TECHNIQUE	CAPOTAGE TETE DE FORAGE 1	01/06/2006		
FOR - Le Teich - CAPLANDE	BATIMENT TECHNIQUE	CABANON TETE DE FORAGE 2	01/06/1989		
FOR - Le Teich - CAPLANDE	SECURITE	Extincteur	31/12/2015	Desautel	
FOR - Le Teich - CAPLANDE	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	ARMOIRE ELECTRIQUE	31/12/2015	ITECOM	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

FOR - Le Teich - CAPLANDE	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	ENSEMBLE DES LIAISONS ELECTRIQUES	01/06/2010		
FOR - Le Teich - CAPLANDE	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	TELEGESTION	31/12/2015	SOFREL	S50
FOR - Le Teich - CAPLANDE	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	VARIATEUR P1	31/12/2015	DANFOSS	VLT AQUA Drive
FOR - Le Teich - CAPLANDE	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	VARIATEUR P2	31/12/2015	DANFOSS	VLT AQUA Drive FC202
FOR - Le Teich - CAPLANDE	ALIMENTATION EAU BRUTE	DEBITMETRE F1	14/01/2015	KROHNE	waterflux 3100c nsf-61-g
FOR - Le Teich - CAPLANDE	ALIMENTATION EAU BRUTE	DEBITMETRE F2	02/10/2023	KROHNE	OPTIFLUX 2000 - DN 150
FOR - Le Teich - CAPLANDE	ALIMENTATION EAU BRUTE	COMPTAGE F1	31/012/2024		
FOR - Le Teich - CAPLANDE	ALIMENTATION EAU BRUTE	SONDE HAUTEUR DE NAPPE F1	10/05/2010	ENDRESS HAUSER	FMX167-A1AVV167
FOR - Le Teich - CAPLANDE	ALIMENTATION EAU BRUTE	SONDE HAUTEUR DE NAPPE F2	12/10/2023	ENDRESS HAUSER	Waterpilot FMX21
FOR - Le Teich - CAPLANDE	ALIMENTATION EAU BRUTE	COMPTAGE F2	31/11/23	KROHNE	OPTIFLUX 2100
FOR - Le Teich - CAPLANDE	ALIMENTATION EAU BRUTE	POMPE 1	18/10/2017	FLOWSERVE	NB66-6 + M6-240é2 Y3
FOR - Le Teich - CAPLANDE	ALIMENTATION EAU BRUTE	POMPE 2	06/03/2018	FLOWSERVE	PN84-5A + M8-300-2
FOR - Le Teich - CAPLANDE	HYDRAULIQUE	CLAPET P1	01/01/2023	BAYARD	DN 200
FOR - Le Teich - CAPLANDE	HYDRAULIQUE	CLAPET P2	01/01/2023	BAYARD	DN 200
FOR - Le Teich - CAPLANDE	HYDRAULIQUE	CLAPET P3	31/12/2015		
FOR - Le Teich - CAPLANDE	HYDRAULIQUE	COLLECTEUR REMPLISSAGE RESERVOIR	01/06/1989		
FOR - Le Teich - CAPLANDE	HYDRAULIQUE	ACCESSOIRES HYDRAULIQUES	31/12/2015		
FOR - Le Teich - CAPLANDE	HYDRAULIQUE	COLONNE DE FORAGE 2	31/12/2015		
FOR - Le Teich - CAPLANDE	HYDRAULIQUE	TETE DE FORAGE 1	01/06/2017		
FOR - Le Teich - CAPLANDE	HYDRAULIQUE	EQUIPEMENTS DIVERS DU FORAGE	01/06/2018		
FOR - Le Teich - CAPLANDE	HYDRAULIQUE	TETE DE FORAGE 2	31/12/2015		
FOR - Le Teich - CAPLANDE	HYDRAULIQUE	COLONNE FORAGE 1	31/12/2015		
FOR - Le Teich - CAPLANDE	HYDRAULIQUE	COLLECTEUR REPRISE	01/06/1989		
FOR - Le Teich - CAPLANDE	HYDRAULIQUE	COLLECTEUR ASPIRATION	01/06/1989		
FOR - Le Teich - CAPLANDE	HYDRAULIQUE	COLLECTEUR REFOULEMENT	01/01/2023		DN 200

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

FOR - Le Teich - CAPLANDE	HYDRAULIQUE	ENSEMBLE DES CANALISATIONS	22/10/2023		DN 200
FOR - Le Teich - CAPLANDE	HYDRAULIQUE	VANNE	31/12/2015		
FOR - Le Teich - CAPLANDE	HYDRAULIQUE	LOT DE VANNES	31/12/2015		
FOR - Le Teich - CAPLANDE	HYDRAULIQUE	VANNE AUTO DN100	22/01/2003	AMRI	ACTAIR6 R1121 1 AMTRONIC
FOR - Le Teich - CAPLANDE	PNEUMATIQUE	ACTIONNEUR PNEUMATIQUE	31/12/2015	AMRI KSB	ACTAIR 6 R1121
FOR - Le Teich - CAPLANDE	PNEUMATIQUE	COMPRESSEUR	01/06/2017	LACME	104.000
FOR - Le Teich - CAPLANDE	PNEUMATIQUE	CONTROLEUR POSITION VANNE	31/12/2015	AMRI KSB	AMTRONIC R1140
FOR - Le Teich - CAPLANDE	DISTRIBUTION	LOT DE POIRE DE NIVEAU	31/12/2015		
FOR - Le Teich - CAPLANDE	DISTRIBUTION	CAPTEUR DE PRESSION	31/12/2015		
FOR - Le Teich - CAPLANDE	DISTRIBUTION	SONDE DE NIVEAU BACHE	05/10/2016	ENDRESS HAUSER	
FOR - Le Teich - CAPLANDE	DISTRIBUTION	SONDE DE MESURE RESERVOIR	05/10/2016	ENDRESS HAUSER	
FOR - Le Teich - CAPLANDE	DISTRIBUTION	COMPTEUR DN200	05/10/2016	ITRON	WE150MK300_01
FOR - Le Teich - CAPLANDE	DISTRIBUTION	POMPE REPRISE 1	01/06/2016	KSB	UPA250C-150/2G
FOR - Le Teich - CAPLANDE	DISTRIBUTION	POMPE REPRISE 2	31/12/2015	FLOWSERVE	PN102-2A
FOR - Le Teich - CAPLANDE	BASSE TENSION	DISJONCTEUR BT	31/12/2015	SCHNEIDER	
FOR - Le Teich - CAPLANDE	HAUTE TENSION	TRANSFORMATEUR	31/12/2015		
FOR - Le Teich - CAPLANDE	Chlore Gazeux	Analyseur de Chlore	31/12/2015	SIEMENS	DEPOLOX 5
FOR - Le Teich - CAPLANDE	Chlore Gazeux	Débitmètre 1	01/01/2017	PROMINENT	CL2 0-100 g/h PM200/3
FOR - Le Teich - CAPLANDE	Chlore Gazeux	Débitmètre 2	01/01/2017	PROMINENT	CL2 0-200 g/h PM200/4
FOR - Le Teich - CAPLANDE	Chlore Gazeux	Vacuoastat	01/01/2017	PROMINENT	Vacuomètre 2 contacts CL2+TE -
FOR - Le Teich - CAPLANDE	Chlore Gazeux	Chloromètre 1	01/01/2017	PROMINENT	PM20AC/6F
FOR - Le Teich - CAPLANDE	Chlore Gazeux	Chloromètre 2	01/01/2017	PROMINENT	PM20AC/6F
FOR - Le Teich - CAPLANDE	Chlore Gazeux	Inverseur	01/01/2017	PROMINENT	PM400/1
FOR - Le Teich - CAPLANDE	Chlore Gazeux	Filtre dessicant 1	01/01/2017	PROMINENT	1080633-260 mm-32 mm-8/10
FOR - Le Teich - CAPLANDE	Chlore Gazeux	Filtre dessicant 2	01/01/2017	PROMINENT	1080633-260 mm-32 mm-8/10
FOR - Le Teich - CAPLANDE	Chlore Gazeux	Hydroéjecteur 1	01/01/2017	PROMINENT	Hydro-éj.Cl2-DN20-PN 6-500g/h

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

FOR - Le Teich - CAPLANDE	Chlore Gazeux	Hydroéjecteur 2	01/01/2017	PROMINENT	Hydro-éj.Cl2-DN20-PN6-500g/h
FOR - Le Teich - CAPLANDE	Chlore Gazeux	Réducteur de Pression Eau de Service	01/01/2017		
FOR - Le Teich - CAPLANDE	Chlore Gazeux	Electrovanne d'Injection 2	01/01/2017	BURKERT	
FOR - Le Teich - CAPLANDE	Chlore Gazeux	Electrovanne d'Injection 1	01/01/2017	BURKERT	
FOR - Le Teich - CAPLANDE	Chlore Gazeux	Armoire de Stockage	01/01/2017	PROMINENT	
FOR - Le Teich - CAPLANDE	Chlore Gazeux	Bouteille 1	location	GAZECHIM	Bouteille chlore liquifié 49 Kgs
FOR - Le Teich - CAPLANDE	Chlore Gazeux	Bouteille 2	location	GAZECHIM	Bouteille chlore liquifié 49 Kgs
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214					
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	DIVERS EXTERIEURS	PORTAIL	01/06/2002		
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	DIVERS EXTERIEURS	Appareil d'Eclairage Extérieur	31/12/2015		
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	BATIMENT TECHNIQUE	Bassin	01/06/1999		
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	BATIMENT TECHNIQUE	CRINOLINE+CROSSE	01/12/2008		
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	BATIMENT TECHNIQUE	COUVERTURE BACHE	01/12/2008		
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	BATIMENT TECHNIQUE	TRAPPE DE VISITE CHAMBRE A VANNE	31/12/2015		
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	BATIMENT TECHNIQUE	Appareil d'Eclairage Intérieur	31/12/2015		
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	BATIMENT TECHNIQUE	Alarme Anti-Intrusion	01/06/2017	ALTEC	
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	BATIMENT TECHNIQUE	Lecteur de Badge	31/12/2015	SOFREL	
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	BATIMENT TECHNIQUE	Convecteur Local Electrique	31/12/2015		
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	BATIMENT TECHNIQUE	Convecteur Local Chloration	31/12/2015		
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	BATIMENT TECHNIQUE	VENTILATEUR AERATION	31/12/2015	UNELVENT	HCFT/4-355/H
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	ARMOIRE ELECTRIQUE	01/06/2017	ITECOM	
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	AUTOMATE	01/06/2017	TELEMECANIQUE	TSX MICRO

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	LIAISON ELECTRIQUE	01/06/2018		
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	TELEGESTION	31/12/2015	SOFREL	S550
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	VARIATEUR	20/07/2010	DANFOSS	VLT AQUA FC 202
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	HYDRAULIQUE	Ballon Hydrofort	14/10/2022	WILO	RESV SUR 100L 16B VT M G1
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	HYDRAULIQUE	CLAPET DN125 RFT P1	31/12/2015	CLASAR	DN 125
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	HYDRAULIQUE	CLAPET DN125 RFT P2	31/12/2015	CLASAR	DN 125
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	HYDRAULIQUE	CLAPET DN125 RFT P3	31/12/2015	CLASAR	DN 125
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	HYDRAULIQUE	COLLECTEUR ASPIRATION	13/04/2010		
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	HYDRAULIQUE	NOURRICE DE REFOULEMENT	01/06/2009		
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	HYDRAULIQUE	COLLECTEUR REFOULEMENT P1	01/06/2020		
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	HYDRAULIQUE	COLLECTEUR REFOULEMENT P3	01/06/2020		
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	HYDRAULIQUE	COLLECTEUR REFOULEMENT P2	01/06/2020		
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	HYDRAULIQUE	SOUPAPE ANTI-BELIER	17/03/2010	BAYARD	AT0367
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	HYDRAULIQUE	VANNE ALIM RESEAU	31/12/2015		
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	HYDRAULIQUE	VANNE AUTOMATIQUE DE REMPLISSAGE	01/06/2017	BAYARD	ITR/KE009
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	HYDRAULIQUE	VANNE DN125 RFT P1	01/06/2012		
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	HYDRAULIQUE	VANNE DN125 RFT P2	01/06/2012		
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	HYDRAULIQUE	VANNE DN125 RFT P3	01/06/2012		
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	HYDRAULIQUE	VANNE ISOLEMENT SOUPAPE ANTI BELIER	31/12/2015		
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	DISTRIBUTION	DEBITMETRE	01/06/2019	ENDRESS HAUSER	Promag 10 - DN150
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	DISTRIBUTION	PPE 1 VITESSE VARIABLE	10/05/2010	KSB	UPA 200 B-80/4a + UMA 1
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	DISTRIBUTION	PPE 2 VITESSE VARIABLE	12/08/2020	WILO	K8.70 + NU501-2/22

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	DISTRIBUTION	PPE 3 VITESSE VARIABLE	12/08/2020	WILO	K8.70 + NU501-2/22
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	Distribution Electrique Basse Tension	Disjoncteur	19/04/2016	SCHNEIDER	
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	Chlore Gazeux	Analyseur de Chlore	31/12/2015	SIEMENS	Depolox 5
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	Chlore Gazeux	Débitmètre	01/01/2017	PROMINENT	CL2 0-200 g/h
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	Chlore Gazeux	Vacuoastat	01/01/2017	PROMINENT	Vacuomètre 2 contacts CL2+TE -
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	Chlore Gazeux	Chloromètre 1	01/01/2017	PROMINENT	PM20AC/6F
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	Chlore Gazeux	Chloromètre 2	01/01/2017	PROMINENT	PM20AC/6F
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	Chlore Gazeux	Inverseur	01/01/2017	PROMINENT	PM400/1
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	Chlore Gazeux	Filtre dessicant	01/01/2017	PROMINENT	1080633-260 mm-32 mm-8/10
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	Chlore Gazeux	Hydroéjecteur	01/01/2017	PROMINENT	Hydro-éj.Cl2-DN20-PN 6-500g/h
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	Chlore Gazeux	Réducteur de Pression Eau de Service	01/01/2017		
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	Chlore Gazeux	Electrovanne d'Injection	01/01/2017	BURKERT	
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	Chlore Gazeux	Armoire de Stockage	01/01/2017	PROMINENT	
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	Chlore Gazeux	Bouteille 2	location	GAZECHIM	Bouteille chlore liquifié 49 Kgs
SUR - La Teste de Buch - PISTE 214	Chlore Gazeux	Bouteille 1	location	GAZECHIM	Bouteille chlore liquifié 49 Kgs
FOR - La Teste de Buch - REPUBLIQUE/CAZAUX-LIBERATION					
FOR - La Teste de Buch - REPUBLIQUE/CAZAUX-LIBERATION	DIVERS EXTERIEURS	CLOTURE	01/06/2010		
FOR - La Teste de Buch - REPUBLIQUE/CAZAUX-LIBERATION	DIVERS EXTERIEURS	PORTAIL	01/06/2010		
FOR - La Teste de Buch - REPUBLIQUE/CAZAUX-LIBERATION	BATIMENT TECHNIQUE	Bassin	01/01/1961		
FOR - La Teste de Buch - REPUBLIQUE/CAZAUX-LIBERATION	BATIMENT TECHNIQUE	STRUCTURES METALLIQUES	01/06/2010		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

FOR - La Teste de Buch - REPUBLIQUE/CAZAUX-LIBERATION	BATIMENT TECHNIQUE	ECHELLE	01/06/2010		
FOR - La Teste de Buch - REPUBLIQUE/CAZAUX-LIBERATION	BATIMENT TECHNIQUE	CRINOLINE	01/06/2010		
FOR - La Teste de Buch - REPUBLIQUE/CAZAUX-LIBERATION	BATIMENT TECHNIQUE	REMBARDE	01/06/2010		
FOR - La Teste de Buch - REPUBLIQUE/CAZAUX-LIBERATION	BATIMENT TECHNIQUE	PLAQUES DE REGARD EN GALVA	01/06/2010		
FOR - La Teste de Buch - REPUBLIQUE/CAZAUX-LIBERATION	BATIMENT TECHNIQUE	CAPOTAGE FORAGE			
FOR - La Teste de Buch - REPUBLIQUE/CAZAUX-LIBERATION	SECURITE	Extincteur	31/12/2015	Desautel	
FOR - La Teste de Buch - REPUBLIQUE/CAZAUX-LIBERATION	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	ARMOIRE ELECTRIQUE	01/06/2017		
FOR - La Teste de Buch - REPUBLIQUE/CAZAUX-LIBERATION	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	TELEGESTION	31/12/2015	SOFREL	S50
FOR - La Teste de Buch - REPUBLIQUE/CAZAUX-LIBERATION	MESURE NIVEAU RESERVOIR	SONDE DE NIVEAU RESERVOIR	24/05/2022	ENDRESS HAUSER	Water Pilot FMX21 -1F6T7/0
FOR - La Teste de Buch - REPUBLIQUE/CAZAUX-LIBERATION	ALIMENTATION EAU BRUTE	SONDE HAUTEUR DE NAPPE	01/06/2016	ENDRESS HAUSER	FMX167-A1AVV1A7
FOR - La Teste de Buch - REPUBLIQUE/CAZAUX-LIBERATION	ALIMENTATION EAU BRUTE	POMPE	22/06/2020	WILO	TWI06.30
FOR - La Teste de Buch - REPUBLIQUE/CAZAUX-LIBERATION	HYDRAULIQUE	COMPTEUR ALIMENTATION RESERVOIR	01/06/2017		
FOR - La Teste de Buch - REPUBLIQUE/CAZAUX-LIBERATION	HYDRAULIQUE	COMPTEUR DISTRIBUTION	01/06/2017		
FOR - La Teste de Buch - REPUBLIQUE/CAZAUX-LIBERATION	HYDRAULIQUE	COMPTEUR EAU ANALYSEE	31/12/2015		
FOR - La Teste de Buch - REPUBLIQUE/CAZAUX-LIBERATION	HYDRAULIQUE	CLAPET DN100 CHARLATTE	31/12/2015		
FOR - La Teste de Buch - REPUBLIQUE/CAZAUX-LIBERATION	HYDRAULIQUE	TETE DE FORAGE	31/12/2015		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

FOR - La Teste de Buch - REPUBLIQUE/CAZAUX-LIBERATION	HYDRAULIQUE	COLONNE DE FORAGE	01/06/2020		
FOR - La Teste de Buch - REPUBLIQUE/CAZAUX-LIBERATION	HYDRAULIQUE	COLLECTEUR DE RFT	01/06/2010		
FOR - La Teste de Buch - REPUBLIQUE/CAZAUX-LIBERATION	HYDRAULIQUE	VANNE DN100 CHARLATTE	31/12/2015		
FOR - La Teste de Buch - REPUBLIQUE/CAZAUX-LIBERATION	HYDRAULIQUE	VANNE DN150	31/12/2015		
FOR - La Teste de Buch - REPUBLIQUE/CAZAUX-LIBERATION	Chlore Gazeux	Analyseur de Chlore	31/12/2015	SIEMENS	Depolox 5
FOR - La Teste de Buch - REPUBLIQUE/CAZAUX-LIBERATION	Chlore Gazeux	Débitmètre 1	01/01/2017	PROMINENT	CL2 0-100 g/h PM200/3
FOR - La Teste de Buch - REPUBLIQUE/CAZAUX-LIBERATION	Chlore Gazeux	Débitmètre 2	01/01/2017	PROMINENT	CL2 0-200 g/h PM200/4
FOR - La Teste de Buch - REPUBLIQUE/CAZAUX-LIBERATION	Chlore Gazeux	Vacuoastat	01/01/2017	PROMINENT	Vacuomètre 2 contacts CL2+TE -
FOR - La Teste de Buch - REPUBLIQUE/CAZAUX-LIBERATION	Chlore Gazeux	Chloromètre 1	01/01/2017	PROMINENT	PM20AC/6F
FOR - La Teste de Buch - REPUBLIQUE/CAZAUX-LIBERATION	Chlore Gazeux	Chloromètre 2	01/01/2017	PROMINENT	PM20AC/6F
FOR - La Teste de Buch - REPUBLIQUE/CAZAUX-LIBERATION	Chlore Gazeux	Inverseur	01/01/2017	PROMINENT	PM400/1
FOR - La Teste de Buch - REPUBLIQUE/CAZAUX-LIBERATION	Chlore Gazeux	Filtre dessicant 1	01/01/2017	PROMINENT	1080633-260 mm-32 mm-8/10
FOR - La Teste de Buch - REPUBLIQUE/CAZAUX-LIBERATION	Chlore Gazeux	Filtre dessicant 2	01/01/2017	PROMINENT	1080633-260 mm-32 mm-8/10
FOR - La Teste de Buch - REPUBLIQUE/CAZAUX-LIBERATION	Chlore Gazeux	Hydroéjecteur 1	01/01/2017	PROMINENT	Hydro-éj.Cl2-DN20-PN 6-500g/h
FOR - La Teste de Buch - REPUBLIQUE/CAZAUX-LIBERATION	Chlore Gazeux	Hydroéjecteur 2	01/01/2017	PROMINENT	Hydro-éj.Cl2-DN20-PN 6-500g/h
FOR - La Teste de Buch - REPUBLIQUE/CAZAUX-LIBERATION	Chlore Gazeux	Réducteur de Pression Eau de Service	01/01/2017		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

FOR - La Teste de Buch - REPUBLIQUE/CAZAUX-LIBERATION	Chlore Gazeux	Electrovanne d'Injection 2	01/01/2017	BURKERT	
FOR - La Teste de Buch - REPUBLIQUE/CAZAUX-LIBERATION	Chlore Gazeux	Electrovanne d'Injection 1	01/01/2017	BURKERT	
FOR - La Teste de Buch - REPUBLIQUE/CAZAUX-LIBERATION	Chlore Gazeux	Armoire de Stockage	01/01/2017	PROMINENT	
FOR - La Teste de Buch - REPUBLIQUE/CAZAUX-LIBERATION	Chlore Gazeux	Bouteille 1	location	GAZECHIM	Bouteille chlore liquifié 49 Kgs
FOR - La Teste de Buch - REPUBLIQUE/CAZAUX-LIBERATION	Chlore Gazeux	Bouteille 2	location	GAZECHIM	Bouteille chlore liquifié 49 Kgs
RES - Arcachon - L'ÉTOILE					
RES - Arcachon - L'ÉTOILE	AMENAGEMENT EXTERIEUR	CLOTURE	03/07/1990		
RES - Arcachon - L'ÉTOILE	AMENAGEMENT EXTERIEUR	PORTAIL	31/12/2015		
RES - Arcachon - L'ÉTOILE	CHATEAU D'EAU	Appareil d'Eclairage Intérieur	31/12/2015		
RES - Arcachon - L'ÉTOILE	CHATEAU D'EAU	Alarme Anti-Intrusion	01/06/2017	ALTEC	ALTEC
RES - Arcachon - L'ÉTOILE	CHATEAU D'EAU	Bassin	01/01/1962		
RES - Arcachon - L'ÉTOILE	CHATEAU D'EAU	Lecteur de Badge	31/12/2015	SOFREL	
RES - Arcachon - L'ÉTOILE	CHATEAU D'EAU	Appareil d'Eclairage Extérieur	31/12/2015		
RES - Arcachon - L'ÉTOILE	CHATEAU D'EAU	ECHELLE	01/01/2019		
RES - Arcachon - L'ÉTOILE	SECURITE	Extincteur	31/12/2015	Desautel	
RES - Arcachon - L'ÉTOILE	CONTROLE / COMMANDE	TELEGESTION	03/04/2000	SOFREL	S550
RES - Arcachon - L'ÉTOILE	CONTROLE / COMMANDE	ARMOIRE ELECTRIQUE	22/06/2021		
RES - Arcachon - L'ÉTOILE	ALIMENTATION / DISTRIBUTION	DEBITMETRE DE REMPLISSAGE FORAGE DESBIEY	31/12/2015	ENDRESS HAUSER	PROMAG W
RES - Arcachon - L'ÉTOILE	ALIMENTATION / DISTRIBUTION	SONDE DE NIVEAU RESERVOIR	01/06/2023	ENDRESS HAUSER	Waterpilot FMX11
RES - Arcachon - L'ÉTOILE	ALIMENTATION / DISTRIBUTION	CLAPET	03/06/1995		
RES - Arcachon - L'ÉTOILE	ALIMENTATION / DISTRIBUTION	COLLECTEUR DE DISTRIBUTION	03/07/1995		
RES - Arcachon - L'ÉTOILE	ALIMENTATION / DISTRIBUTION	COLLECTEUR D'ALIMENTATION	03/07/1995		
RES - Arcachon - L'ÉTOILE	ALIMENTATION / DISTRIBUTION	CONDUITE COMMUNE ALIM / DISTRIB	31/12/2015		
RES - Arcachon - L'ÉTOILE	ALIMENTATION / DISTRIBUTION	VANNE CONDUITE ALIMENTATION	03/07/1995		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

RES - Arcachon - L'ÉTOILE	ALIMENTATION / DISTRIBUTION	VANNE CONDUITE DISTRIBUTION	01/01/2019	BAYARD	DN 500
RES - Arcachon - L'ÉTOILE	ALIMENTATION / DISTRIBUTION	VANNE DE VIDANGE	09/03/2016	BAYARD	
RES - Arcachon - L'ÉTOILE	Chlore Gazeux	Analyseur de Chlore	29/06/2022	PROMINENT	DACB
RES - Arcachon - L'ÉTOILE	Chlore Gazeux	Débitmètre	01/01/2017	PROMINENT	CL2 0-200 g/h
RES - Arcachon - L'ÉTOILE	Chlore Gazeux	Vacuoastat	01/01/2017	PROMINENT	Vacuomètre 2 contacts CL2+TE -
RES - Arcachon - L'ÉTOILE	Chlore Gazeux	Chloromètre 1	01/01/2017	PROMINENT	PM20AC/6F
RES - Arcachon - L'ÉTOILE	Chlore Gazeux	Chloromètre 2	01/01/2017	PROMINENT	PM20AC/6F
RES - Arcachon - L'ÉTOILE	Chlore Gazeux	Inverseur	01/01/2017	PROMINENT	PM400/1
RES - Arcachon - L'ÉTOILE	Chlore Gazeux	Filtre dessicant	01/01/2017	PROMINENT	1080633-260 mm-32 mm-8/21
RES - Arcachon - L'ÉTOILE	Chlore Gazeux	Hydroéjecteur	15/07/2023	PROMINENT	Hydro-éj.Cl2-DN20-PN 6-500g/h
RES - Arcachon - L'ÉTOILE	Chlore Gazeux	Pompe d'Eau Motrice	03/01/2017	KSB	Movitec V 002/07-B
RES - Arcachon - L'ÉTOILE	Chlore Gazeux	Réducteur de Pression Eau de Service	01/01/2017		
RES - Arcachon - L'ÉTOILE	Chlore Gazeux	Armoire de Stockage	01/01/2017	PROMINENT	
RES - Arcachon - L'ÉTOILE	Chlore Gazeux	Bouteille 1	location	GAZECHIM	Bouteille chlore liquifié 49 Kgs
RES - Arcachon - L'ÉTOILE	Chlore Gazeux	Bouteille 2	location	GAZECHIM	Bouteille chlore liquifié 49 Kgs
RES - La Teste de Buch - LE GOLF					
RES - La Teste de Buch - LE GOLF	CHATEAU D'EAU	Appareil d'Eclairage Intérieur	31/12/2015		
RES - La Teste de Buch - LE GOLF	CHATEAU D'EAU	Alarme Anti-Intrusion	01/12/2017	ALTEC	
RES - La Teste de Buch - LE GOLF	CHATEAU D'EAU	Bassin	01/06/1996		
RES - La Teste de Buch - LE GOLF	CHATEAU D'EAU	Lecteur de Badge	01/12/2017	SOFREL	
RES - La Teste de Buch - LE GOLF	CHATEAU D'EAU	ECHELLE ACCES RESERVOIR	01/12/2010		
RES - La Teste de Buch - LE GOLF	CHATEAU D'EAU	Porte	31/12/2015		
RES - La Teste de Buch - LE GOLF	CONTROLE / COMMANDE	TELEGESTION	31/12/2015	SOFREL	S550

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

RES - La Teste de Buch - LE GOLF	CONTROLE / COMMANDE	ARMOIRE ELECTRIQUE	31/12/2015	ITECOM	
RES - La Teste de Buch - LE GOLF	ALIMENTATION / DISTRIBUTION	Analyseur de Chlore	31/12/2015	SIEMENS	Depolox 5
RES - La Teste de Buch - LE GOLF	ALIMENTATION / DISTRIBUTION	DETECTEUR DE NIVEAU	31/12/2015		
RES - La Teste de Buch - LE GOLF	ALIMENTATION / DISTRIBUTION	SONDE DE NIVEAU	17/10/2023	ENDRESS HAUSER	Waterpilot FMX21
RES - La Teste de Buch - LE GOLF	ALIMENTATION / DISTRIBUTION	COMPTEUR EAU ANALYSEE	31/12/2015		ALTAIR
RES - La Teste de Buch - LE GOLF	ALIMENTATION / DISTRIBUTION	COLONNE DE REMPLISSAGE	01/06/1996		
RES - La Teste de Buch - LE GOLF	ALIMENTATION / DISTRIBUTION	COLLECTEUR DE DISTRIBUTION	01/06/1996		
RES - La Teste de Buch - LE GOLF	ALIMENTATION / DISTRIBUTION	VANNE VIDANGE	01/06/1996		
RES - La Teste de Buch - LE GOLF	ALIMENTATION / DISTRIBUTION	TROP PLEIN	01/06/1996		
RES - La Teste de Buch - LE GOLF	ALIMENTATION / DISTRIBUTION	DEBITMETRE DOUBLE SENS	01/06/2019	KROHNE	WATERFLUX 3100
RES - La Teste de Buch - LE GOLF	ALIMENTATION / DISTRIBUTION	VANNE CONDUITE ALIM/DISTRIB PROCHE RESERVOIR	01/06/1996	BAYARD	
RES - La Teste de Buch - LE GOLF	ALIMENTATION / DISTRIBUTION	VANNE CONDUITE ALIM/DISTRIB COTE OPPOSE RESERVOIR	01/06/1996		
SUR - La Teste de Buch - PORTES DE L'OCEAN					
SUR - La Teste de Buch - PORTES DE L'OCEAN	Aménagements Extérieurs	Trappe	A l'arrêt		
SUR - La Teste de Buch - PORTES DE L'OCEAN	Unité de Contrôle / Commande	Armoire de Commande	A l'arrêt		
SUR - La Teste de Buch - PORTES DE L'OCEAN	Surpression	Accessoires hydrauliques	A l'arrêt		
SUR - La Teste de Buch - PORTES DE L'OCEAN	Surpression	Débitmètre	A l'arrêt		
SUR - La Teste de Buch - PORTES DE L'OCEAN	Surpression	Capteurs de Pression	A l'arrêt		
SUR - La Teste de Buch - PORTES DE L'OCEAN	Surpression	Pompe 1	A l'arrêt		
SUR - La Teste de Buch - HAMEAU DES BARONS					
SUR - La Teste de Buch - HAMEAU DES BARONS	Aménagements Extérieurs	PLAQUES DE REGARD ACCES POMPES	31/12/2015		
SUR - La Teste de Buch - HAMEAU DES BARONS	ARMOIRE ELECTRIQUE	ARMOIRE ELECTRIQUE	01/06/2017	SAMELEC	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

SUR - La Teste de Buch - HAMEAU DES BARONS	ARMOIRE ELECTRIQUE	REGULATION DE PRESSION	31/12/2015		
SUR - La Teste de Buch - HAMEAU DES BARONS	ARMOIRE ELECTRIQUE	TELEGESTION	31/12/2015	SOFREL	S530
SUR - La Teste de Buch - HAMEAU DES BARONS	ARMOIRE ELECTRIQUE	VARIATEUR DE VITESSE	01/06/2017	DANFOSS	VLT AQUA DRIVE
SUR - La Teste de Buch - HAMEAU DES BARONS	SURPRESSION	MESURE DE PRESSION - CAPTEUR	31/12/2015		
SUR - La Teste de Buch - HAMEAU DES BARONS	SURPRESSION	CLAPET BY PASS DN125	01/06/2000	CLASAR	DN 100
SUR - La Teste de Buch - HAMEAU DES BARONS	SURPRESSION	CLAPET P1 DN100	01/06/2000	CLASAR	DN 100
SUR - La Teste de Buch - HAMEAU DES BARONS	SURPRESSION	CLAPET P2 DN100	01/06/2017	CLASAR	DN 100
SUR - La Teste de Buch - HAMEAU DES BARONS	SURPRESSION	COLLECTEUR DE RFT DN125 No1	01/06/2000		DN 125
SUR - La Teste de Buch - HAMEAU DES BARONS	SURPRESSION	COLLECTEUR DE RFT DN125 No2	01/06/2000		DN 125
SUR - La Teste de Buch - HAMEAU DES BARONS	SURPRESSION	VANNE AMONT BY PASS DN125	01/06/2000		DN 125
SUR - La Teste de Buch - HAMEAU DES BARONS	SURPRESSION	VANNE ASPIRATION P1 DN100	01/06/2000		DN 100
SUR - La Teste de Buch - HAMEAU DES BARONS	SURPRESSION	VANNE RFT P1 DN100	01/06/2000		DN 100
SUR - La Teste de Buch - HAMEAU DES BARONS	SURPRESSION	VANNE ASPIRATION P2 DN100	01/06/2000		DN 100
SUR - La Teste de Buch - HAMEAU DES BARONS	SURPRESSION	VANNE RFT P2 DN100	01/06/2000		DN 100
SUR - La Teste de Buch - HAMEAU DES BARONS	SURPRESSION	VANNE AVAL BY PASS DN125	01/06/2000		DN 125
SUR - La Teste de Buch - HAMEAU DES BARONS	SURPRESSION	POMPE EN FOURREAU 1	01/06/2020	FLOWSERVE	
SUR - La Teste de Buch - HAMEAU DES BARONS	SURPRESSION	POMPE EN FOURREAU 2	01/06/2017	FLOWSERVE	
SUR - La Teste de Buch - CAMICAS					
SUR - La Teste de Buch - CAMICAS	Aménagements Extérieurs	CAPOTAGE ENSEMBLE SURPRESSEUR	01/06/2014		
SUR - La Teste de Buch - CAMICAS	Bâtiments d'Exploitation	Convecteur	01/06/2014		
SUR - La Teste de Buch - CAMICAS	Bâtiments d'Exploitation	Ventilateur	01/06/2014		costech/fandis/ c22s23hkbd00
SUR - La Teste de Buch - CAMICAS	Unité de Contrôle / Commande	Armoire de Commande	01/06/2014		
SUR - La Teste de Buch - CAMICAS	Unité de Contrôle / Commande	Support de Télétransmission	01/06/2014	SOFREL	S550

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

SUR - La Teste de Buch - CAMICAS	Surpression	Détecteur de pression aval	01/06/2014	TELEMECANIQUE	XMLB010A2S11
SUR - La Teste de Buch - CAMICAS	Surpression	Détecteur de pression amont	01/06/2014	TELEMECANIQUE	XMLB010A2S11
SUR - La Teste de Buch - CAMICAS	Surpression	Accessoires hydrauliques	01/06/2014		
SUR - La Teste de Buch - CAMICAS	Surpression	Ballon Hydrofort	01/06/2024	SALMSON	SANITAIRE 100L
SUR - La Teste de Buch - CAMICAS	Surpression	CLAPET RFT P1	01/06/2014	BAYARD	
SUR - La Teste de Buch - CAMICAS	Surpression	CLAPET RFT P2	01/06/2014	BAYARD	
SUR - La Teste de Buch - CAMICAS	Surpression	CLAPET RFT POMPE INCENDIE	01/06/2014	BAYARD	
SUR - La Teste de Buch - CAMICAS	Surpression	CLAPET BY PASS	01/06/2014	BAYARD	
SUR - La Teste de Buch - CAMICAS	Surpression	Débitmètre	01/06/2014	ABB	AQUAMASTER
SUR - La Teste de Buch - CAMICAS	Surpression	Pompe de Surpression 1	01/06/2014	SALMSON	MULTI-VE803-OSE-T4/2-2G/MOD
SUR - La Teste de Buch - CAMICAS	Surpression	Pompe de Surpression 2	01/06/2014	SALMSON	MULTI-VE803-OSE-T4/2-2G/MOD
SUR - La Teste de Buch - CAMICAS	Surpression	Pompe Incendie	01/06/2014	SALMSON	NEXISV5202-OGE/K/400-50
SUR - La Teste de Buch - CAMICAS	Surpression	VANNE AMONT SURPRESSION	01/06/2014		
SUR - La Teste de Buch - CAMICAS	Surpression	VANNE AVAL SURPRESSION	01/06/2014		
SUR - La Teste de Buch - CAMICAS	Surpression	VANNE AMONT POMPE INCENDIE	01/06/2014		
SUR - La Teste de Buch - CAMICAS	Surpression	VANNE AVAL POMPE INCENDIE	01/06/2014		
SUR - La Teste de Buch - CAMICAS	Surpression	VANNE 1 BY PASS	01/06/2014		
SUR - La Teste de Buch - CAMICAS	Surpression	VANNE 2 BY PASS	01/06/2014		
SUR - Le Teich - SURPRESSEUR GRANGENEUVE					
SUR - Le Teich - SURPRESSEUR GRANGENEUVE	Aménagements Extérieurs	Clôture/Portail	01/06/2024		
SUR - Le Teich - SURPRESSEUR GRANGENEUVE	Bâtiments d'Exploitation	Alarme Anti-Intrusion	17/05/2017		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

SUR - Le Teich - SURPRESSEUR GRANGENEUVE	Bâtiments d'Exploitation	Bâtiment / Local	17/05/2017		
SUR - Le Teich - SURPRESSEUR GRANGENEUVE	Bâtiments d'Exploitation	Palan	17/05/2017	KOCH	KONECRANES KM II-G-500-3
SUR - Le Teich - SURPRESSEUR GRANGENEUVE	Bâtiments d'Exploitation	Portique	17/05/2017		KONECRANES XMSA-050-0350
SUR - Le Teich - SURPRESSEUR GRANGENEUVE	Unité de Contrôle / Commande	Ecran Tactile	17/05/2017	KEP	MMI-7121-A
SUR - Le Teich - SURPRESSEUR GRANGENEUVE	Unité de Contrôle / Commande	Armoire de Commande	17/05/2017		
SUR - Le Teich - SURPRESSEUR GRANGENEUVE	Unité de Contrôle / Commande	Système Anti-Intrusion	17/05/2017	SCHNEIDER	
SUR - Le Teich - SURPRESSEUR GRANGENEUVE	Unité de Contrôle / Commande	Support de Télétransmission	17/05/2017	SOFREL	S550
SUR - Le Teich - SURPRESSEUR GRANGENEUVE	Unité de Contrôle / Commande	Variateur Pompe 1	15/01/2017	DANFOSS	ksb202p11kt4
SUR - Le Teich - SURPRESSEUR GRANGENEUVE	Unité de Contrôle / Commande	Variateur Pompe 2	09/01/2017	DANFOSS	ksb202^pp11kt4
SUR - Le Teich - SURPRESSEUR GRANGENEUVE	Unité de Contrôle / Commande	Variateur Pompe 3	09/01/2017	DANFOSS	ksb202p11kt4
SUR - Le Teich - SURPRESSEUR GRANGENEUVE	Stockage	Débitmètre entrée réservoir	10/01/2017	ENDRESS HAUSER	PROMAG L 5L4C1F-64T7/0
SUR - Le Teich - SURPRESSEUR GRANGENEUVE	Stockage	Débitmètre Distribution	15/01/2017	ENDRESS HAUSER	PROMAG L 5L4C1F 64T710
SUR - Le Teich - SURPRESSEUR GRANGENEUVE	Stockage	Jeu de Poires de Niveau Secours	17/05/2017	FLYGT	ENM10
SUR - Le Teich - SURPRESSEUR GRANGENEUVE	Stockage	Sonde de Niveau	17/05/2017	ENDRESS HAUSER	WATERPILOT FMX167
SUR - Le Teich - SURPRESSEUR GRANGENEUVE	Stockage	Capteur de Pression Réseau distribution	17/05/2017	ENDRESS HAUSER	PMC131-A15E2A1S
SUR - Le Teich - SURPRESSEUR GRANGENEUVE	Stockage	Clapet by-pass Amont	16/01/2017	SOCLA	FIG402

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

SUR - Le Teich - SURPRESSEUR GRANGENEUVE	Stockage	Canalisation / Tuyauterie	17/05/2017		
SUR - Le Teich - SURPRESSEUR GRANGENEUVE	Stockage	Vanne d'alimentation Altimétrique	17/05/2017	BAYARD	HYDROBLOC
SUR - Le Teich - SURPRESSEUR GRANGENEUVE	Stockage	Réservoir	17/05/2017		
SUR - Le Teich - SURPRESSEUR GRANGENEUVE	Surpression	Ballon de surpression (Hydrofort)	24/01/2017	REFLEX	REFIX DE800
SUR - Le Teich - SURPRESSEUR GRANGENEUVE	Surpression	Pompe 2	23/01/2017	KSB	Multitec MTC C 100/3-7.1 11.67
SUR - Le Teich - SURPRESSEUR GRANGENEUVE	Surpression	Pompe 1	22/01/2017	KSB	Multitec MTC C 100/3-7.1 11.67
SUR - Le Teich - SURPRESSEUR GRANGENEUVE	Surpression	Pompe 3 (def incendie)	09/01/2017	KSB	Multitec MTC C 100/3-7.1 11.67
SUR - Le Teich - SURPRESSEUR GRANGENEUVE	Poste de Livraison Electricité	Auto-Transformateur	17/05/2017		
SUR - Le Teich - SURPRESSEUR GRANGENEUVE	Chlore Gazeux	Analyseur de Chlore en continu	11/01/2017	EVOQUA	Depolox 5 d5df
SUR - Le Teich - SURPRESSEUR GRANGENEUVE	Chlore Gazeux	Chloromètre	17/05/2017	PROMINENT	CCL2-PM 20 C
SUR - Le Teich - SURPRESSEUR GRANGENEUVE	Chlore Gazeux	Débitmètre	17/05/2017	PROMINENT	200 g/h
SUR - Le Teich - SURPRESSEUR GRANGENEUVE	Chlore Gazeux	Détendeur / Inverseur	17/05/2017	PROMINENT	cl2-pm400/1
SUR - Le Teich - SURPRESSEUR GRANGENEUVE	Chlore Gazeux	Filtre détendeur	17/05/2017		
SUR - Le Teich - SURPRESSEUR GRANGENEUVE	Chlore Gazeux	Hydroéjecteur	08/10/2023	PROMINENT	DN20 PN6 500g/h
SUR - Le Teich - SURPRESSEUR GRANGENEUVE	Chlore Gazeux	Electrovanne d'Injection	17/05/2017	BURKERT	0142 A 20?0 SKM PV
SUR - Le Teich - SURPRESSEUR GRANGENEUVE	Chlore Gazeux	Armoire de Stockage (2 bouteilles)	17/05/2017	PROMINENT	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

SUR - Le Teich - SURPRESSEUR GRANGENEUVE	Chlore Gazeux	Bouteille 1	location		
SUR - Le Teich - SURPRESSEUR GRANGENEUVE	Chlore Gazeux	Bouteille 2	location		
SUR - Le Teich - SURPRESSEUR GRANGENEUVE	Chlore Gazeux	Kit de Diphotérine	17/05/2017		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS					
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Production d'Air	Surpresseur d'Air 1 Lavage Filtres	02/07/2007	AERZEN	Delta Blower GM 25S DN1255G5
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Production d'Air	Surpresseur d'Air 2 Lavage Filtres	02/07/2007	AERZEN	Delta Blower GM 25S DN1255G5
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Production d'Air	Compresseur	01/06/2018	KAESER	SK 6
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Production d'Air	Filtre/Régulateur/Lubrificateur d'Air	01/01/2017	SOME INDUSTRIE	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Production d'Air	Appareil de Mesure Physique Pression 1	31/12/2015	TELEMECANIQUE	NAUTILUS
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Production d'Air	Appareil de Mesure Physique Pression 2	31/12/2015	TELEMECANIQUE	NAUTILUS
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Production d'Air	COMPRESSEUR AIR 1	01/06/2018	KAESER	SK 22
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Production d'Air	COMPRESSEUR AIR 2	01/06/2017	KAESER	SK 22
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Traitement Air	Groupe Froid	31/12/2015	DONALDSON	DC00085A - 1054A
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Traitement Air	Purge Groupe Froid	31/12/2015	KAESER	ECO DRAIN 30
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Traitement Air	Sécheur d'Air	31/12/2015	DONALDSON	ULTRAPACK MSD 0080 M
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Traitement Air	Purge Sécheur d'Air	31/12/2015	KAISER	ECO DRAIN 30
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Stockage d'Air	Ballon de Stockage Air	01/05/2007	OKS	528381
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Stockage d'Air	Purge Ballon Stockage Air	31/12/2015	KAISER	ECO DRAIN 30
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Bâtiments d'Exploitation	Bâche Eau Sale	02/07/2007		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Bâtiments d'Exploitation	Bâche 1000	02/07/2007		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Bâtiments d'Exploitation	Bâche 300	02/07/2007		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Bâtiments d'Exploitation	Déshumidificateur Local Filtres	02/07/2007	DANTHERM	CDT85

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Bâtiments d'Exploitation	Déshumidificateur Local Réactif 1	02/07/2007		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Bâtiments d'Exploitation	Déshumidificateur Local Réactifs 2	02/07/2007		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Bâtiments d'Exploitation	Souffleur Air Chaud	02/07/2007	AIRELEC	Airpulse 306.01
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Bâtiments d'Exploitation	Souffleur Air Chaud	02/07/2007	AIRELEC	Airpulse 306.01
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Bâtiments d'Exploitation	Souffleur Air Chaud Gallerie Filtre 1	02/07/2007	AIRELEC	Airpulse 306.01
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Bâtiments d'Exploitation	Souffleur Air Chaud	02/07/2007	AIRELEC	Airpulse 306.01
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Bâtiments d'Exploitation	Souffleur Air Chaud	02/07/2007	AIRELEC	Airpulse 306.01
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Bâtiments d'Exploitation	Extracteur Local Reactif 1	02/07/2007	AREM	AC25C21P2165
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Bâtiments d'Exploitation	Extracteur Local Reactif 2	02/07/2007	AREM	AC25C21P2165
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Bâtiments d'Exploitation	Extracteur Galerie Filtre 1	02/07/2007	AREM	AC25C21P2165
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Bâtiments d'Exploitation	Extracteur Galerie Filtre 2	02/07/2007	AREM	AC25C21P2165
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Bâtiments d'Exploitation	Extracteur Local Ozoneur	12/09/2023	AREM	AC25C21P2165
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Bâtiments d'Exploitation	Extracteur Local Electrique	02/07/2007	AREM	AC25C21P2165
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Bâtiments d'Exploitation	Extracteur	02/07/2007	AREM	AC25C21P2165
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Bâtiments d'Exploitation	Porte / Portail	01/06/2018		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Bâtiments d'Exploitation	Palan Préparation Microsable	02/07/2007	VERLINDE	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Bâtiments d'Exploitation	Palan Manuel Gallerie des Filtres	02/07/2007		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Bâtiments d'Exploitation	Potence Bassin Coagulation	02/07/2007		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Bâtiments d'Exploitation	Monorail Gallerie Filtres	02/07/2007		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Bâtiments d'Exploitation	Rail 1 Couloir Bâche Eau Sale	02/07/2007		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Bâtiments d'Exploitation	Rail 2 Couloir Bâche Eau Sale	02/07/2007		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Bâtiments d'Exploitation	Rail Levage Sac Microsable	02/07/2007		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Sécurité	Alarme Anti-Intrusion	17/05/2017	ALTEC	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Sécurité	Rince-Œil Forage	31/12/2015		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Sécurité	Rince-Œil Salle Réactifs	31/12/2015		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Sécurité	Rince-Œil Salle Filtres	31/12/2015		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Sécurité	Rince-Œil Laboratoire	31/12/2015		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Extraction / Soutirage des Boues	Clapet Pompe Eau Sale 1	01/06/2018	TECOFI	CBL3240
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Extraction / Soutirage des Boues	Clapet Pompe Eau Sale 2	01/06/2018	TECOFI	CBL3240
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Extraction / Soutirage des Boues	Détecteur Niveau Très Bas Bâche Eau Sale	31/12/2015		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Extraction / Soutirage des Boues	Détecteur Niveau Très Haut Bâche Eau Sale	31/12/2015		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Extraction / Soutirage des Boues	Mesure Niveau Bâche Eau Sale	31/12/2015	SIEMENS	XRS-5 Ultrasonic Transducer
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Extraction / Soutirage des Boues	Débitmètre Boues	15/11/2016	ENDRESS HAUSER	5L4C1H-AALHA0AUD2 30B+
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Extraction / Soutirage des Boues	Pompe de Transfert Boues 1	01/12/2018	KSB	AMAREX KRTF80-210/034UH-S
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Extraction / Soutirage des Boues	Pompe de Transfert Boues 2	01/06/2007	KSB	AMAREX F80-210/034UH-S
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Extraction / Soutirage des Boues	Pompe Transfert Bache Eaux Sales	01/06/2007	KSB	AMAREX F80-210/034UH-S
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Extraction / Soutirage des Boues	Vanne Refoulement Pompe Transfert Boues 1	02/07/2007		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Extraction / Soutirage des Boues	Vanne Refoulement Pompe Transfert Boues 2	02/07/2007		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Extraction / Soutirage des Boues	Détecteur	01/06/2020		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Extraction / Soutirage des Boues	Pompe de Relèvement	08/10/2007	FLYGT	FLIGT DXVM50
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	Armoire Electrique	02/07/2007		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	TELEGESTION USINE	31/12/2015	SOFREL	S550
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	Démarreur pompe de forage	02/07/2007	TELEMECANIQUE	Altistart 48 ATS48C14Q
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	Démarreur pompe vers Etoile 1	02/07/2007	SCHNEIDER	Altistart 22 ATS22C17Q

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	Démarreur pompe vers Etoile 2	01/06/2018	TELEMECANIQUE	Altistart 22 ATS22C17Q
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	Démarreur pompe vers Pissens 2	31/12/2015	SCHNEIDER	Altistart 48 ATS48C14Q
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	Démarreur pompe vers Golf 1	31/12/2015	SCHLUMBERGER	Altistart 48 ATS48C14Q
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	Démarreur pompe vers Golf 2	31/12/2015	SCHNEIDER	Altistart 22 ATS22C17Q
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE	Démarreur pompe vers Pissens 1	31/12/2015	SCHNEIDER	Altistart 48 ATS48C14Q
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	ARMOIRE ELECTRIQUE POMPES CAPTEURS ANALYSEURS	AUTOMATE	01/06/2016	TELEMECANIQUE	TSX Prémium
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	ARMOIRE ELECTRIQUE OZONEUR	Armoire de Commande	02/07/2007	WEDECO	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	ARMOIRE ELECTRIQUE OZONEUR	Automate	02/07/2007	WEDECO	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	ARMOIRE ELECTRIQUE OZONEUR	Transformateur Monophasé	02/07/2007	MOELLER	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	ARMOIRE ELECTRIQUE CAP	Variateur Vis Doseuse CAP 1	01/06/2015	SCHNEIDER	ATV312H037N4
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	ARMOIRE ELECTRIQUE CAP	Variateur Vis Doseuse CAP 2	01/06/2015	SCHNEIDER	ATV312H037N4
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	ARMOIRE ELECTRIQUE SURPRESSEUR EAU DE SERVICE	Automate	31/12/2015	MITSUBISHI	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	ARMOIRE ELECTRIQUE SURPRESSEUR EAU DE SERVICE	Variateur de Fréquence	31/12/2015	DANFOSS	VLT 6000 HVAC
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	ONDULEUR	ONDULEUR	01/12/2022	LEGRAND	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	ARMOIRE ELECTRIQUE TRAITEMENT/REACTIFS	Automate	01/06/2016	TELEMECANIQUE	TSX Premiuim
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	ARMOIRE ELECTRIQUE TRAITEMENT/REACTIFS	Variateur Pompe Coagulant 1	31/12/2015	TELEMECANIQUE	ATV31HO18M2

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	ARMOIRE ELECTRIQUE TRAITEMENT/REACTIFS	Variateur Pompe Coagulant 2	31/12/2015	TELEMECANIQUE	ATV31HO18M2
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	ARMOIRE ELECTRIQUE TRAITEMENT/REACTIFS	Variateur Pompe Coagulant 3	06/04/2016	SCHNEIDER	ATV312HO18M2
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	ARMOIRE ELECTRIQUE TRAITEMENT/REACTIFS	Variateur Pompes Remise à l'Equilibre 1	02/07/2007	LENZE	ESMD302L4TXA
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	ARMOIRE ELECTRIQUE TRAITEMENT/REACTIFS	Variateur Pompe Remise à l'Equilibre 2	02/07/2007	LENZE	ESMD302L4TXA
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	ARMOIRE ELECTRIQUE TRAITEMENT/REACTIFS	Variateur Pompe Ajustement Eau de Chaux 1	02/07/2007	SCHNEIDER	ATV31HO18M2
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	ARMOIRE ELECTRIQUE TRAITEMENT/REACTIFS	Variateur Pompe Ajustement Eau de Chaux 2	02/07/2007	SCHNEIDER	ATV31HO18M2
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	ARMOIRE ELECTRIQUE TRAITEMENT/REACTIFS	Variateur Vis Doseuse Chaux 1	04/09/2017		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	ARMOIRE ELECTRIQUE TRAITEMENT/REACTIFS	Variateur Vis Doseuse Chaux 2	04/09/2017		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	ARMOIRE ELECTRIQUE TRAITEMENT/REACTIFS	Variateur Pompe Polymère vers Actiflo 1	04/09/2017		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	ARMOIRE ELECTRIQUE TRAITEMENT/REACTIFS	Variateur Pompe Polymère vers Actiflo 2	04/09/2017		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	ARMOIRE ELECTRIQUE TRAITEMENT/REACTIFS	Variateur Pompe Polymère vers Actiflo 3	04/09/2017		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	ARMOIRE ELECTRIQUE TRAITEMENT/REACTIFS	Variateur Pompe Lait de Chaux vers Reminé 1	04/09/2017		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	ARMOIRE ELECTRIQUE TRAITEMENT/REACTIFS	Variateur Pompe Lait de Chaux vers Reminé 2	04/09/2017		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	ARMOIRE ELECTRIQUE TRAITEMENT/REACTIFS	Variateur Pompe Lait de Chaux vers Saturateur 1	04/09/2017		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	ARMOIRE ELECTRIQUE TRAITEMENT/REACTIFS	Variateur Pompe Lait de Chaux vers Saturateur 2	04/09/2017		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	ARMOIRE ELECTRIQUE TRAITEMENT/REACTIFS	Transformateur Monophasé	02/07/2007	MURRELEKTRONIK	MEN 20
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Alimentation Eau Brute	pHmètre eau brute	08/10/2007	HACH LANGE	Capteur pHD sc différentiel
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Alimentation Eau Brute	Conductimètre eau brute	08/04/2022	HACH LANGE	Polymetron
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Alimentation Eau Brute	Turbidimètre eau brute	08/10/2007	HACH LANGE	Ultraturb SC
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Alimentation Eau Brute	Débitmètre Forage bache 1000	04/01/2017	ENDRESS HAUSER	PromagL400 5L4C1F
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Alimentation Eau Brute	AFFICHEUR DE MESURES	02/07/2007	HACH LANGE	SC1000 LXG400.99.00041
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Alimentation Eau Brute	Débitmétre forage entrée usine	03/06/2007	ENDRESS HAUSER	50W2H-HDOA1AC4AAA
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Alimentation Eau Brute	Débitmétre arrivée de Cazaux	01/12/2023	ENDRESS HAUSER	50W5H-HDOA1AC0AAAA
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Alimentation Eau Brute	Capteur de température	08/10/2007	HACH LANGE	Combiné au pH mètre
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Alimentation Eau Brute	A FERMER Compteur Forage	08/12/2016		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Alimentation Eau Brute	Colonne de Forage	01/06/2024		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Alimentation Eau Brute	Canalisation Eau Brute Forage	02/07/2007		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Alimentation Eau Brute	Vanne Pneumatique Entrée Usine	27/09/2016	KSB	ISORIA 10 3G6K6XC
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Alimentation Eau Brute	Vanne Pneumatique Entrée Usine	27/09/2016	KSB	SMARTRONIC MA R1310
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Alimentation Eau Brute	Vanne Manuelle Alimentation Eau Brute	02/07/2007	KSB AMRI	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Alimentation Eau Brute	Vanne Forage Entrée Usine	02/07/2007	KSB	Actair 25
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Alimentation Eau Brute	Vanne Manuelle Purge Conduite Alim Forage Entrée Usine	02/07/2007	KSB AMRI	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Alimentation Eau Brute	Vanne Forage Sortie Forage	02/07/2007		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Alimentation Eau Brute	Sonde de Niveau de Nappe	15/07/2023	ENDRESS HAUSER	Waterpilot FMX21
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Alimentation Eau Brute	Pompe	19/12/2019	PLEUGER	PN104-2a+M8-480-2
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Coagulation / Floculation	Agitateur Coagulation	01/06/2022	LUMPP	AGVL1350
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Coagulation / Floculation	pH-mètre Coagulation	08/10/2007	HACH LANGE	Capteur pHD SC différentiel
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Coagulation / Floculation	Bassin de Coagulation	02/07/2007		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Coagulation / Floculation	Afficheur pH-mètre Coagulation	02/07/2007	HACH LANGE	SC60
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Coagulation / Floculation	Pompe Doseuse Coagulant 1	01/06/2018	LEROY SOMER	GA45P4T3LS
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Coagulation / Floculation	Pompe Doseuse Coagulant 2	01/06/2020	DOSAPRO	GA45P4T3LS
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Coagulation / Floculation	Pompe Doseuse Coagulant 3	01/06/2022	LEROY SOMER	GA45P4T3
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Coagulation / Floculation	Agitateur Floculation	01/06/2022	LUMPP	AGVL1350
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Coagulation / Floculation	Bassin de Floculation	01/06/2018		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Coagulation / Floculation	Agitateur Maturation	01/06/2007	LUMPP	AGVL2100
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Décantation	Analyseur de Turbidité	11/04/2022	HACH LANGE	TU5300 SC LXG445.99.B0122
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Décantation	Bassin de Décantation	11/02/2016		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Filtration / Adsorption	Analyseur Turbidité en Sortie Filtre 1	011/06/2018	HACH	LPG415.00.00001
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Filtration / Adsorption	Analyseur Turbidité en Sortie Filtre 2	11/09/2023	HACH	TU 5300 SC
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Filtration / Adsorption	Analyseur Turbidité en Sortie Filtre 3	11/09/2023	HACH	TU 5300 SC
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Filtration / Adsorption	Détecteur trop Plein canal alimentation Filtres	02/07/2007		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Filtration / Adsorption	Poire Défaut Surpresseur Bâche Eau Traitée	01/06/2022		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Filtration / Adsorption	Afficheur de Mesures	02/07/2007	SIEMENS	Multiranger 100
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Filtration / Adsorption	Capteur Pression Entrée Filtre 1	01/06/2018	VEGA	VEGABAR 82
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Filtration / Adsorption	Capteur Pression Entrée Filtre 2	01/06/2018	VEGA	VEGABAR 82
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Filtration / Adsorption	Capteur Pression Entrée Filtre 3	01/06/2018	VEGA	VEGABAR 82

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Filtration / Adsorption	Capteur de Pression de Sortie Filtre 1	01/06/2018	VEGA	VEGABAR 82
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Filtration / Adsorption	Capteur de Pression de Sortie Filtre 2	01/06/2018	VEGA	VEGABAR 82
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Filtration / Adsorption	Capteur de Pression de Sortie Filtre 3	01/06/2018	VEGA	VEGABAR 82
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Filtration / Adsorption	Mesure Niveau Bâche eau de lavage	08/10/2007	SIEMENS	MULTIRANGER 100
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Filtration / Adsorption	Détection passage Eau de Lavage	31/12/2015		821.2
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Filtration / Adsorption	Débitmètre Eau de Lavage	08/10/2007	ENDRESS HAUSER	50W4H-HD0A1AC4AAAA
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Filtration / Adsorption	Sécurité pression Air de Lavage	02/07/2007		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Filtration / Adsorption	Sonde Piézo Niveau Bâche 300	02/07/2007	ENDRESS HAUSER	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Filtration / Adsorption	Vanne papillon d'alimentation F1	01/06/2017	KSB AMRI	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Filtration / Adsorption	Vanne papillon d'alimentation F2	02/07/2007	KSB AMRI	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Filtration / Adsorption	Vanne papillon d'alimentation F3	02/07/2007	KSB AMRI	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Filtration / Adsorption	Vanne de Sortie F1 (PID)	01/06/2018	AMRI	AQUISORIA
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Filtration / Adsorption	Vanne de Sortie F2 (PID)	02/07/2007	AMRI	AQUISORIA
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Filtration / Adsorption	Vanne de Sortie F3 (PID)	02/07/2007	AMRI	AQUISORIA
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Filtration / Adsorption	Vanne Entrée Eau de Lavage F1	01/06/2018	AMRI	AQUISORIA
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Filtration / Adsorption	Vanne Entrée Eau de Lavage F2	02/07/2007	AMRI	AQUISORIA
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Filtration / Adsorption	Vanne Entrée Eau de Lavage F3	02/07/2007	AMRI	AQUISORIA
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Filtration / Adsorption	Vanne Air de Lavage F1	01/06/2018	AMRI	ISORIA
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Filtration / Adsorption	Vanne Air de Lavage F2	02/07/2007	AMRI	ISORIA
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Filtration / Adsorption	Vanne Air de Lavage F3	02/07/2007	AMRI	ISORIA
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Filtration / Adsorption	Vanne Sortie Eau de Lavage F1	01/06/2018	AMRI	AQUISORIA
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Filtration / Adsorption	Vanne Sortie Eau de Lavage F2	02/07/2007	AMRI	AQUISORIA
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Filtration / Adsorption	Vanne Sortie Eau de Lavage F3	02/07/2007	AMRI	AQUISORIA

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Filtration / Adsorption	Vanne Evacuation 1eres Eaux	02/07/2007	AMRI	AQUISORIA
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Filtration / Adsorption	Vanne Grand Débit Lavage	01/06/2018	AMRI	AQUISORIA
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Filtration / Adsorption	Vanne Recirculation Eau Filtrée	02/07/2007	KSB	Actair 100
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Filtration / Adsorption	Vanne Manu Evacuation 1ere Eaux	02/07/2007		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Filtration / Adsorption	Vanne By-Pass Eau de Lavage	02/07/2007		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Filtration / Adsorption	Vanne Isolement Amont Circuit de Lavage	02/07/2007		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Filtration / Adsorption	Vanne Isolement Tranfert / Lavage	02/07/2007	KSB AMRI	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Désinfection	Analyseur de Chlore	21/07/2014	SIEMENS	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Désinfection	Analyseur Turbidité Eau Traitée	11/04/2022	HACH LANGE	TU5300SC LXG445.99.B0122
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Distribution Eau Traitée	Sonde COT	02/07/2007	HACH LANGE	UVAS Sc Plus
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Distribution Eau Traitée	COTmetre B1000	07/11/2017		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Distribution Eau Traitée	Mesure Niveau Bâche 1000	31/12/2015	ENDRESS HAUSER	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Distribution Eau Traitée	Caisson Anti-Bruit	08/04/2016		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Distribution Eau Traitée	Trappe de visite 2	08/04/2016		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Distribution Eau Traitée	Trappe de visite 1	08/04/2016		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Distribution Eau Traitée	Ballon Anti-Bélier Départ Pissens	01/06/2018	CHARLATTE	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Distribution Eau Traitée	Collecteur Refoulement Pissens	08/04/2016		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Distribution Eau Traitée	Collecteur Refoulement Etoile	08/04/2016		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Distribution Eau Traitée	Collecteur de Refoulement La Teste	01/06/2024		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Distribution Eau Traitée	Pompe vers Etoile 1	01/06/2016	FLOWSERVE	QN102-3A+M8-710-Y3
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Distribution Eau Traitée	Pompe vers Etoile 2	02/01/2020	FLOWSERVE	QN102-3A + M8-670-2/Y3
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Distribution Eau Traitée	Pompe vers Golf 1	31/12/2015	FLOWSERVE	QN102-2A + M8-650-2
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Distribution Eau Traitée	Pompe vers Golf 2	06/03/2018	FLOWSERVE	QN102-3A+ M8-670-2

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Distribution Eau Traitée	Pompe vers Pissens 1	03/05/2016	FLOWSERVE	QN102-3A + M8-710 Y3
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Distribution Eau Traitée	Pompe vers Pissens 2	31/12/2015	FLOWSERVE	QN102-3A + M8-710-2/Y3
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Transfert eaux usine	Clapet - Pompe HOPC200	01/06/2024		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Transfert eaux usine	Clapet - Pompe HOPC100	02/07/2007		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Transfert eaux usine	Clapet - Pompe HOPC300	02/07/2007		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Transfert eaux usine	Pompe de Transfert 1	31/12/2015	KSB	AMAREX KRT K300-380/506UG-S
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Transfert eaux usine	Pompe de Transfert 2	14/09/2023	KSB	X KRT K300-400/456UE(
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Transfert eaux usine	Pompe de Transfert 3	24/10/2023	KSB	X KRT K300-400/456UE(
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Transfert eaux usine	Vanne Isolement Pompe HOPC300	02/07/2007	KSB AMRI	Aquisoria 10
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Transfert eaux usine	Vanne Isolement Pompe HOPC100	02/07/2007	KSB AMRI	Aquisoria 10
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Transfert eaux usine	Vanne Répartition HOPC100/200	02/07/2007		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Traitement Chimique (Reminéralisation)	Tuyauterie et Hydraulique Reminéralisation	02/07/2007		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Traitement Chimique (Reminéralisation)	Agitateur cuve ajustement pH	08/10/2007	LUMP	AGVL1200
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Traitement Chimique (Reminéralisation)	pH-mètre ajustement pH	08/10/2007	HACH LANGE	Capteur pHD SC différentiel
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Traitement Chimique (Reminéralisation)	AFFICHEUR pH	02/07/2007	HACH LANGE	SC-200
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Traitement Chimique (Reminéralisation)	Agitateur bâche remise à l'équilibre	08/10/2007	LUMPP	AGVL1100
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Traitement Chimique (Reminéralisation)	pH-mètre Remise à l'Equilibre	02/07/2007		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Traitement Chimique (Reminéralisation)	Agitateur	01/06/2017	LUMPP	AGVL1100
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Traitement Chimique (Reminéralisation)	Turbidimètre sortie actiflo	02/06/2022	HACH LANGE	Ultraturb SC

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Traitement Chimique (Reminéralisation)	Bassin de reminéralisaiton	02/07/2007		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Traitement Chimique (Reminéralisation)	Appareil de Mesure Physique	08/10/2007		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Traitement Chimique (Reminéralisation)	Appareil de Mesure Physique	08/10/2007		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Traitement Chimique (Reminéralisation)	Pompe Prélèvement Eau Actiflo	08/10/2007	LOWARA	BGM3/A
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Poste de Livraison Electricité	Batterie de Condensateurs	13/04/2017		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Poste de Livraison Electricité	Transformateur Triphasé	02/07/2007		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Cuve	31/12/2015		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Ballon de surpression (Hydrofort)	01/06/2017	REFLEX	06G091850291
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Pompe Eau de Service 1	01/06/2018	KSB	VF32-5 / G50A3260CG0027
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Pompe Eau de Service 2	05/05/2020	KSB	VF25/5 - 48228070
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Pompe Eau de Service 3	01/06/2022	KSB	VF32-5 / GS0A3260CG0027
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Coagulant	Débitmètre Coagulant	04/09/2017	ENDRESS HAUSER	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Coagulant	Cuve de Coagulant	15/05/2018	CADIOU INDUSTRIE	Ref: 70165 - 25m3 Pehd noir
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Coagulant	Poire de Niveau Très Haut	02/07/2007		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Coagulant	Sonde de Niveau	02/07/2007	SIEMENS	MULTIRANGER 100
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Chaux Eteinte	Détecteur Niveau Haut/Bas Silo 1	02/07/2007		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Chaux Eteinte	Détecteur Niveau Bas Silo 2	02/07/2007		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Chaux Eteinte	Capteur Poids Silo Chaux 2	02/07/2007	SODIMATE	11-100F
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Chaux Eteinte	Capteur Poids Silo Chaux 1	20/10/2023	SODIMATE	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Chaux Eteinte	Capteur Bourrage Trémie Silo 1	01/06/2018		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Chaux Eteinte	Capteur Bourrage Trémie Silo 2	02/07/2007		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Chaux Eteinte	Vis Doseuse Silo de Chaux 1	31/12/2015		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Chaux Eteinte	Vis Doseuse Silo Chaux 2	01/06/2018		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Chaux Eteinte	Dévouteur Silo Chaux 1	01/06/2024	SODIMATE	DDS40
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Chaux Eteinte	Dévouteur Silo Chaux 1	01/06/2018		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Chaux Eteinte	Dévouteur SIlo Chaux 2	02/06/2007	NORD	SK 71-L/4
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Chaux Eteinte	Filtre Dépoussiéreur Silo Chaux 1	04/08/2014	OLI FRANCE	200/3
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Chaux Eteinte	Filtre Dépoussiéreur Silo Chaux 2	04/08/2014	OLI FRANCE	MVE 200/3
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Chaux Eteinte	Silo Chaux 1	02/07/2007	SODIMATE	DDS400 00M70
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Chaux Eteinte	Silo Chaux 2	02/07/2007	SODIMATE	DDS400 00M40
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Masse filtrante (CAG et sable)	Filtre 1	01/06/2024	JACOBI	o 2000 10x20 neutralisé
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Masse filtrante (CAG et sable)	Filtre 2	18/09/2023	JACOBI	o 2000 10x20 neutralisé
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Masse filtrante (CAG et sable)	Filtre 3	01/06/2024	JACOBI	o 2000 10x20 neutralisé
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	CAP Charbon Actif en Poudre	Capteur Température Silo CAP 1	02/06/2015	ENDRESS HAUSER	L:TR11-EBDHSCG3000 n
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	CAP Charbon Actif en Poudre	Capteur Température Silo CAP 2	02/06/2015	ENDRESS HAUSER	MODEL: FTE30-AA11 n°SERIE J501
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	CAP Charbon Actif en Poudre	Capteur Niveau Haut Silo CAP 1	02/06/2015	ENDRESS HAUSER	Liquifant M
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	CAP Charbon Actif en Poudre	Capteur Niveau Bas SIlo CAP 1	02/06/2015	ENDRESS HAUSER	Liquifant M
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	CAP Charbon Actif en Poudre	Capteur Niveau Haut Silo CAP 2	02/06/2015	ENDRESS HAUSER	Liquifant M
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	CAP Charbon Actif en Poudre	Capteur Niveau Bas Silo CAP 2	02/06/2015	ENDRESS HAUSER	Liquifant M
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	CAP Charbon Actif en Poudre	Capteur Pression Silo CAP 1	02/06/2015		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	CAP Charbon Actif en Poudre	Capteur Pression Silo CAP 2	02/06/2015		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	CAP Charbon Actif en Poudre	Tuyau d'Injection CAP dans Conduite	02/06/2015		Tricoclair 42x32mm

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	CAP Charbon Actif en Poudre	Tuyau Alim Air Comprimé Electrovannes/Décolmatage CAP	02/06/2015		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	CAP Charbon Actif en Poudre	Capteur Bourrage Trémie	02/06/2015	ENDRESS HAUSER	FTL51-2K0U4/0
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	CAP Charbon Actif en Poudre	Capteur Niveau Haut Skid Mouillage	02/06/2015	ENDRESS HAUSER	FTL512K0U4/0
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	CAP Charbon Actif en Poudre	Capteur de Pression Amont Circuit Hydroéjecteur	02/06/2015		MODEL110290 n°SERIE 806504
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	CAP Charbon Actif en Poudre	Appareil de Mesure Physique	02/06/2015		MODEL 110290 n° SERIE 806504
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	CAP Charbon Actif en Poudre	Capteur de Bourrage de Vis	02/06/2015	SODIMATE	BAUX.15
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	CAP Charbon Actif en Poudre	Débitmètre Circuit Hydroéjecteur	02/06/2015		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	CAP Charbon Actif en Poudre	Débitmètre Rinçage Trémie	02/06/2015		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	CAP Charbon Actif en Poudre	Trémie	01/06/2024	SODIMATE	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	CAP Charbon Actif en Poudre	Vanne d'Isolement Aval Hydroéjecteur	01/06/2021	AKO	3009MD024
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	CAP Charbon Actif en Poudre	Vanne d'Isolement Amont Hydroéjecteur	01/06/2021	PARKER	495905C2
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	CAP Charbon Actif en Poudre	Vanne Rinçage Latéral Trémie	02/06/2015	PARKER	495905C2
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	CAP Charbon Actif en Poudre	Vis Doseuse Silo CAP 1	02/06/2015	SEW USOCOME	II2GD EDRS71S4/3GD/K
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	CAP Charbon Actif en Poudre	Vis Doseuse Silo CAP 2	02/06/2015	SEW USOCOME	II2GD EDRS71S4/3GD/K
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	CAP Charbon Actif en Poudre	Dévouteur Silo CAP 1	02/06/2015	SEW USOCOME	II2GD EDRS71S4/3GD/K
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	CAP Charbon Actif en Poudre	Dévouteur Silo CAP 2	02/06/2015	SEW USOCOME	II2GD EDRS71S4/3GD/K
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	CAP Charbon Actif en Poudre	Dépoussiéreur Silo CAP 1	02/06/2015	WAM	01FN140009602
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	CAP Charbon Actif en Poudre	Dépoussiéreur Silo CAP 2	02/06/2015	WAM	01FN140001940
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	CAP Charbon Actif en Poudre	Silo CAP 1	02/06/2015	SODIMATE	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	CAP Charbon Actif en Poudre	Silo CAP 2	02/06/2015	SODIMATE	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	CAP Charbon Actif en Poudre	Trappe à Explosion Silo CAP 1	02/06/2015	SODIMATE	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	CAP Charbon Actif en Poudre	Trappe à Explosion Silo CAP 2	02/06/2015	SODIMATE	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	CAP Charbon Actif en Poudre	Bouteille 1 Silo 1	location	AIR LIQUIDE	Bouteille azote
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	CAP Charbon Actif en Poudre	Bouteille 2 Silo 1	location	AIR LIQUIDE	Bouteille azote
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	CAP Charbon Actif en Poudre	Bouteille 1 Silo 2	location	AIR LIQUIDE	Bouteille azote
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	CAP Charbon Actif en Poudre	Bouteille 2 Silo 2	location	AIR LIQUIDE	Bouteille azote
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	CAP Charbon Actif en Poudre	Tuyauterie Alimentation en Azote	02/06/2015	AIR LIQUIDE	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	CAP Charbon Actif en Poudre	Détendeur Azote	02/06/2015	AIR LIQUIDE	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	CAP Charbon Actif en Poudre	Vanne Inertage Silo CAP1 Bas	02/06/2015	BURKERT	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	CAP Charbon Actif en Poudre	Vanne Inertage Silo CAP1 Haut	02/06/2015	BURKET	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	CAP Charbon Actif en Poudre	Vanne Inertage Silo CAP2 Haut	02/06/2015	BURKERT	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	CAP Charbon Actif en Poudre	Vanne Inertage Silo CAP1 Bas	02/06/2015	BURKERT	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Chlore Gazeux (stockage)	Armoire de Stockage	01/01/2017	PROMINENT	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Dioxyde de Carbone	Pompe Injection CO2	02/07/2007	ETABLOC	CN050-160/1102
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Dioxyde de Carbone	Réchauffeur	02/07/2007	AIR LIQUIDE	Carbovapor A1-120
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Dioxyde de Carbone	Vanne de Détente CO2	11/05/2020	BROOK CRAMPTON	SLA5853S
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Dioxyde de Carbone	Vanne d'Isolement Aval Circuit Eau CO2	02/07/2007	KSB AMRI	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Dioxyde de Carbone	Vanne d'Isolement Aval Circuit Eau CO2	02/07/2007	KSB AMRI	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Dioxyde de Carbone	Vanne d'Isolement Amont Circuit Eau CO2	02/07/2007	KSB AMRI	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Dioxyde de Carbone	Cuve de CO2	02/07/2007	AIR LIQUIDE	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Dioxyde de Carbone	Capteur de Pression Cuve CO2	31/12/2015	AIR LIQUIDE	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Chaux	Conductimètre Eau de Chaux	31/12/2015	LANGE	SC-60 LXV403.99.00001
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Chaux	Débitmètre Eau de Chaux vers Ajustement	04/09/2017	ENDRESS HAUSER	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Chaux	Débitmètre EdC vers Remise à l'Equilibre	04/09/2017	ENDRESS HAUSER	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Chaux	Détecteur Niveau Très Bas Stockage Eau de Chaux	31/12/2015		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Chaux	Mesure Niveau Stockage Eau de Chaux	31/12/2015	SIEMENS	7ML50331BA001A
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Chaux	Pompe Doseuse Eau de Chaux Ajustement 1	23/09/2020	SEEPEX	BN17-6LS
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Chaux	Pompe Doseuse Eau de Chaux Ajustement 2	01/06/2023	SEEPEX	BN17-6LS
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Chaux	Pompe Doseuse Eau de Chaux Ajustement 3	01/06/2024	SEEPEX	BN17-6LS
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Chaux	Pompe Doseuse Eau de Chaux à l'Equilibre 1	01/06/2018	SEEPEX	BN10-6LS 35011190
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Chaux	Pompe Doseuse Eau de Chaux à l'Equilibre 2	11/02/2022	SEEPEX	BN10-6LS
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Chaux	Vanne PIC Isolement Eau de Chaux Ajustement	31/12/2015	AKO	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Chaux	Vanne PIC Isoelement Eau de Chaux vers Equilibre	31/12/2015	AKO	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Chaux	Vanne Manuelle Asp Pompe Ajustement 1	01/06/2018	AKO	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Chaux	Vanne Manuelle Asp Pompe Ajustement 2	01/06/2018	AKO	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Chaux	Vanne Manuelle Asp Pompe Ajustement 3	01/06/2018	AKO	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Chaux	Vanne Manuelle Isolement Eau de Chaux Ajustement	02/07/2007		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Chaux	Vanne Manuelle Isolement Eau de Chaux vers Equilibre	02/07/2007		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Chaux	Vanne Rinçage Aspiration Pompes Eau de Chaux Ajustement	02/07/2007	BURKERT	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Chaux	Vanne de Rinçage Refoulement Pompes Eau de Chaux	02/07/2007	BURKERT	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Chaux	Vanne Rinçage Aspiration Pompes Eaux de Chaux vers Equilibre	02/07/2007	BURKERT	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Chaux	Vanne Rinçage Refoulement Pompes Eau de Chaux vers Equilibre	02/07/2007	BURKERT	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Chaux	Vanne Manuelle Aspiration Equilibre 1	02/07/2007		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Chaux	Vanne Manuelle Aspiration Equilibre 2	02/07/2007		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Chaux	Agitateur Saturateur	31/12/2015	LUMPP	AGVL600
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Chaux	Agitateur Saturateur	02/07/2007	FLENDER	ZF48M90L4W

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Chaux	Saturateur Eau de Chaux	02/07/2007	OTV	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Chaux	Vanne Manuelle Vidange Prépa Saturateur	02/07/2007	AKO	BSV 065.03.50
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Chaux	Vanne Manuelle Vidange Saturateur	02/07/2007	AKO	BSV 065.03.50
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Chaux	Vanne Manuelle Purge	02/07/2007	AKO	BSV 065.03.50
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Chaux	Vanne Eau de Service Saturateur	02/07/2007	AMRI	AQUISORIA
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Chaux	Vanne Eau de Service Saturateur	02/07/2007	AMRI KSB	Actair 3 R1120
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Chaux	Vanne Eau de Service Saturateur	02/07/2007	AMRI KSB	Amtronic 1300
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Chaux	Vanne PIC Vidange Saturateur	02/07/2007	AKO	VF065.3X.33.3LA
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Chaux	Pompe Recirculation Boues de Chaux	01/06/2017	SEEPEX	BN2-12S 311011190
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Javel	Analyseur de Chlore Bâche 300	31/12/2015	PROMINENT	Dulcometer D1C
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Javel	Pompe de Prélèvement Eau Traitée	31/12/2015	LOWARA	'A DE GARDEN + SM63B
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Javel	Analyseur de Chlore Bâche 1000	02/07/2007	SIEMENS	Depolox 5
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Javel	Pompe Doseuse 1	01/01/2017	PROMINENT	DLTA0730PVT2000UA0030FR0
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Javel	Pompe Doseuse 2	01/01/2017	PROMINENT	DLTA0730PVT2000UA0030FR0
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Javel	Canne d'Injection	01/01/2017		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Javel	Pompe Doseuse 1	01/01/2017	PROMINENT	DLTA0730PVT2000UA0030FR0
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Javel	Pompe Doseuse 2	01/01/2017	PROMINENT	DLTA0730PVT2000UA0030FR0
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Javel	Cuve de Rétention Commune	01/01/2017	STOCKAGE & SYSTEMES	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Javel	Cuve 1	02/07/2007	STOCKAGE & SYSTEMES	EN 12573-2
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Javel	Cuve 2	01/01/2017	STOCKAGE & SYSTEMES	EN 12573-2
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Javel	Détecteur Cuve 1 Niveau Haut	28/07/2017		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Javel	Détecteur Cuve 1 Niveau Bas	28/07/2017		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Javel	Détecteur Cuve 1 Niveau Très Bas	28/07/2017		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Javel	Détecteur Cuve 2 Niveau Très Bas	28/07/2017		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Javel	Détecteur Cuve 2 Niveau Bas	28/07/2017		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Javel	Détecteur Cuve 2 Niveau Haut	28/07/2017		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Javel	Sonde de Niveau Cuve 1	28/07/2017		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Eau de Javel	Sonde de Niveau Cuve 2	28/07/2017		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Lait de Chaux	Détecteur Niveau Très Bas Cuve Lait de Chaux	01/06/2012	BAMO	BSM500
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Lait de Chaux	Détecteur Niveau Haut Cuve Lait de Chaux	01/06/2012	BAMO	BSM500
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Lait de Chaux	Détecteur Niveau Bas Cuve Lait de Chaux	01/06/2012	BAMO	BSM500
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Lait de Chaux	Débitmètre Lait de Chaux Reminéralisation	01/06/2021	ENDRESS HAUSER	50P15-EA0A1AA0AAA A
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Lait de Chaux	Débitmètre Lait de Chaux Saturateur	01/06/2022	ENDRESS HAUSER	PROMAG W 400 DN 25
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Lait de Chaux	Pompe Lait de Chaux vers Reminéralisation 3	08/02/2022	SEEPEX	BN 1-12
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Lait de Chaux	Pompe Lait de Chaux vers Reminéralisation 1	13/07/2017	SEEPEX	BN 1-12
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Lait de Chaux	Pompe Lait de Chaux vers Reminéralisation 2	15/01/2015	SEEPEX	BN 1-12
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Lait de Chaux	Pompe Lait de Chaux vers Saturateur 1	01/09/2017	SEEPEX	BN2-12S 33511190
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Lait de Chaux	Pompe Lait de Chaux vers Saturateur 2	01/07/2017	SEEPEX	BN2-12S 33511190
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Lait de Chaux	Vanne Rinçage Aspiration Pompes Lait de Chaux	30/03/2022	AKO	81-LAITONG3/4-DN20-2
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Lait de Chaux	Vanne Rinçage Refoulement Pompes Lait de Chaux	30/03/2022	AKO	EV-A10,0-BBMSGM82-6-
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Lait de Chaux	Vanne Accompagnement Pompe GSPV400	30/03/2022	BURKERT	13-LAITONG3/8-DN10-2
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Lait de Chaux	Vanne Accompagnement Pompe GSPV410	30/03/2022	BURKERT	EV-A10,0-BBMSGM82-6-
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Lait de Chaux	Vanne Accompagnement Pompe GSPV420	30/03/2022	BURKERT	EV-A10,0-BBMSGM82-6-
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Lait de Chaux	Vanne PIC Isolement Amont Lait de Chaux	30/03/2022	AKO	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Lait de Chaux	Agitateur Lait de Chaux	01/06/2017	SIEMENS	2KJ3101-1CH11-2FM1 -Z

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Lait de Chaux	Cuve de Préparation	02/07/2007		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Lait de Chaux	Vanne PIC Isolement Amont Lait de Chaux Saturateur	30/03/2022	AKO	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Lait de Chaux	Vanne Injection Eau dans Cuve Lait de Chaux	31/12/2015	BURKERT	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Lait de Chaux	Vanne Rinçage Amont Lait de Chaux Saturateur	30/03/2022	BURKERT	81-LAITONG3/4-DN20-2
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Lait de Chaux	Vanne Rinçage Aval Lait de Chaux Saturateur	30/03/2022	BURKERT	81-LAITONG3/4-DN20-2
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Lait de Chaux	Electrovanne Accompagnement Pompe GSPV500	30/03/2022	BURKERT	EV-A10,0-BBMSGM82-6-
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Lait de Chaux	Electrovanne Accompagnement Pompe GSPV510	30/03/2022	BURKERT	13-LAITONG3/8-DN10-2
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Lait de Chaux	Cuve Lait de Chaux	31/12/2015	SODIMATE	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Micro-Sable pour Traitement Physico-Chimique	Détecteur Niveau Très Bas Cuve Microsable	02/07/2007	BAMO	54/430
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Micro-Sable pour Traitement Physico-Chimique	Détecteur Niveau Bas Cuve Prépa Microsable	02/07/2007	BAMO	54/430
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Micro-Sable pour Traitement Physico-Chimique	Détecteur Niveau Haut Cuve Prépa Microsable	02/07/2007	BAMO	54/430
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Micro-Sable pour Traitement Physico-Chimique	Vanne Alimentation Eau Micro Sable	01/12/2022	BURKERT	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Micro-Sable pour Traitement Physico-Chimique	Agitateur Microsable	02/07/2007	LUMPP	ZF38-M80S4
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Micro-Sable pour Traitement Physico-Chimique	Convoyeur / Transporteur Microsable	01/06/2024	SODIMATE	DMR40
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Micro-Sable pour Traitement Physico-Chimique	Vis Doseuse Microsable	01/06/2024	SODIMATE	DMR40
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Micro-Sable pour Traitement Physico-Chimique	Pompe de Soutirage du Micro Sable	02/07/2007	SHABAVER	C40
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Micro-Sable pour Traitement Physico-Chimique	Plateau Vibreur	31/12/2015	SODIMATE	MVE200-3
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Micro-Sable pour Traitement Physico-Chimique	Vanne d'Isolement PIC Microsable	01/12/2022	AKO	AKO - Electrovanne Air BURKE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Micro-Sable pour Traitement Physico-Chimique	Vanne d'Injection	31/12/2015	BURKERT	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Micro-Sable pour Traitement Physico-Chimique	Vanne Rinçage Circuit Microsable	02/07/2007	BURKERT	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Micro-Sable pour Traitement Physico-Chimique	Hydrocyclone Gauche	02/07/2007		MOSLEY 400
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Micro-Sable pour Traitement Physico-Chimique	Hydrocyclone Droite	02/07/2007		MOSLEY 400
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Micro-Sable pour Traitement Physico-Chimique	Pompe Recirculation Microsable 1	01/12/2022	SHABAVER	C40 COHAO40SBNJ11CAQ
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Micro-Sable pour Traitement Physico-Chimique	Pompe Recirculation Microsable 2	01/12/2022	SHABAVER	C40 96C0HA040SBNJ11CAQ
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Micro-Sable pour Traitement Physico-Chimique	Pompe Recirculation Microsable 3	01/12/2022	SHABAVER	C40 96C0HA040SBNJ11CAQ
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Micro-Sable pour Traitement Physico-Chimique	Vanne Aspiration Microsable 1	15/09/2016	AKO	OV 080.03.30M
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Micro-Sable pour Traitement Physico-Chimique	Vanne Aspiration Microsable 2	01/06/2019	AKO	BSV 080.03.30C
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Micro-Sable pour Traitement Physico-Chimique	Vanne Refoulement Injection Microsable	01/06/2016	AKO	BSV 080.03.30C
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Micro-Sable pour Traitement Physico-Chimique	Vanne Refoulement Microsable 1	01/06/2022	AKO	BSV 080.03.30C
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Micro-Sable pour Traitement Physico-Chimique	Vanne Aspiration Microsable 4	01/06/2022	AKO	BSV 080.03.30C
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Micro-Sable pour Traitement Physico-Chimique	Vanne Refoulement Microsable 4	02/07/2007	AKO	BSV 080.03.30C
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Micro-Sable pour Traitement Physico-Chimique	Vanne Refoulement Microsable 3	01/06/2022	AKO	BSV 080.03.30C
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Micro-Sable pour Traitement Physico-Chimique	Vanne Refoulement Microsable 2	01/06/2022	AKO	BSV 080.03.30C
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Micro-Sable pour Traitement Physico-Chimique	Vanne Aspiration Microsable 3	02/07/2007	AKO	BSV 080.03.30C

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Micro-Sable pour Traitement Physico-Chimique	Vanne Rinçage Presse Etoupe	02/07/2007	BURKERT	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Micro-Sable pour Traitement Physico-Chimique	Vanne Rinçage Presse Etoupe	02/07/2007	BURKERT	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Micro-Sable pour Traitement Physico-Chimique	Vanne Rinçage Presse Etoupe	02/07/2007	BURKERT	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Ozone	CAPTEUR D'OZONE	31/12/2015	WEDECO	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Ozone	ANALYSEUR D'O3 RESIDUEL	02/07/2007	WALLACE ET TIERNAN	Depolox 4
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Ozone	CAPTEUR POINT DE ROSE	01/06/2021		EA2-TX-100-HD
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Ozone	DEBITMETRE D'OZONE	01/06/2024	ABB	AM54 031
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Ozone	Ballon de Régulation	02/07/2007		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Ozone	Pompe Circuit Refroidissement Ozoneur 1	02/07/2007	LOWARA	LLM90CA/322
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Ozone	Pompe Circuit Refroidissement Ozoneur 2	02/07/2007	LOWARA	LLM90CA/322
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Ozone	Vanne d'Injection d'Eau de Refroidissement	02/06/2020	BURKET	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Ozone	Poreux de diffusion	18/06/2018	WEDECO	Poreux DPP350 PVC Moule R 3
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Ozone	Destructeur d'Ozone	02/07/2007	TRAILIGAZ	DTC 100
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Ozone	Ozoneur	02/07/2007	WEDECO	SMA 500 S
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Ozone	Tubes de Verre Ozoneur	19/04/2016		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Ozone	Transformateur Triphasé	31/12/2015		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Ozone	Electrovanne de Fonctionnement Ozoneur	31/12/2015	NORGREN	0000000.8406
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Polymère Vers Actiflo	Débitmètre	04/09/2017		
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Polymère Vers Actiflo	Pompe Doseuse Polymère Actiflo1	01/06/2017	SEEPEX	HKFS5/1 1/4.92
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Polymère Vers Actiflo	Pompe Doseuse Polymère Actiflo 2	01/06/2018	SEEPEX	MD025-6L 32510370
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Polymère Vers Actiflo	Pompe Doseuse Polymère Actiflo 3	01/06/2019	SEEPEX	MD025-6L 32510370

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Polymère Vers Actiflo	Agitateur 1	01/06/2017	ALMO TECHNOLOGIE	MTA 80 G8
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Polymère Vers Actiflo	Agitateur 2	01/06/2017	ALMO TECHNOLOGIE	MTA80G8
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Polymère Vers Actiflo	Centrale Polymère vers Actiflo	31/12/2015	MILTON ROY	POLYPACK AP 925
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Polymère Vers Saturateur	Pompe Doseuse Polymère Saturateur 1	31/12/2015	MILTON ROY	MS5622
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Polymère Vers Saturateur	Pompe Doseuse Polymère Saturateur 2	02/07/2007	MILTON ROY	CEGA25V4H3
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Polymère Vers Saturateur	Pompe Doseuse Polymère Saturateur 2	02/07/2007	MILTON ROY	
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Polymère Vers Saturateur	Soupape de Décharge	19/05/2022	LA ROBINETTERIE Industrielle	11T03/8M71S3
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Polymère Vers Saturateur	Soupape de Décharge	19/05/2022	LA ROBINETTERIE Industrielle	11T03/8M71S3
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Polymère Vers Saturateur	Agitateur	02/07/2007	MILTON ROY	VDA2110S035
UPR - La Teste de Buch - CABARET DES PINS	Polymère Vers Saturateur	Centrale Polymère vers Saturateur	02/07/2007	MILTON ROY	POLYPACK AP925
EDE - Le Teich - PROTECTION CATHODIQUE					
EDE - Le Teich - PROTECTION CATHODIQUE	Protection cathodique	Protection cathodique	01/06/2018		
CPT Balanos					
CPT Balanos	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Support de Télétransmission	01/09/2022	SOFREL	LS FLOW DL4W-LP
CPT Balanos	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Canalisation / Tuyauterie	31/12/2015		
CPT Balanos	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Débitmètre	01/09/2022	KROHNE	WATERFLUX 3000
CPT Bordeaux					
CPT Bordeaux	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Support de Télétransmission	01/06/2024	SOFREL	DL4W
CPT Bordeaux	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Canalisation / Tuyauterie	31/12/2015		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

CPT Bordeaux	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Débitmètre	01/06/2024	WATERFLUX 3070 F	KROHNE
CPT Industrie					
CPT Industrie	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Support de Télétransmission	02/09/2014	SOFREL	LS42 EA SMS
CPT Industrie	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Canalisation / Tuyauterie	31/12/2015		
CPT Industrie	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Débitmètre	02/09/2014	ABB	AquaMaster
CPT Communal					
CPT Communal	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Support de Télétransmission	01/10/2022	SOFREL	LS FLOW DL4W-LP
CPT Communal	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Canalisation / Tuyauterie	31/12/2015		
CPT Communal	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Débitmètre	01/10/2022	KROHNE	WATERFLUX 3070 F
CPT Cote d'Argent					
CPT Cote d'Argent	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Support de Télétransmission	01/10/2022	SOFREL	LS FLOW DL4W-LP
CPT Cote d'Argent	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Canalisation / Tuyauterie	31/12/2015		
CPT Cote d'Argent	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Débitmètre	01/10/2022	KROHNE	WATERFLUX 3070 F
CPT Daney (sur S500 passerelle)					
CPT Daney (sur S500 passerelle)	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Support de Télétransmission	01/06/2020	SOFREL	CARTE DI SUR S500 PASSERELLE
CPT Daney (sur S500 passerelle)	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Canalisation / Tuyauterie	31/12/2015		
CPT Daney (sur S500 passerelle)	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Débitmètre	04/09/2014	ABB	AquaMaster
CPT Desbiey					
CPT Desbiey	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Support de Télétransmission	01/12/2023	SOFREL	LS FLOW DL4W-LP

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

CPT Desbiey	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Canalisation / Tuyauterie	31/12/2015		
CPT Desbiey	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Débitmètre	01/12/2023	KROHNE	WATERFLUX 3070 F
CPT Dignac					
CPT Dignac	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Support de Télétransmission	05/12/2023	SOFREL	LS FLOW DL4W-LP
CPT Dignac	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Canalisation / Tuyauterie	31/12/2015		
CPT Dignac	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Débitmètre	05/12/2023	KROHNE	WATERFLUX 3070 F
CPT lavoir					
CPT lavoir	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Support de Télétransmission	11/12/2023	SOFREL	LS FLOW DL4W-LP
CPT lavoir	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Canalisation / Tuyauterie	31/12/2015		
CPT lavoir	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Débitmètre	11/12/2023	KROHNE	WATERFLUX 3070 F
CPT Leclerc					
CPT Leclerc	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Support de Télétransmission	01/09/2023	SOFREL	LS FLOW DL4W-LP
CPT Leclerc	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Canalisation / Tuyauterie	31/12/2015		
CPT Leclerc	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Débitmètre	01/09/2023	KROHNE	WATERFLUX 3070 F
CPT Mariolan					
CPT Mariolan	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Support de Télétransmission	01/09//23	SOFREL	LS FLOW DL4W-LP
CPT Mariolan	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Canalisation / Tuyauterie	31/12/2015		
CPT Mariolan	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Débitmètre	01/09/2023	KROHNE	WATERFLUX 3070 F
CPT Moulin Rouge					

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

CPT Moulin Rouge	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Support de Télétransmission	01/09//23	SOFREL	LS FLOW DL4W-LP
CPT Moulin Rouge	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Canalisation / Tuyauterie	31/12/2015		
CPT Moulin Rouge	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Débitmètre	01/09//23	KROHNE	WATERFLUX 3070 F
CPT Mozart					
CPT Mozart	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Support de Télétransmission	01/06/2024	SOFREL	DL4W
CPT Mozart	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Canalisation / Tuyauterie	31/12/2015		
CPT Mozart	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Débitmètre	01/06/2024	KROHNE	WATERFLUX 3070F
CPT Point Canal (fragon)					
CPT Point Canal (fragon)	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Support de Télétransmission	01/09//23	SOFREL	LS FLOW DL4W-LP
CPT Point Canal (fragon)	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Canalisation / Tuyauterie	31/12/2015		
CPT Point Canal (fragon)	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Débitmètre	01/09//23	KROHNE	WATERFLUX 3070 F
CPT Pôle Santé					
CPT Pôle Santé	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Support de Télétransmission	01/09//23	SOFREL	LS FLOW DL4W-LP
CPT Pôle Santé	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Canalisation / Tuyauterie	31/12/2015		
CPT Pôle Santé	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Débitmètre	01/09//23	KROHNE	WATERFLUX 3070 F
CPT Tassigny					
CPT Tassigny	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Support de Télétransmission	01/07/2014	SOFREL	LS42 SMS
CPT Tassigny	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Canalisation / Tuyauterie	31/12/2015		
CPT Tassigny	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Débitmètre	01/07/2014	ABB	AquaMaster

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

CPT Verdun					
CPT Verdun	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Support de Télétransmission	01/06/2024	SOFREL	DL4W
CPT Verdun	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Canalisation / Tuyauterie	31/12/2015		
CPT Verdun	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Débitmètre	01/06/2024	KROHNE	WATERFLUX 3070 F
CPT Nezer					
CPT Nezer	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Support de Télétransmission	08/09/2014	SOFREL	LS42 EA SMS
CPT Nezer	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Canalisation / Tuyauterie	31/12/2015		
CPT Nezer	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Débitmètre	08/09/2014	ABB	AquaMaster FET412BB1
CPT Villemarie					
CPT Villemarie	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Support de Télétransmission	01/06/2024	SOFREL	DL4W
CPT Villemarie	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Canalisation / Tuyauterie	31/12/2015		
CPT Villemarie	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Débitmètre	01/06/2024	KROHNE	Waterflux 3070 F
CPT Etoile 1 (DN300)(sur S500 Etoile)					
CPT Etoile 1 (DN300)(sur S500 Etoile)	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Canalisation / Tuyauterie	31/12/2015		
CPT Etoile 1 (DN300)(sur S500 Etoile)	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Débitmètre	08/07/2014	HYDREKA	HydrINS II
CPT Etoile 2 (DN500)(sur Etoile)					
CPT Etoile 2 (DN500)(sur Etoile)	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Canalisation / Tuyauterie	31/12/2015		
CPT Etoile 2 (DN500)(sur Etoile)	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Débitmètre	05/07/2023	HYDREKA	HydrINS II
CPT Gambetta					

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

CPT Gambetta	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Support de Télétransmission	01/06/2024	SOFREL	DL4W
CPT Gambetta	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Canalisation / Tuyauterie	31/12/2015		
CPT Gambetta	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Débitmètre	01/06/2024	KROHNE	
CPT Pissens 1 (DN600)(sur S500 pissens)					
CPT Pissens 1 (DN600)(sur S500 pissens)	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Canalisation / Tuyauterie	31/12/2015		
CPT Pissens 1 (DN600)(sur S500 pissens)	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Débitmètre	08/07/2014	HYDREKA	HydrINS II
CPT Pissens 2 (DN250)(sur S500 Pissens)	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Canalisation / Tuyauterie	31/12/2015		
CPT Pissens 2 (DN250)(sur S500 Pissens)	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Débitmètre	28/11/2014	HYDREKA	Mini Hydrins
CPT Etoile pied réservoir (DN500)(sur Etoile)					
CPT Etoile pied réservoir (DN500)(sur Etoile)	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Canalisation / Tuyauterie	31/12/2015		
CPT Etoile pied réservoir (DN500)(sur Etoile)	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Débitmètre remplissage	09/09/2014	HYDREKA	HydrINS 2
CPT Etoile pied réservoir (DN500)(sur Etoile)	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Débitmètre vers La teste	09/09/2014	HYDREKA	sonde
CPT Etoile pied réservoir (DN500)(sur Etoile)	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Débitmètre vers Arcachon	09/09/2014	HYDREKA	transmetteur
Purge - EDE - La Teste de Buch - LE PETIT NICE					
Purge - EDE - La Teste de Buch - LE PETIT NICE	Unité de Contrôle / Commande	Contacteur / Programmateur	22/12/2016		HUNTER
Purge - EDE - La Teste de Buch - LE PETIT NICE	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Compteur	22/12/2016		
Purge - EDE - La Teste de Buch - LE PETIT NICE	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Regard	22/12/2016		
Purge - EDE - La Teste de Buch - LE PETIT NICE	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Electrovanne de Purge	22/12/2016		HUNTER/NODE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Purge - EDE - La Teste de Buch - LA SALIE					
Purge - EDE - La Teste de Buch - LA SALIE	Unité de Contrôle / Commande	Contacteur / Programmateur	22/12/2016		HUNTER
Purge - EDE - La Teste de Buch - LA SALIE	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Compteur	22/12/2016		
Purge - EDE - La Teste de Buch - LA SALIE	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Regard	22/12/2016		
Purge - EDE - La Teste de Buch - LA SALIE	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Electrovanne de Purge	22/12/2016		HUNTER/NODE
EDE - Arcachon - SONDE KAPTA CENTRE DIALYSE					
EDE - Arcachon - SONDE KAPTA CENTRE DIALYSE	Unité de Contrôle / Commande	Sonde de Mesure	20/12/2016	BIRDZ	ENDETEC Sonde KAPTA 3000- AC4
EDE - Arcachon - SONDE KAPTA CENTRE DIALYSE	Unité de Contrôle / Commande	Câbles de liaison	17/01/2017	BIRDZ	
EDE - Arcachon - SONDE KAPTA CENTRE DIALYSE	Unité de Contrôle / Commande	Émetteur GSM	20/12/2016	BIRDZ	GSM
EDE - Arcachon - SONDE KAPTA CENTRE DIALYSE	Maillage Eau	Collier de Prise en Charge	17/01/2017		
EDE - Arcachon - SONDE KAPTA CENTRE DIALYSE	Maillage Eau	Vanne d'Isolement	17/01/2017		
EDE - La Teste de Buch - SONDE KAPTA HOPITAL					
EDE - La Teste de Buch - SONDE KAPTA HOPITAL	Unité de Contrôle / Commande	Sonde de Mesure	20/12/2016	BIRDZ	ENDETEC Sonde KAPTA 3000- AC4
EDE - La Teste de Buch - SONDE KAPTA HOPITAL	Unité de Contrôle / Commande	Câbles de liaison	17/01/2017	BIRDZ	
EDE - La Teste de Buch - SONDE KAPTA HOPITAL	Unité de Contrôle / Commande	Émetteur GSM	20/12/2016	BIRDZ	GSM
EDE - La Teste de Buch - SONDE KAPTA HOPITAL	Maillage Eau	Collier de Prise en Charge	17/01/2017		
EDE - La Teste de Buch - SONDE KAPTA HOPITAL	Maillage Eau	Vanne d'Isolement	17/01/2017		
EDE - Gujan Mestras - SONDE KAPTA CESAREE					
EDE - Gujan Mestras - SONDE KAPTA CESAREE	Unité de Contrôle / Commande	Sonde de Mesure	20/12/2016	BIRDZ	ENDETEC KAPTA 3000-AC4
EDE - Gujan Mestras - SONDE KAPTA CESAREE	Unité de Contrôle / Commande	Câbles de liaison	17/01/2017	BIRDZ	
EDE - Gujan Mestras - SONDE KAPTA CESAREE	Unité de Contrôle / Commande	Émetteur GSM	20/12/2016	BIRDZ	GSM
EDE - Gujan Mestras - SONDE KAPTA CESAREE	Maillage Eau	Collier de Prise en Charge	17/01/2017		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

EDE - Gujan Mestras - SONDE KAPTA CESAREE	Maillage Eau	Vanne d'Isolement	17/01/2017		
EDE - Le Teich - SONDE KAPTA CENTRE VALORISATION					
EDE - Le Teich - SONDE KAPTA CENTRE VALORISATION	Unité de Contrôle / Commande	Sonde de Mesure	20/12/2016	BIRDZ	ENDETEC KAPTA 3000-AC4
EDE - Le Teich - SONDE KAPTA CENTRE VALORISATION	Unité de Contrôle / Commande	Câbles de liaison	17/01/2017	BIRDZ	
EDE - Le Teich - SONDE KAPTA CENTRE VALORISATION	Unité de Contrôle / Commande	Émetteur GSM	20/12/2016	BIRDZ	GSM
EDE - Le Teich - SONDE KAPTA CENTRE VALORISATION	Maillage Eau	Collier de Prise en Charge	17/01/2017		
EDE - Le Teich - SONDE KAPTA CENTRE VALORISATION	Maillage Eau	Vanne d'Isolement	17/01/2017		
EDE - Gujan Mestras - SONDE KAPTA LA HUME					
EDE - Gujan Mestras - SONDE KAPTA LA HUME	Unité de Contrôle / Commande	Sonde de Mesure	20/12/2016	BIRDZ	ENDETEC KAPTA 3000 - AC4
EDE - Gujan Mestras - SONDE KAPTA LA HUME	Unité de Contrôle / Commande	Câbles de liaison	17/01/2017	BIRDZ	
EDE - Gujan Mestras - SONDE KAPTA LA HUME	Unité de Contrôle / Commande	Émetteur GSM	20/12/2016	BIRDZ	GSM
EDE - Gujan Mestras - SONDE KAPTA LA HUME	Maillage Eau	Collier de Prise en Charge	17/01/2017		
EDE - Gujan Mestras - SONDE KAPTA LA HUME	Maillage Eau	Vanne d'Isolement	17/01/2017		
Purge - EDE - Arcachon - THEOPHILE GAUTIER					
Purge - EDE - Arcachon - THEOPHILE GAUTIER	Unité de Contrôle / Commande	Contacteur / Programmateur	03/07/2017		
Purge - EDE - Arcachon - THEOPHILE GAUTIER	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Compteur	03/07/2017		
Purge - EDE - Arcachon - THEOPHILE GAUTIER	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Regard	03/07/2017		
Purge - EDE - Arcachon - THEOPHILE GAUTIER	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Electrovanne de Purge	03/07/2017		
Purge - EDE - Gujan Mestras - ROUTE DES LACS					

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Purge - EDE - Gujan Mestras - ROUTE DES LACS	Unité de Contrôle / Commande	Contacteur / Programmateur	03/07/2017		
Purge - EDE - Gujan Mestras - ROUTE DES LACS	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Compteur	03/07/2017		
Purge - EDE - Gujan Mestras - ROUTE DES LACS	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Regard	03/07/2017		
Purge - EDE - Gujan Mestras - ROUTE DES LACS	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Electrovanne de Purge	03/07/2017		
Purge - EDE - La Teste de Buch - Plage LAOUGA CAZAUX					
Purge - EDE - La Teste de Buch - Plage LAOUGA CAZAUX	Unité de Contrôle / Commande	Contacteur / Programmateur	03/07/2017		
Purge - EDE - La Teste de Buch - Plage LAOUGA CAZAUX	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Compteur	03/07/2017		
Purge - EDE - La Teste de Buch - Plage LAOUGA CAZAUX	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Regard	03/07/2017		
Purge - EDE - La Teste de Buch - Plage LAOUGA CAZAUX	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Electrovanne de Purge	03/07/2017		
Purge - EDE - Le Teich - LAMOTHE					
Purge - EDE - Le Teich - LAMOTHE	Unité de Contrôle / Commande	Contacteur / Programmateur	03/07/2017		
Purge - EDE - Le Teich - LAMOTHE	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Compteur	03/07/2017		
Purge - EDE - Le Teich - LAMOTHE	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Regard	03/07/2017		
Purge - EDE - Le Teich - LAMOTHE	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Electrovanne de Purge	03/07/2017		
Purge - EDE - Gujan Mestras - LAC de MAGDELEINE					
Purge - EDE - Gujan Mestras - LAC de MAGDELEINE	Unité de Contrôle / Commande	Contacteur / Programmateur	03/07/2017		
Purge - EDE - Gujan Mestras - LAC de MAGDELEINE	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Compteur	03/07/2017		
Purge - EDE - Gujan Mestras - LAC de MAGDELEINE	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Regard	03/07/2017		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Purge - EDE - Gujan Mestras - LAC de MAGDELEINE	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Electrovanne de Purge	03/07/2017		
Purge - EDE - Le Teich - ESTURGEONNIERE					
Purge - EDE - Le Teich - ESTURGEONNIERE	Unité de Contrôle / Commande	Contacteur / Programmateur	03/07/2017		
Purge - EDE - Le Teich - ESTURGEONNIERE	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Compteur	03/07/2017		
Purge - EDE - Le Teich - ESTURGEONNIERE	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Regard	03/07/2017		
Purge - EDE - Le Teich - ESTURGEONNIERE	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Electrovanne de Purge	03/07/2017		
Purge - EDE - Arcachon - ECOLE MOULEAU					
Purge - EDE - Arcachon - ECOLE MOULEAU	Unité de Contrôle / Commande	Contacteur / Programmateur	03/07/2017		
Purge - EDE - Arcachon - ECOLE MOULEAU	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Compteur	03/07/2017		
Purge - EDE - Arcachon - ECOLE MOULEAU	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Regard	03/07/2017		
Purge - EDE - Arcachon - ECOLE MOULEAU	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Electrovanne de Purge	03/07/2017		
Purge - EDE - La Teste de Buch - ANDRE LESCA					
Purge - EDE - La Teste de Buch - ANDRE LESCA	Unité de Contrôle / Commande	Contacteur / Programmateur	03/07/2017		
Purge - EDE - La Teste de Buch - ANDRE LESCA	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Compteur	03/07/2017		
Purge - EDE - La Teste de Buch - ANDRE LESCA	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Regard	03/07/2017		
Purge - EDE - La Teste de Buch - ANDRE LESCA	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Electrovanne de Purge	03/07/2017		
Purge - EDE - Gujan Mestras - NEYRA					
Purge - EDE - Gujan Mestras - NEYRA	Unité de Contrôle / Commande	Contacteur / Programmateur	03/07/2017		
Purge - EDE - Gujan Mestras - NEYRA	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Compteur	03/07/2017		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Purge - EDE - Gujan Mestras - NEYRA	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Regard	03/07/2017		
Purge - EDE - Gujan Mestras - NEYRA	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Electrovanne de Purge	03/07/2017		
ST20 - EDE - La Teste de Buch - Vanne Pompier du Pyla					
ST20 - EDE - La Teste de Buch - Vanne Pompier du Pyla	Bâtiments d'Exploitation	Trappe d'accès	25/09/2017		METAL PROCESS 33
ST20 - EDE - La Teste de Buch - Vanne Pompier du Pyla	Unité de Contrôle / Commande	Armoire de Commande	25/09/2017		S.E.I.H.E Thierry ULRICH
ST20 - EDE - La Teste de Buch - Vanne Pompier du Pyla	Unité de Contrôle / Commande	Support de Télétransmission	25/09/2017	SOFREL	S550 GSM IP
ST20 - EDE - La Teste de Buch - Vanne Pompier du Pyla	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Vanne Automatique	25/09/2017	BAYARD	OPAP Premium PLUS
CPT PASSERELLE (sur S500 passerelle)					
CPT PASSERELLE (sur S500 passerelle)	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Canalisation / Tuyauterie	01/01/1960		
CPT PASSERELLE (sur S500 passerelle)	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Débitmètre	25/07/2019		
CP Aqualand					
CP Aqualand	Unité de Contrôle	Support de Télétransmission	25/07/2019	SOFREL	
CP Aqualand	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Tuyauterie	25/07/2019		
CP Aqualand	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Débitmètre	25/07/2019		
CP CAMPS					
CP CAMPS	Unité de Contrôle	Support de Télétransmission	01/06/2024	SOFREL	DL4W
CP CAMPS	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Tuyauterie	25/07/2019		
CP CAMPS	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Débitmètre	01/06/2024	KROHNE	
CP VIGNES					
CP VIGNES	Unité de Contrôle	Support de Télétransmission	01/06/2024	SOFREL	DL4W

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

CP VIGNES	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Tuyauterie	25/07/2019		
CP VIGNES	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Débitmètre	01/06/2024	KROHNE	
CP POMPIERS DU PYLA					
CP POMPIERS DU PYLA	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Canalisation / Tuyauterie	08/06/2022		
CP POMPIERS DU PYLA	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Débitmètre	08/06/2022	ENDRESS HAUSER	PW400
CP GERVAIS					
CP GERVAIS	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Canalisation / Tuyauterie	01/06/2024	SOFREL	DL4W
CP GERVAIS	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Débitmètre	01/06/2024	KROHNE	
CP FUSILLE					
CP FUSILLE	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Canalisation / Tuyauterie	01/06/2024	SOFREL	DL4W
CP FUSILLE	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Débitmètre	01/06/2024	KROHNE	

Equipements réseaux - Prélocalisateurs

Libellé Installation	Adresse	Libellé Equipement	Date Mise en Service Equipement	Fabricant Equipement	Modèle Equipement
Sonde Gutermann 510002895	2bis Rue Pierre de Coubertin 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002896	45 Rue du Parc de l'Estey 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002897	80 Rue Gaston de Foix	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

	33260 La Teste-de-Buch 33529				
Sonde Gutermann 510002898	7 Rue du Port 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002899	73 Rue Gaston de Foix 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002900	44 Impasse Testey 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002901	48 Avenue de la Pinède de Conteau 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002902	19t Rue du Port 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002903	18 Rue du Maréchal Foch 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002904	113 Port Ostreicole de la Barbotiere 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002905	27a Rue des Poilus 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Sonde Gutermann 510002906	19d Rue Dade 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002907	54 Avenue de la Pinède de Conteau 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002908	23 Avenue de la Pinède de Conteau 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002909	27 Rue du Chemin des Dames 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002910	59 Rue Pasteur 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002911	1 Rue Edmond Rostand 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002912	8 Impasse du Stade 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002913	11 Avenue de la Pinède de Conteau 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002914	22 Allée d'Aquitaine 33260 La Teste-de-Buch	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

	33529				
Sonde Gutermann 510002915	18 Rue Général Chanzy 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002916	104 Port Ostreicole de la Barbotiere 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002917	119 Esplanade des Ostréiculteurs 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002918	2 Allee du Haurat 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002919	28bis Chemin de la Magrette 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002920	19 Avenue de Bisserié 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002921	31 Rue du Port 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002922	24 Port Ostreicole de la Barbotiere 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Sonde Gutermann 510002923	2 Allee de la Barbotiere 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002924	99 Rue du Port de Larros 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002925	22a Avenue de la Gare 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002926	1 Rue des Sternes 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002927	33 Chemin de Guignols 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002928	33 Rue des Castaings 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002929	18 Rue de Nodin 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002930	2 Rue des Castaings 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002931	26 Rue de l'Industrie 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002932	2 Rue des Fleurs 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Sonde Gutermann 510002933	78 Avenue de la Côte d'Argent 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002934	7 Rue du Château 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002935	1 Rue de Nodin 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002936	2 Rue de Milon 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002937	Rue des Fleurs 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002938	15 Rue des Sternes 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002939	9bis Rue du Château 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002940	7 Rue des Perlières 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002941	15 Chemin de Guignols 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002942	10ter Avenue de Camps 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002943	10bis Rue du Château	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

	33470 Le Teich 33527				
Sonde Gutermann 510002944	38 Rue de l'Industrie 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002945	4 Rue des Perlières 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002946	Rue de Ruat 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002947	11 Rue de Nodin 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002948	1 Rue du Château 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002949	23 Rue des Fleurs 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002950	23 Rue de l'Industrie 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002951	87 Avenue de la Côte d'Argent 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002952	44 Rue de l'Industrie 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002953	4bis Rue de Milon 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Sonde Gutermann 510002954	31 Rue des Castaings 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002955	984 Avenue du Parc des Expositions 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002956	1 Allée des Bouleaux 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002957	33 Port Ostreicole de la Barbotiere 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002958	1 Square Jolibois 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002959	1311 Avenue du Parc des Expositions 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002960	91 Avenue de la Pinède de Conteau 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002961	1541 Avenue du Parc des Expositions 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002962	861 Boulevard de l'Industrie 33260 La Teste-de-Buch	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

	33529				
Sonde Gutermann 510002963	1175 Avenue du Parc des Expositions 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002964	640 Avenue du Parc des Expositions 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002965	106 Avenue de la Pinède de Conteau 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002966	98 Avenue de la Pinède de Conteau 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002967	8 Avenue du Pays de Buch 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002968	2 Allée des Charmes 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002969	641 Boulevard de l'Industrie 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002970	999 Avenue de l'Europe 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Sonde Gutermann 510002971	90 Avenue de la Pinède de Conteau 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002972	82 Avenue de la Pinède de Conteau 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002973	18 Avenue du Pays de Buch 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002974	1455 Avenue du Parc des Expositions 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002975	21 Avenue Gustave Eiffel 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002976	141 Avenue Gustave Eiffel 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002977	29 Rue des Pins Maritimes 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002978	380 Avenue de l'Aérodrome 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Sonde Gutermann 510002979	1h Avenue Chantebois 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002980	21 Avenue Gustave Eiffel 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002981	2 Allée des Oyats 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002982	440 Boulevard de l'Industrie 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002983	85 Avenue Denis Papin 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002984	260 Avenue Denis Papin 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002985	1 Allée des Mousserons 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002986	244 Esplanade des Ostréiculteurs 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Sonde Gutermann 510002987	84 Esplanade des Ostréiculteurs 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002988	37 Rue Peyjehan 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002989	9 Rue du Port de Larros 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002990	1 Lotissement les Coquelicots 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002991	7 Allée des Chanterelles 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002992	94 Esplanade des Ostréiculteurs 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002993	31 Avenue Frederic de Candale 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002994	53 Rue Béranger 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002995	25 Rue du Port de Larros	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

	33470 Gujan-Mestras 33199				
Sonde Gutermann 510002996	48 Rue de l'Oustalet 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002997	13a Avenue Frederic de Candale 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002998	4c Rue de la Séoube 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510002999	99 Rue du Port de Larros 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003000	53 Rue Peyjehan 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003001	10 Rue des Vieux Chênes 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003002	12 Rue Peyjehan 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003003	26 Rue de la Migréque 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Sonde Gutermann 510003004	250 Esplanade des Ostréiculteurs 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003005	33 Boulevard de Cazaux 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003006	39 Rue Béranger 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003007	31 Rue des Boyens 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003008	36 Rue Peyjehan 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003009	14 Rue de la Migréque 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003010	1 Rue des Baillons 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003011	36 Allée des Chanterelles 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003012	77 Rue de l'Oustalet 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Sonde Gutermann 510003013	1 Rue du Port de Larros 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003014	55 Rue Notre Dame des Monts 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003015	7 Avenue de la Gare 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003016	2 Place Dubernet 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003017	186 Rue du Port de Larros 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003018	70 Port Ostreicole de la Barbotiere 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003019	415 Rue du Port de Larros 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003020	26 Rue de Nodin 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003021	Allee du Teychan 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Sonde Gutermann 510003022	10bis Avenue de la Gare 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003023	25 Rue de l'Yser 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003024	38 Port Ostreicole de la Barbotiere 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003025	18 Avenue de Camps 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003026	22 Rue de Milon 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003027	14 Avenue de la Gare 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003028	17 Allee du Teychan 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003029	38 Rue du Port de Larros 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003030	92 Port Ostreicole de la Barbotiere 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Sonde Gutermann 510003031	18 Avenue de Camps 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003032	16ter Avenue de Camps 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003033	4ter Allee du Teychan 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003034	Lotissement les Orchidees 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003035	126 Esplanade des Ostréiculteurs 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003036	2bis Allee de la Barbotiere 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003037	20 Avenue de Camps 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003038	3 Chemin de Guignols 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003039	51bis Avenue de la Côte d'Argent 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Sonde Gutermann 510003040	Place Pierre Dubernet 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003041	1 Esplanade des Ostréiculteurs 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003042	33 Rue du Port de Larros 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003043	500 Esplanade des Ostréiculteurs 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003044	22 Avenue de Camps 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003045	61 Rue de Maugis 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003046	10 Rue Gaston de Foix 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003047	10 Place Thiers 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003048	1b Chemin de la Procession 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Sonde Gutermann 510003049	1a Allée du Clos d'Alice 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003050	45 Rue de Maugis 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003051	79 Avenue de Bisserié 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003052	67 Avenue de Bisserié 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003053	76 Chemin des Facteurs 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003054	66 Rue du Président Carnot 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003055	57 Rue du Président Carnot 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003056	1 Rue Gaston de Foix 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Sonde Gutermann 510003057	5 Rue du Coutoum 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003058	6 Rue des Alliés 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003059	41 Chemin de la Procession 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003060	47 Rue Jean de Grailly 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003061	29 Rue Jean de Grailly 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003062	9 Rue Louis Gaume 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003063	19 Rue Francon 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutermann 510003064	12 Chemin de la Procession 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/03/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012216	48 Allée de Jafeine 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Sonde Gutterman 500012217	20 Allée Boilly 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012218	Avenue de Meyran 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	30/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012219	20 Allée des Douves 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/11/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012220	1 Allee Mansart 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012221	10 Allée Picasso 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012222	45 Avenue de Meyran 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	23/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012223	65 Avenue de Césarée 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012224	29 Allée François Mauriac 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012225	1 Allée Raphaël 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Sonde Gutterman 500012226	9 Allée François Mauriac 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012227	81ter Allée de la Forêt 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	11/12/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012228	56 Cours de Verdun 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	28/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012229	69 Cours de Verdun 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012230	2 Allée Ingres 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012231	8 Allée Charles Gounod 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012232	104 Cours de Verdun 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	28/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012233	3 Allée de la Sauveta 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012234	40 Allée des Ecureuils 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Sonde Gutterman 500012235	12 Allée de Valentin 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012236	72 Allée Brémontier 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012237	37 Allée Raphaël 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012238	18 Allee des Arbousiers 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012239	54 Allée Brémontier 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012240	27 Allée des Ecureuils 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012241	75 Allée Brémontier 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012242	23 Allee Mongilard 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012243	1 Avenue de Meyran 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Sonde Gutterman 500012244	113q Rue Dejean Castaing 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012245	41 Allée Claude Debussy 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012246	2 Allée Nattier 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012247	18 Allee des Fragons 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012248	98 Rue de l'Or 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012249	1 Impasse de Cazaux 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012250	132 Rue Aimé Broustaud 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012251	48 Allée du Moulin Neuf 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012252	33 Allee des Pins de la Ruade 33470 Gujan-Mestras	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

	33199				
Sonde Gutterman 500012253	60 Allée de Fontebride 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012254	40 Rue Armand Daney 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012255	127 Rue de l'Or 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012256	21 Allée Giuseppe Verdi 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012257	26bis Rue du Marechal Leclerc 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012258	45 Allée de Fontebride 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012259	115 Rue de l'Or 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012260	1 Allée de la Plaine 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	28/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Sonde Gutterman 500012261	29 Allée Edouard Branly 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012262	71 Rue Armand Daney 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/11/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012263	15t Allée du Bec 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012264	25 Allée Frédéric Chopin 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500012265	13 Allée Honoré de Balzac 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026926	128 Avenue de Meyran 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	01/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026927	34 Allée de la Prairie 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	01/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026928	10 Cours de Verdun 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	27/07/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026929	8 Rue de l'Or 33470 Gujan-Mestras	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	27/07/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

	33199				
Sonde Gutterman 500026930	16 Allée Jean-jacques Rousseau 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	28/07/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026931	96bis Allée des Places 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	31/07/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026932	10 Avenue de l'Eglise 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	27/07/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026933	35 Residence Larros 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	26/07/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026934	16 Allée Jean Racine 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	28/07/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026935	42 Allée Jacques Bossuet 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	28/07/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026936	35 Allée des Places 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	31/07/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026937	1 Allée Albert Marquet 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	28/07/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Sonde Gutterman 500026938	40 Allée Jean Racine 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	28/07/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026939	1 Allée Molière 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	28/07/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026940	2 Allée Joseph Vernet 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	28/07/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026941	29 Allée Molière 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	28/07/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026942	9 Rue du Marechal Juin 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	27/07/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026943	10 Allée du Bosquet des Cigales 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	28/07/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026944	14 Allée Charles Daubigny 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	28/07/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026945	14 Allée Vincenzo Bellini 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	28/07/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026946	22 Allée du Mayne 33470 Gujan-Mestras	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	31/07/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

	33199				
Sonde Gutterman 500026947	11 Allée René Fourgs 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	30/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026948	11 Allée des Fauvettes 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	27/07/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026949	42 Allée Ludwig Van Beethoven 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	28/07/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026950	92 Avenue de Césarée 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	28/07/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026951	91 Rue Chante Cigale 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	06/12/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026952	32 Avenue de Césarée 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	28/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026953	20b Rue de la Liberté 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/11/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026954	19 Boulevard de la Côte d'Argent 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	31/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Sonde Gutterman 500026955	52ter Rue Pasteur 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026956	99 Boulevard de la Côte d'Argent 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	30/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026957	13 Allee de Matato 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026958	47 Allee du Haurat 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/11/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026959	10 Rue Pasteur 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/11/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026960	38 Rue du Docteur Dufourg 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026961	6 Allée Pierre Corneille 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	30/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026962	36 Allée du Fin 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026963	2 Allée Jean de la Bruyère 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	31/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Sonde Gutterman 500026964	13 Allée du Lavoir 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026965	59bis Allée de la Forêt 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	30/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026966	41bis Allée des Corsaires 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	23/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026967	4 Allée Jean Racine 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	30/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026968	76 Allee du Haurat 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026969	1 Rue de la Liberté 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026970	1 Allée Pierre Corneille 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	30/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026971	23 Allée de la Forêt 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	30/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026972	53 Rue Chante Cigale 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	30/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Sonde Gutterman 500026973	17 Allée du Fin 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	28/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026974	19 Rue de la Paix 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/11/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026975	39 Rue Pasteur 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026976	2 Allée des Tourterelles 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	01/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026977	13 Allée des Chênes 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	31/07/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026978	106 Allée des Places 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	31/07/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026979	25 Cours de la République 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	28/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026980	1 Rue du Maréchal Joffre 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	28/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026981	40 Rue du Maréchal Foch 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	31/07/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Sonde Gutterman 500026982	16 Allée du Plaçot 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	28/07/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026983	24 Cours de la République 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	28/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026984	21 Rue du Maréchal Joffre 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	28/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026985	Rue du Port 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	01/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026986	95 Allée des Grands Champs 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	01/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026987	69 Rue du Maréchal Foch 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	31/07/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026988	30 Allée de Cazaux 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	28/07/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026989	1bis Rue du Marechal Leclerc 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	28/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026990	86 Cours de la République	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

	33470 Gujan-Mestras 33199				
Sonde Gutterman 500026991	44 Rue Aimé Broustaud 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	31/07/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026992	42 Allée de Cazaux 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	28/07/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026993	9 Rue Paul Pouget 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	28/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026994	45 Allée de Malpont 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026995	46 Rue Dejean Castaing 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	30/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026996	28ter Allée des Grands Champs 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	01/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026997	16 Allée de la Biotte 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	31/07/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500026998	96 Rue Aimé Broustaud 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	28/07/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Sonde Gutterman 500026999	45 Rue Edmond Daubric 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500027000	93 Rue Edmond Daubric 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500027001	48 Cours de la Marne 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	28/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500027002	13s Allee du Sable 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	30/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500027003	21 Allée Montaigne 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	06/12/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500027004	35a Avenue de Césarée 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	28/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500027005	124 Allee du Haurat 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	30/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500027006	15 Allée Edouard Branly 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500027007	271 Allée de Bordeaux	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	31/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

	33470 Gujan-Mestras 33199				
Sonde Gutterman 500027008	2bis Allée François Mauriac 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	28/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500027009	172 Allee du Haurat 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500027010	136a Cours de la Marne 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	06/12/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500027011	59 Cours de la République 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500027012	83 Rue de la Liberté 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	30/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500027013	28 Allée Montaigne 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	28/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500027014	2 Allée Camille Corot 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	31/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500027015	61 Rue du Docteur Dufourg 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	25/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Sonde Gutterman 500027016	1 Rue Aurélien Daisson 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	30/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500027017	19 Cours de la Marne 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	28/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500027018	271 Allée de Bordeaux 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	31/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500027019	18 Rue Chante Cigale 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	30/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500027020	113 Cours de la Marne 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	31/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500027021	72 Cours de la Marne 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	30/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500027022	91 Cours de la République 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500027023	87bis Cours de la République 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	06/12/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Sonde Gutterman 500027024	23a Allée des Rossignols 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	28/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500027025	58 Rue Jules Barat 33470 Gujan-Mestras 33199	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/08/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046637	42 Allée Sarraméa 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046638	11 Allée du Moulin Rouge 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046639	3 Allée Sémiramis 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046640	34 Rue Dade 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046641	42 Avenue Gambetta 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046642	2 Rue du Baou 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046643	6 Allée Corrigan 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046644	2 Place Turenne 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Sonde Gutterman 500046645	3 Allée des Sablines 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046646	53 Boulevard Cote d'Argent 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046647	60 Cours Desbiey 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046648	Allée Stora 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046649	19 Allée Sarraméa 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046650	10 Allée Corrigan 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046651	7 Rue Copernic 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046652	5 Place Bremontier 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046653	17 Avenue Michel de Montaigne 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046654	21bis Avenue Victor Hugo 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046655	58 Cours Desbiey 33120 Arcachon	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

	33009				
Sonde Gutterman 500046656	20 Allee Francois de Fenelon 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046657	18 Allee du Docteur Lalesque 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046658	23a Rue Victor Hugo 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046659	31 Allée des Dunes 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046660	43 Rue du Lycée 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046661	28 Allée des Dunes 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046662	44 Allée des Dunes 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046663	7bis Allée Sémiramis 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046664	8a Rue du Baou 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046665	83 Cours Desbiey 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Sonde Gutterman 500046666	20 Rue Victor Hugo 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046667	17 Rue Alexandre Lhermite 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/12/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046668	3 Rue de l'Amiral Pierre Mouly 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/12/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046669	28 Rue Lagrua 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/12/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046670	49 Avenue du Parc Pereire 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/12/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046671	16 Rue du 14 Juillet 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/12/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046672	83 Boulevard Cote d'Argent 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/12/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046673	1 Allée du Bois de Rome 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/12/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046674	7bis Rue Jacques Boisot 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/12/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Sonde Gutterman 500046675	18 Avenue de Verdun 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/12/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046676	4 Avenue de la Regue Verte 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/12/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046677	5 Avenue Rapp 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/12/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046678	69 Avenue des Abatilles 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/12/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046679	5 Avenue de l'Ellipse 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/12/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046680	62 Rue Lagrua 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/12/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046681	22b Avenue de Verdun 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/12/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046682	1t Chemin du Mourillat 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/12/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046683	67 Boulevard Cote d'Argent 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/12/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Sonde Gutterman 500046684	109 Boulevard Cote d'Argent 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/12/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046685	6 Rue Michelet 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/12/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046686	1 Rue de la Gemme 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/12/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046687	3 Avenue de l'Ellipse 33470 Le Teich 33527	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/12/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046688	2bis Rue du 14 Juillet 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/12/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046689	36bis Allée des Arènes 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/12/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046690	40 Avenue du Parc Pereire 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/12/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046691	9 Avenue de la Regue Blanque 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/12/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046692	20 Avenue Pasteur 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/12/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Sonde Gutterman 500046693	24 Avenue de Verdun 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/12/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046694	8 Rue Cap Ocean 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/12/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046695	14 Avenue Rapp 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/12/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046696	1 Avenue Sainte Marie 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	29/12/2023	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046697	24 Rue Roger Dubois 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046698	3 Allée des Ecluses 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046699	2 Allee de la Galaxie 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046700	78 Avenue des Abatilles 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046701	2 Allée Jean Balde 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046702	133 Boulevard Cote d'Argent 33120 Arcachon	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

	33009				
Sonde Gutterman 500046703	5 Rue James Cook 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046704	68 Rue André Lesca 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046705	128 Avenue des Abatilles 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046706	26 Allee de la Galaxie 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046707	17 Rue François Mauriac 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046708	1 Place Gabriel Maydieu 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046709	9 Rue des Hippocampes 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046710	107b Rue André Lesca 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046711	46 Avenue des Abatilles 33120 Arcachon	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

	33009				
Sonde Gutterman 500046712	11 Allée Saturne 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046713	85 Rue Jean Saint-Marc 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046714	Allée Sainte Anne 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046715	37 Chemin du Petit Bordes 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046716	12 Rue des Hippocampes 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046717	37 Rue des Boyens 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046718	31 Rue François Mauriac 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046719	47 Rue François Mauriac 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046720	130 Boulevard Cote d'Argent 33120 Arcachon	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

	33009				
Sonde Gutterman 500046721	28 Le Pujeau du Large 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046722	121 Rue André Lesca 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046723	66 Avenue des Abatilles 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046724	Arcachon 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046725	1 Avenue Saint Exupery 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046726	23 Place du Docteur Llaguet 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046727	7 Rue May sur Orne 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046728	3 Impasse du General de Gaulle 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046729	2 Allée des Cordiers 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Sonde Gutterman 500046730	11a Rue de l'Yser 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046731	12b Rue Camille Pelletan 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046732	50 Chemin de Braouet 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046733	36 Rue Jean Moulin 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046734	41 Avenue du General de Gaulle 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046735	11 Rue Jean Saint-Marc 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046736	2 Passage de la Traine 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046737	50 Rue Jean Saint-Marc 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046738	42a Chemin de Braouet	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

	33260 La Teste-de-Buch 33529				
Sonde Gutterman 500046739	10 Rue Jean Moulin 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046740	32bis Avenue des Ostréiculteurs 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046741	2 Avenue des Huttiers 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046742	2 Rue François Mauriac 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046743	16 Rue Jean Moulin 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046744	41 Rue Jean Saint-Marc 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046745	44 Rue Jean Moulin 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046746	22 Rue du Général Gallieni 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Sonde Gutterman 500046747	10 Rue des Poilus 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046748	11 Rue des Maraichers 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046749	2 Rue Yves du Manoir 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046750	1 Rue du Moulin de Bordes 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046751	1t Rue de Braouet 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046752	27 Avenue Pasteur 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046753	66d Avenue du General de Gaulle 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046754	20 Rue des Maraichers 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046755	8 Place Gambetta 33260 La Teste-de-Buch	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

	33529				
Sonde Gutterman 500046756	2 Place Gambetta 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046757	162bis Boulevard de la Plage 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046758	1 Boulevard de l'Océan 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046759	9bis Rue Francis Jammes 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046760	13 Rue Nataniel Jonhston 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046761	163 Boulevard de la Plage 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046762	1 Cours Lamarque de Plaisance 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046763	45 Rue Mal de Lattre de Tassigny 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046764	94 Cours Lamarque de Plaisance 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Sonde Gutterman 500046765	1 Rue François de Sourdis 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046766	16 Avenue Lamartine 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046767	2 Cours Héricart de Thury 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046768	42 Avenue de la République 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046769	Rue des Jardins 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	18/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046770	259 Boulevard de la Plage 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046771	239 Boulevard de la Plage 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046772	1 Rue Léon Cigarroa 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046773	29 Rue Emile Doussy 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	18/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046774	306 Boulevard de la Plage 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Sonde Gutterman 500046775	15 Avenue Nelly Deganne 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046776	35 Avenue Gambetta 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046777	Place Roosevelt 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046778	8 Rue du Professeur Jolyet 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046779	25 Avenue Charles de Gaulle 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046780	22 Avenue de la République 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046781	9 Place Thiers 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046782	30 Cours Héricart de Thury 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046783	77 Avenue de la République 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046784	57 Avenue de la République 33120 Arcachon	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

	33009				
Sonde Gutterman 500046785	44 Rue François Legallais 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046786	Rue Roger Expert 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046787	57 Boulevard Mestrezat 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046788	62 Boulevard de la Plage 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046789	55 Avenue Gambetta 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046790	2 Rue Duregne 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046791	20 Cours Lamarque de Plaisance 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046792	5 Avenue de la Libération 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046793	43 Boulevard de la Plage 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046794	9 Rue Tendel 33120 Arcachon	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

	33009				
Sonde Gutterman 500046795	21 Boulevard de la Plage 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046796	92 Avenue de la Libération 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046797	25 Rue Mal de Lattre de Tassigny 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046798	1 Boulevard Deganne 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046799	92 Boulevard de la Plage 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046800	99 Boulevard Deganne 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046801	8 Rue Georges Duchez 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046802	99 Boulevard de la Plage 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046803	1 Rue Emile Doussy 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Sonde Gutterman 500046804	96bis Cours Desbiey 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046805	81 Boulevard Deganne 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046806	111 Cours Desbiey 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046807	11 Avenue Mendivil 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046808	22 Rue Lucien Pinneberg 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046809	43 Rue Emile Doussy 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046810	45 Boulevard du Général Leclerc 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046811	117 Boulevard Deganne 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046812	19 Cours Desbiey 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046813	11 Cours Desbiey 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Sonde Gutterman 500046814	40bis Avenue Lamartine 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046815	38 Rue Albert 1er 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046816	69 Cours Tartas 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046817	8 Rue Marguerite 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046818	Rue Saint François d'Assise 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046819	16 Rue Théolet 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046820	80bis Avenue du Général Leclerc 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046821	15 Allée de la Chapelle 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046822	35 Boulevard Deganne 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046823	35b Rue Pierre Loti 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Sonde Gutterman 500046824	4 Boulevard Mestrezat 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046825	29 Rue Duchenne 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046826	22bis Avenue des Merics 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046827	31 Rue Michelet 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046828	8 Boulevard Mestrezat 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046829	Rue Thomas Lussan 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046830	53 Boulevard Mestrezat 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046831	39 Rue Pierre Loti 33260 La Teste-de-Buch 33529	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046832	41 Rue Coste 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046833	16bis Boulevard de la Plage 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Sonde Gutterman 500046834	14 Rue Francis Jammes 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046835	6 Rue Coste 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15
Sonde Gutterman 500046836	21 Rue Michelet 33120 Arcachon 33009	Prelocalisateur accoustic (detect fuite)	02/01/2024	GUTTERMAN	ZS-NBIOT-KIT-76-15

Equipements réseaux - Capteurs surveillance PI/BI

Libellé Installation	Adresse	Libellé Equipement	Date Mise en Service Equipement	Fabricant Equipement	Modèle Equipement
HRS6773/17210003	31 - RUE DU CAPLANDE-33470-LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	13/06/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17210006	2 - RUE PIERRE DANEY-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	13/06/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1721000D	1 - ALLEE DES GREENS-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	13/06/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17210013	68 RUE DE POULICHE--LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	13/06/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17210015	2 - RUE RAYMOND SANCHEZ-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	13/06/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17440003	0 - RUE HUBERT LATHAM-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	07/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1744000B	0 - ZI ACTIPOLE VOIE 3-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	05/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450004	0 - BOULEVARD PROM VEYRIER MONTAGNERES-33120-ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	12/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450005	0 - BOULEVARD CHANZY-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	12/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450006	0 - AVENUE DE LA PINEDE DE CONTEAU-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	07/12/2017	Birdz	Module Apilink

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

HRS6773/17450007	0 - RUE PEYJEHAN-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	07/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450008	0 - RUE DE LA CALANDRELLE-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	07/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450009	ROUTE DE MIOS LA LESTURGEONNIERE--LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	14/06/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745000A	0 - AVENUE PIERRE FRONDAIE-33120-ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	12/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745000D	0 - ACTIPOLE LA FERME-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	12/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450010	0 - AV LA COTE D ARGENT-33470-LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	13/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450011	PORT DE LA PASERRELLE--GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	04/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450012	0 - AVENUE DE CAMPS-33470-LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	13/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450014	0 - AVENUE DE L EUROPE-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	07/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450015	0 - AVENUE DES OSTREICULTEURS-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	08/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450016	0 - BOULEVARD DU PY LA DERNIERE MAISON-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	05/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450017	0 - RUE NOTRE DAME DES MONTS-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	08/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450018	CHEMIN DE CAMICAS--LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	11/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450019	0 - BOULEVARD DES MIQUELOTS-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	06/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745001A	0 - RUE DES FRERE MONGOLFIERS-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	06/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745001C	0 - RUE DU PARC DE L ESTEY-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	06/12/2017	Birdz	Module Apilink

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

HRS6773/1745001E	0 - RUE DE MAPOUCHET-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	07/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450020	0 - AVENUE DE L EUROPE-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	08/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450021	0 - ALLEE VINCENT VANGOGH-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	04/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450023	0 - ALLEE DU TEYCHAN-33470-LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	13/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450024	Z ACTIVITE ECONOMIQUE--GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	12/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450025	0 - AVENUE DE L ERMITAGE-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	11/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450026	0 - AVENUE DE BELLEVUE-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	08/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450027	ECOLE PRIMAIRE VAL DES PINS--LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	01/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450028	0 - AVENUE DE L AERODROME-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	06/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745002A	0 - AVENUE DE L AERODROME-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	06/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745002B	0 - AVENUE DU SOLEIL-33120-ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	12/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745002C	0 - ALLEE DU DOCTEUR GEORGES WOLFF-33120-ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	12/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745002D	0 - ROUTE DES BENEVOLES-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	05/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450030	0 - ZONE SYLVABELLE-33470-LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	01/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450031	0 - AVENUE DE CAMPS CIMETIERE-33470-LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	30/11/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450033	0 - AVENUE DU MARECHAL FOCH-33120-ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	12/12/2017	Birdz	Module Apilink

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

HRS6773/17450035	0 - AVENUE DES AJONCS-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	08/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450036	ALLEE SYLVABELLE DEVANT SUEZ--LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	30/11/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450037	0 - BOULEVARD DE L ATLANTIQUE-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	08/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450039	0 - AVENUE MARECHAL JOFFRE FACE AU N9-33120-ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	12/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745003A	0 - RUE DES BECASSES-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	08/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745003B	0 - BOULEVARD DE CAZAUX EN FACE DE NISSAN-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	06/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745003C	0 - AVENUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	29/11/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745003D	12 - RUE DE BALANOS-33470-LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	14/06/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745003E	0 - RUE DES FUSILLES-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	08/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450040	0 - ROUTE DES BENEVOLES-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	01/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450041	0 - RUE SAINT ANDRE CASERNE POMPIER-33470-LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	28/11/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450044	0 - BOULEVARD DE L INDUSTRIE ETSUNIBETON-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	06/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450045	0 - RUE NOTRE DAME DES MONTS-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	05/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450047	0 - RUE RAYMOND SANCHEZ-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	08/12/2017	Birdz	Module Apilink

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

HRS6773/17450048	AVENUE ABBE EDME MARIOTTE--LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	07/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745004B	Z ACTIVITE ECONOMIQUE--GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	12/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745004C	AVENUE DE BINGHAMPTON--LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	12/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745004D	0 - AVENUE DE L EUROPE EN FACE DE CHAUSSON-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	07/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745004E	BLD DES MIQUELOTS--LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	12/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745004F	RUE DES CASTAINGS--LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	13/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450050	0 - RUE DES POISSONNIERS-33470-LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	13/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450051	0 - SQUARE DE LA MARELLE-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	07/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450052	0 - AVENUE DE L EUROPE-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	07/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450054	0 - ALLEE DES CORMORANS-33120-ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	11/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450056	0 - RUE DE LA GARE-33470-LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	04/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450057	0 - RUE DU BOUSCAUT-33470-LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	13/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450058	0 - RUE DU COUTOUM-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	06/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745005A	0 - RUE DES VIEUX CHENES-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	06/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745005B	0 - ROUTE DES LACS-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	01/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745005C	0 - AVENUE DE LAMOTHE-33470-LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	01/12/2017	Birdz	Module Apilink

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

HRS6773/1745005D	0 - RUE DU PONT NEUF-33470-LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	01/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745005F	0 - AVENUE DE L ERMITAGE-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	08/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450060	58 - RUE DE BALANOS-33470-LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	01/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450062	0 - AVENUE GUY DE PIERREFEU-33120-ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	12/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450063	BOULEVARD LOUIS LIGNON--LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	08/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450065	0 - ALLEE VALENTIN-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	13/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450066	0 - ALLEE DE LA PELOUSE-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	05/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450067	AVENUE DE CESAREE DECHETTERIE--GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	04/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450068	0 - AVENUE GUY DE MAUPASSANT-33120-ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	12/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450069	RUE VICTOR HUGO--LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	06/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745006A	0 - RUE JAMES COOK-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	07/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745006C	RUE COPERNIC--LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	01/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745006D	0 - AVENUE DE VERDUN-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	05/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745006E	0 - AVENUE DE L ERMITAGE-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	08/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450070	0 - AVENUE DU PARC-33120-ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	12/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450071	0 - ALLEE DES DOUVES-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	04/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450073	0 - ALLEE CHARLES PEGUY-33120-ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	12/12/2017	Birdz	Module Apilink

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

HRS6773/17450075	0 - ALLEE F CHOPIN-33470-GUJ AN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	13/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450076	0 - AVENUE DE L EUROPE-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	07/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450077	0 - RUE D ARCOLE-33470-GUJA N MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	05/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745007A	0 - RUE DE MOURAS NEZER-33470-LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	28/11/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745007C	0 - BOULEVARD CHANZY-33120-ARC ACHON	Capteur surveillance PI/BI	11/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745007E	BOULEVARD PIERRE LOTI--ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	11/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745007F	RUE NOTRE DAME DES MONTS--LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	05/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450086	0 - CHEMIN DE SECARY FACE AU N50-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	06/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450087	0 - ALLEE EDOUARD GAFFET-33120-ARCA CHON	Capteur surveillance PI/BI	12/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450088	PLACE THIERS--LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	05/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745008A	ZI ACTIPOLE VOIE 5--GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	05/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745008B	AVENUE DE LA PLAGE--GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	28/11/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745008C	0 - AVENUE DE LA GALAXIE-33120-ARC ACHON	Capteur surveillance PI/BI	12/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745008D	0 - RUE ILE AUX OISEAUX-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	12/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745008E	0 - AVENUE GUSTAVE EIFFEL-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	06/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450092	0 - RUE DE L ARROUSINEY-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	07/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450095	0 - AVENUE DE L EUROPE-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	07/12/2017	Birdz	Module Apilink

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

HRS6773/17450097	0 - RUE PEYJEHAN-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	07/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450099	0 - AVENUE DE LA PINEDE DE CONTEAU-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	07/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745009B	AVENUE GUSTAVE EIFFEL BOULEVARD DE L INDUSTRIE--LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	07/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745009D	0 - ZI ACTIPOLE VOIE 6-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	05/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745009E	0 - RUE LAGRUA-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	07/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745009F	0 - ALLEE DU CANELOT ALLEE DES ECLUSES-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	06/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500A0	RUE DES ROMARINS--LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	08/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500A1	0 - AVENUE PIERRE DIGNAC-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	30/11/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500A2	AVENUE DES PECHEURS--LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	07/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500A4	ALLEE DES FAUVETTES--ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	11/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500A5	0 - RUE DE LA REOUSSE-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	08/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500A6	0 - ROUTE DES LACS-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	29/11/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500A8	0 - ALLEE DE BORDEAUX-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	01/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500AA	0 - ZONE SYLVABELLE-33470-LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	30/11/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500AC	0 - AVENUE DES OSTREICULTEURS-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	06/12/2017	Birdz	Module Apilink

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

HRS6773/174500AE	11 - AVENUE TTHEOPHILE GAUTIER-33120-ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	12/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500AF	AVENUE DE L AERODORME AVENUE HENRI BECQUEREL--LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	06/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500B0	0 - PRL PARC DE LA PLAGE-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	12/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500B1	0 - ZI ACTIPOLE VOIE 7-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	05/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500B2	0 - CHEMIN DE CAILLIVOLE FACE AU N15-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	06/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500B4	0 - RUE DE L ILE AUX OISEAUX-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	07/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500B6	0 - AUCUNE ADRESSE-33470-LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	28/11/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500B7	0 - ALLEE DES FLEURS-33120-ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	11/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500B9	0 - ALLEE CORRIGAN-33120-ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	12/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500BB	0 - RUE MARCEL DASSAULT-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	08/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500BE	0 - RUE DU DIAPASON-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	05/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500BF	0 - ALLEE DES MIMOSAS-33120-ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	11/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500C0	0 - RUE D ARCOLE-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	05/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500C1	0 - ALLEE RAOUL LABORDERIE-33120-ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	11/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500C4	0 - RUE DE NEZER DEVANT LE N4-33470-LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	28/11/2017	Birdz	Module Apilink

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

HRS6773/174500C5	0 - RUE ANDRE LESCA-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	07/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500C8	0 - RUE DU PARADIS DES CANARDS-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	08/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500C9	0 - ALLEE DES MIMOSAS-33120-ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	11/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500CD	RUE DU PORT PLACE CAMPING CAR--LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	29/11/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500CE	0 - RUE ROGER DUBOIS-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	08/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500CF	0 - ALLEE DES STERNES-33120-ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	11/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500D1	AVENUE DE L ERMITAGE--LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	08/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500D2	0 - RUE FRANCOIS PILATRE DE ROZIER-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	06/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500D3	0 - RUE DES PLATANES-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	05/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500D4	0 - RUE SAINT ANDRE CASERNE POMPIER-33470-LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	29/11/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500D6	RUE DUCHENNE RUE MICHELET--ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	11/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500D8	0 - AVENUE DE LA PINEDE DE CONTEAU-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	07/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500DB	0 - AVENUE HAMEAU DES BARONS-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	08/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500DC	0 - RUE LOUIS GAUME-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	05/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500DD	0 - AVENUE DES GOELANDS-33120-ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	11/12/2017	Birdz	Module Apilink

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

HRS6773/174500DE	0 - RUE DE LAGRUA DERRIERE INTERSPORT-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	07/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500E0	ALLEE JEAN BALDE--ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	12/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500E2	0 - RUE MARCEL DASSAULT-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	07/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500E3	0 - ALLEE FLORALIES-33120-ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	11/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500E4	AVENUE DE LA PLAGE--LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	13/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500E7	0 - RUE DE L INDUSTRIE-33470-LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	04/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500E9	0 - CHEMIN DU LOUP-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	12/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500EA	0 - RUE DES CANELONS HAMEAU DES BARONS-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	07/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500EB	0 - RUE LAGRUA A COTE DE JOUE CLUB-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	07/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500EC	RUE GEORGES MERAN--ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	11/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500EF	0 - RUE ANDRE LESCA-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	08/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500F1	RUE DE BORDES AVENUE GENERAL DE GAULLE--LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	05/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500F4	0 - AVENUE DE LA PINEDE DE CONTEAU-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	07/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500F7	0 - RUE ANDRE LESCA-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	05/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500F9	0 - PLAINE BONNEVAL-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	06/12/2017	Birdz	Module Apilink

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

HRS6773/174500FA	0 - ALLEE DE GRANGENEUVE-33470-LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	13/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500FB	0 - BOULEVARD DE LA PLAGE-33120-ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	11/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174500FF	0 - ALLEE J. GIONO-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	06/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450100	0 - ZI ACTIPOLE VOIE 2-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	05/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450101	0 - AVENUE SAINT EXUPERY-33120-ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	12/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450102	0 - AVENUE DU PARC PEREIRE-33120-ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	11/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450103	0 - AVENUE DU GENRAL LECLERC-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	07/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450104	RUE JEAN LARRIEU--LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	06/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450106	0 - ALLEE SYRIUS-33120-ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	12/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450109	CHEMIN DU LOUP--GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	12/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745010A	0 - BOULEVARD DES MIQUELOTS-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	06/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745010B	0 - BOULEVARD DE L INDUSTRIE ETS NOFAL-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	06/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745010D	0 - BOULEVARD DE LA MER-33120-ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	11/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745010F	0 - Z ACTIVITE ECONOMIQUE-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	12/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450110	0 - ALLEE DE L HOPITAL-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	07/12/2017	Birdz	Module Apilink

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

HRS6773/17450111	0 - RUE FRANCOIS CAMPET-33120-ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	11/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450113	0 - RUE OVIDE ROUSSET-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	06/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450114	0 - ALLEE LATECOERE-33120-ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	12/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745012F	0 - AVENUE DE L EUROPE-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	08/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745013A	0 - AVENUE DE BOULANGE-33470-LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	04/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745013C	0 - AVENUE MAURICE MARTIN-33120-ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	12/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745013D	ALLEE FERDINAND DE LESSEPS DEVAND PALACE CARAVANE--GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	04/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745013F	AVENUE MARECHAL LYAUTEY FACE AU N5--ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	12/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450140	0 - ALLEE DES ARBOUSIERS-33120-ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	12/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450141	0 - AVENUE DE CHAMBRELENT-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	08/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450142	0 - BOULEVARD DE L ATLANTIQUE-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	08/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450144	0 - ALLEE DU HAURAT AU N144-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	01/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450145	0 - RUE DENIS PAPIN ETS NANNI DIESEL-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	06/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450147	72 - RUE DE BALANOS-33470-LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	01/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450149	0 - ALLEE DU MOULIN NEUF AU	Capteur surveillance PI/BI	01/12/2017	Birdz	Module Apilink

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

	N45-33470-GUJAN MESTRAS				
HRS6773/1745014A	0 - AVENUE DES BAIES-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	08/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745014C	0 - ALLEE DES TILLEULS-33120-ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	11/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450152	0 - BOULEVARD DE L ATLANTIQUE-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	11/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450153	0 - AVENUE DES PINSONS-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	08/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450154	0 - ALLEE CLEMENT MAROT-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	01/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450155	0 - ALLEE VALENTIN-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	04/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450167	0 - RUE MARCEL LEGRAND-33470-LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	29/11/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450168	AVENUE NELLY DEGANNE--ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	11/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450171	0 - AVENUE DE BERNET LOT LE DOMAINE PYLA-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	08/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450174	0 - AVENUE GUY DE MAUPASSANT-33120-ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	12/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450175	0 - ALLEE ALFRED DE VIGNY-33120-ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	01/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450176	0 - AVENUE DES CHENES VERTS-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	08/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450177	0 - RUE DU BAOU-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	07/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450178	ALLEE ROGER DELUGIN--GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	30/11/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450179	0 - RUE RAYMOND SANCHEZ-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	08/12/2017	Birdz	Module Apilink

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

HRS6773/1745017A	0 - ALLEE DE JAFEINE-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	01/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745017B	0 - HARAS DE LA BECASSIERE DERRIERE LE ZOO-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	05/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745017C	0 - RUE PIERRE DANEY-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	30/11/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1745017F	0 - AVENUE DE L EUROPE-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	06/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450180	0 - AVENUE DE MEYRAN-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	29/11/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450181	0 - RUE DE NEZER-33470-LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	01/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450182	0 - RUE OSMIN DUPUY-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	11/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450183	0 - AVENUE DES PLUVIERS-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	08/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17450184	0 - AVENUE DES VIOLETTES-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	08/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174501B9	0 - CHEMIN DE LA PEGUILLEYRE-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	06/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174501BF	0 - IMPASSE DE LA BERLE-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	01/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174501C0	RUE DU PROFESSEUR JOYLET--ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	12/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174501C2	0 - ALLEE DE CANTERANNE-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	01/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174501C9	ALLEE DES COQUELICOTS ALLEE DES GLAIEULS--GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	30/11/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/174501CB	0 - RUE CAPLANDE-33470-LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	05/12/2017	Birdz	Module Apilink

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

HRS6773/174501CD	ALLEE FRANCOIS MAURIAC--GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	04/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17460007	0 - BOULEVARD PIERRE DIGNAC-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	30/11/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17460008	0 - ALLEE DE LA PELOUSE-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	29/11/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1746000C	BOULEVARD PROM. MARCEL GOUNOUILHOU--ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	11/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1746000D	0 - ALLEE DES PRESSALEE-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	29/11/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1746000E	0 - ALLEE ROGER DELUGIN-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	04/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17460011	0 - AVENUE DES LOISIRS-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	05/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17460012	0 - RUE DE LA GEMME-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	06/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17460013	0 - ROUTE DES BENEVOLES-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	04/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17460017	0 - AVENUE PAUL POUGET-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	30/11/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17460018	0 - RUE DU DADE-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	05/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17460019	0 - AVENUE DE LA BRASSERIE-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	06/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1746001A	0 - AVENUE DES LOISIRS-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	05/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1746001D	AVENUE DE CAMPS--LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	29/11/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1746001E	0 - ALLEE DE LA FORET AU N58 BIS-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	30/11/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17460020	0 - IMPASSE DU TESTEY-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	04/12/2017	Birdz	Module Apilink

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

HRS6773/17460021	0 - AVENUE GUSTAVE EIFFEL-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	05/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17460022	AVENUE DE LA REPUBLIQUE--ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	11/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17460024	BOULEVARD LOUIS LIGNON--LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	08/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17460025	RUE DES ALLIES RUE DE LA VICTOIRE--LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	06/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17460026	0 - IMPASSE DES CHARDONNERETS-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	08/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17460027	0 - AVENUE DE LA COTE D ARGENT-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	30/11/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17460029	0 - AVENUE DU GENRAL DE GAULLE-33120-ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	11/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1746002A	BOULEVARD DEGANNE--ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	11/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17460031	AVENUE DE LA PLAGE--GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	28/11/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17460032	0 - RUE LASSEOUGUE-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	07/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17460033	0 - LAC DE LA MAGDELEINE-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	05/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17460034	ROUTE DES BENEVOLES--GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	05/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17460035	0 - RUE GEORGES MERAN-33120-ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	11/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17460038	0 - RUE DES PASSEREAUX-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	07/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1746003C	0 - BOULEVARD DEGANNE-33120-ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	11/12/2017	Birdz	Module Apilink

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

HRS6773/1746003E	ALLEE MARCEL PAGNOL DERRIERE HYPERU--GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	04/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1746003F	RUE DES COLIBRIS--LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	07/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17460041	0 - RUE DE L OUSTALET-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	06/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17460049	AVENUE DE L ERMITAGE--LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	08/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1746004A	0 - AVENUE DU DR LORENTZ MONOD-33120-ARC ACHON	Capteur surveillance PI/BI	12/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1746004E	0 - RUE DES VIGNES-33470-LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	04/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1746004F	ALLEE DU HAURAT AU N106--GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	30/11/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17460050	13 - ALLEE MATATO-33470-GUJ AN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	01/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17460053	0 - RUE BICHOQUE-33470-G UJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	04/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17460056	AVENUE DE CAMPS--LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	04/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17460057	0 - ALLEE DES BECASSES-33470-LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	04/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17460059	0 - AVENUE MARECHAL LECLERC-33470-GUJ AN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	30/11/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1746005B	0 - RUE JACQUELINE DESPEYROUX-33470 -LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	04/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1746005D	0 - RUE DU MOULIN-33470-LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	04/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17460060	0 - AVENUE DE CAMPS-33470-LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	04/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17460061	0 - PORT DE LARROS CODIMER-33470-GU JAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	01/12/2017	Birdz	Module Apilink

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

HRS6773/17460079	0 - RUE CHIQUOY-33470-LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	04/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17480009	0 - CIMETIERE AV DE CESAREE-33470-GUJ AN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	30/11/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1748000C	0 - ALLEE DU CANELET-33470-GUJ AN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	05/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17480016	0 - LAC DE LA MAGDELEINE-33470 -GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	05/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1748002B	15 - ALLEE DE LA BIOTTE-33470-GUJA N MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	29/11/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1748002C	0 - ALLEE DU MUGUET-33470-GUJ AN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	29/11/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1748002F	0 - RUE GEORGE BYZET-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	04/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17480031	0 - AVENUE DE CESAREE CASERNE-33470-GUJ AN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	01/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17480036	0 - FACE ALLEE DU PRINTEMPS-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	30/11/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17480039	0 - IMPASSE LE CAOUDEY-33470-GU JAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	04/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1748003A	0 - ALLEE DE CAZAUX AU N42-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	30/11/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1748003B	0 - ALLEE MARC NOUAUX ECOLE-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	01/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1748003D	0 - ALLEE DU MAYNE-33470-GUJA N MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	01/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17480046	143 - RUE AIME BROUSTAUD-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	01/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17480048	0 - ALLEE DES GRANDS CHAMPS-33470-GUJ AN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	29/11/2017	Birdz	Module Apilink

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

HRS6773/1748004B	0 - ALLEE DU PLACOT-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	30/11/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1748004C	0 - ALLEE DES LA PLAINE FACE AU N08-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	01/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1748004F	ALLEE DES PLACES ALLEE DUNIAU--GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	29/11/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17480051	0 - ALLEE DU MARACHON-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	04/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17480054	0 - RUE DEJEAN CASTAING-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	29/11/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17480055	0 - RUE DE LOR-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	04/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17480058	0 - ALLEE FRANZ SCHUBERT-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	04/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/17480059	0 - RUE BEETHOVEN-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	04/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1756005E	AVENUE PIERRE DIGNAC PORT MEYRAN EST--GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	01/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/18278005	0 - RUE GILBERT SORE-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	07/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/18278006	0 - RUE GUSTAVE EIFFEL ETS PINTURAUD-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	06/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1827800B	0 - AVENUE GOUNOD-33120-ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	05/12/2017	Birdz	Module Apilink
HRS6773/19138016	0 - AVENUE VULCAIN-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink
HRS6773/19138019	0 - AVENUE VULCAIN-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink
HRS6773/1913801C	0 - ALLEE DES FAUVETTES-33120-ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

HRS6773/19138025	0 - RUE GILBERT MOGA-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink
HRS6773/19138032	0 - AVENUE MARECHAL LYAUTEY FACE AU N5-33120-ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink
HRS6773/19138044	0 - ALLEE JEAN BALDE-33120-ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink
HRS6773/19138056	2 - RUE DE L'ANCIEN MARCHE-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink
HRS6773/2044802E	0 - RUE DES ROMARINS-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink
HRS6773/20448059	0 - RUE DES ALLIES-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink
HRS6773/2044808B	0 - RUE NOTRE DAME DES MONTS-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink
HRS6773/2044808D	0 - ROUTE DE MIOS LA L ESTURGEONNIERE-33470-LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink
HRS6773/2045816A	0 - AVENUE DES PECHEURS-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink
HRS6773/20468006	0 - AVENUE DE CAMPS-33470-LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink
HRS6773/2046800A	68 - RUE DE POULICHE-33470-LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink
HRS6773/2046800C	10 - ALLEE SYLVABELLE DEVANT SUEZ-33470-LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink
HRS6773/21048027	0 - ALLEE ROGER DELUGIN-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink
HRS6773/2104802C	0 - AVENUE DE LA PLAGE-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink
HRS6773/21048030	0 - ALLEE MARCEL PAGNOL-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

HRS6773/21048032	0 - AVENUE GUSTAVE EIFFEL-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink
HRS6773/21048034	0 - PLACE THIERS-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink
HRS6773/21048037	0 - AVENUE DE CESAREE DECHETTERIE-33470 -GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink
HRS6773/2104803F	0 - RUE COPERNIC-33470-LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink
HRS6773/21048054	0 - AVENUE DE CAMPS-33470-LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink
HRS6773/2104806F	0 - AVENUE DE L ERMITAGE-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink
HRS6773/210480A3	0 - RUE DU PORT PLACE CAMPING CAR-33470-LE TEICH	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink
HRS6773/210480CF	0 - ROUTE DES BENEVOLES-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink
HRS6773/210480E9	0 - CHEMIN DE CAMICAS-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink
HRS6773/2116801B	0 - ALLEE FERDINAND DE LESSEPS-33470-GUJ AN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink
HRS6773/21168021	0 - ALLEE DU HAURAT AU N106-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink
HRS6773/21168024	0 - ALLEE DES COQUELICOTS-3347 0-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink
HRS6773/21168029	0 - RUE DES COLIBRIS-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink
HRS6773/2116802A	0 - ALLEE DES PLACES-33470-GUJA N MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink
HRS6773/21168037	0 - ALLEE FRANCOIS MAURIAC-33470-GU JAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

HRS6773/2116803B	0 - RUE JEAN LARRIEU-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink
HRS6773/2116803D	0 - AVENUE DE L ERMITAGE-33115-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink
HRS6773/21168041	0 - AVENUE DE BINGHAMPTON-331 15-LA TESTE DE BUCH	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink
HRS6773/2142802D	0 - CHEMIN DU LOUP-33470-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink
HRS6773/2142802E	0 - BOULEVARD PIERRE LOTI-33120-ARCACH ON	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink
HRS6773/2142805F	0 - RUE DU PROFESSEUR JOYLET-33120-ARCA CHON	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink
HRS6773/21428069	0 - AVENUE PIERRE DIGNAC-33470-GUJ AN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink
HRS6773/2142806C	0 - RUE DUCHENNE-33120-A RCACHON	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink
HRS6773/2142807D	0 - BOULEVARD DEGANNE-33120-AR CACHON	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink
HRS6773/21428082	0 - Z ACTIVITE ECONOMIQUE-3347 0-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink
HRS6773/21428083	0 - BOULEVARD PROM. MARCEL GOUNOUILHOU-331 20-ARCACHON	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink
HRS6773/214280B6	0 - Z ACTIVITE ECONOMIQUE-3347 0-GUJAN MESTRAS	Capteur surveillance PI/BI	21/11/2024	Birdz	Module Apilink

- **Détail des Volumes consommés sans comptages:**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

VOLUMES CONSOMMES SANS COMPTAGE (Vcsc) en m^3					35 418,0	Commentaires
Essai PI/BI	Nombre d'essais réalisés dans		Durée (mn)	Débit (m3/h)		
	492		10	60	4 920,0	mail COBAS du 11/03, 492 PI/BI mesurés à 60M3/h
Manoeuvres Incendies (incendie	Nombre d'ouvertures dans l'année		Durée (mn)	Débit (m3/h)		
	998		2	60	3 076,0	mail COBAS du 11/03, 998 PI/BI avec un test d'écoulement sans mesures de débit + 9 Incendies représentatifs sur les 4 communes en 2024. (Maisons, entrepots...) 9*2H*60
Lavage des voiries, espaces verts avec Engins + Prise d'eau PI diverses	Nb de camions	Vol camion (m3)	Nb rotations /j	Nb de jours / an		
					20 516,0	Calculé par les APILINK sur un panel de 300 APILINK
					5 758,0	Vol SARP+SB2A+Chantier A660+Gens du voyage
Chasse d'eau sur le réseau d'assainissement	Nombre d'actions	Volume d'un réservoir (en m^3)		Nombre de réservoirs de chasse		
					1 148,0	8 chasses d'eau retrouvées en fonctionnement Quartier Le courtiou/chante-Cigale/La Berie - Secteur Gujan Est dont 1 restée ouverte rue du Courtiou le 23/09/24

6.6. GLOSSAIRE

Le présent glossaire est établi sur la base des définitions de l'arrêté du 2 mai 2007 et de la circulaire n°12/DE du 28 avril 2008 et de compléments jugés utiles à la compréhension du document.

Abonnement :

L'abonnement désigne le contrat qui lie l'abonné au délégataire pour la prestation du service de l'eau ou de l'assainissement conformément au règlement du service. Il y a un abonnement pour chaque point d'accès au service (point de livraison d'eau potable ou de collecte des effluents qui dessert l'abonné, ou installation d'assainissement non collectif).

Abonnés non domestiques :

Les abonnés non domestiques sont redevables directement à l'Agence de l'eau pour les redevances de pollution et de modernisation des réseaux perçues habituellement sur les factures d'eau et d'assainissement. Il s'agit d'établissements dont les activités sont définies par un arrêté du 21/12/2017, et dont le volume d'activité dépasse certains seuils. Les abonnés non domestiques ne doivent pas être confondus avec les abonnés industriels. La notion d'abonnés industriels correspond à des critères propres au règlement de service.

Capacité de production :

Volume qui peut être produit par toutes les installations de production pour un fonctionnement journalier de 20 heures chacune (unité : m^3/jour).

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Certification ISO 14001 :

Cette norme concerne le système de management environnemental. La certification s'applique aux aspects environnementaux que Veolia Eau peut maîtriser et sur lesquels il est censé avoir une influence. Le système vise à réduire les impacts liés à nos produits, activités et services sur l'environnement et à mettre en place des moyens de prévention des pollutions, en s'intéressant à la fois aux ressources et aux sous-produits du traitement dans le respect de la législation en vigueur et la perspective d'une amélioration continue.

Certification ISO 9001 :

Cette norme concerne le système de management de la qualité. La certification ISO 9001 traduit l'engagement de Veolia à satisfaire les attentes de ses clients par la qualité des produits et des services proposés et l'amélioration continue de ses performances.

Certification ISO 22000 :

Attestation fournie par un organisme certificateur qui valide la démarche de sécurité alimentaire effectuée par le délégataire.

Certification ISO 50001 :

Cette norme concerne le système de management de l'énergie. Ce système traduit l'engagement de Veolia à analyser ses usages et ses consommations énergétiques pour privilégier la performance énergétique dans le respect de la législation en vigueur et la perspective d'une amélioration continue.

Certification ISO 45001 :

Cette norme concerne le système de management de la santé et de la sécurité au travail.

Consommateur – abonné (client) :

Le consommateur abonné est une personne physique ou morale ayant souscrit un ou plusieurs abonnements auprès de l'opérateur du service public (par exemple service de l'eau, de l'assainissement, etc..). Il est par définition desservi par l'opérateur. Il peut être titulaire de plusieurs abonnements, en des lieux géographiques distincts appelés points de service et donc avoir plusieurs points de service. Pour distinguer les services, on distingue les consommateurs eau, les consommateurs assainissement collectif et les consommateurs assainissement non collectif. Il perd sa qualité de consommateur abonné à un point de service donné lorsque le service n'est plus délivré à ce point de service, de façon définitive, quelle que soit sa situation vis-à-vis de la facturation (il n'est plus desservi, mais son compte peut ne pas encore être soldé). Pour Veolia, un consommateur abonné correspond à un abonnement : le nombre de consommateurs abonnés est égal au nombre d'abonnements.

Consommation individuelle unitaire :

Consommation annuelle des consommateurs particuliers individuels divisée par la durée de la période de consommation et par le nombre de consommateurs particuliers individuels et collectifs (unité : m^3/client/an).

Consommation globale unitaire :

Consommation annuelle totale des clients divisée par la durée de la période de consommation et par le nombre de clients (unité : m^3/consommateur/an).

Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service et taux de respect de ce délai [D 151.0] :

Ce délai est le temps exprimé en heures ou en jours sur lequel s'engage le service pour ouvrir un branchement neuf (hors délai de réalisation des travaux) ou remettre en service un branchement existant. Le

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

taux de respect est exprimé en pourcentage du nombre de demandes d'ouverture d'un branchement pour lesquelles le délai est respecté. (Arrêté du 2 mai 2007)

Développement durable :

Le rapport Brundtland a défini en 1987 la notion de développement durable comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». La conférence de Rio de 1992 a popularisé cette définition de développement économique efficace, équitable et soutenable, et celle de programme d'action ou « Agenda 21 ». D'autres valeurs sont venues compléter ces notions initiales, en particulier être une entreprise responsable, respecter les droits humains, assurer le droit des habitants à disposer des services essentiels, favoriser l'implication de la société civile, faire face à l'épuisement des ressources et s'adapter aux évolutions climatiques.
Les Objectifs du Développement Durable (ODD) de l'agenda 2030 sont un ensemble de 17 objectifs établis en 2015 par les Nations Unies et concernent tous les pays (développés et en voie de développement), dont l'objectif 6 : Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement.
Ces nouveaux objectifs succèdent aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD de 2000 à 2015) pour réduire la pauvreté dans les pays en voie de développement (à ce titre Veolia a contribué à l'accès de 6,5 millions de personnes à l'eau potable et a raccordé près de 3 millions de personnes aux services d'assainissement dans les pays émergents).

Eau souterraine influencée :

Eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2 NFU.

HACCP :

Hazard Analysis Critical Control Point : méthode d'identification et de hiérarchisation des risques développée à l'origine dans le secteur agroalimentaire, cette méthode est depuis utilisée pour les systèmes d'alimentation en eau potable.

Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau [P108.3] :

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100 %, avec le barème suivant :

- 0 % : aucune action ;
- 20 % : études environnementale et hydrogéologique en cours ;
- 40 % : avis de l'hydrogéologue rendu ;
- 50 % : dossier déposé en préfecture ;
- 60 % : arrêté préfectoral ;
- 80 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés) ;
- 100 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté.

En cas d'achat d'eau à d'autres services publics d'eau potable par le service ou de ressources multiples, l'indicateur est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en tenant compte des volumes annuels d'eau produits ou achetés à d'autres services publics d'eau potable.

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable [P103.2] :

Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 120 points, à la fois :

- le niveau de connaissance du réseau et des branchements,
- et l'existence d'une politique de renouvellement pluriannuelle du service d'assainissement collectif.

L'échelle est de 0 à 100 points pour les services n'exerçant pas la mission de distribution.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : *http://services.eaufrance.fr/*

Indice linéaire de pertes en réseau [P106.3] :

L'indice linéaire de pertes en réseau est égal au volume perdu dans les réseaux par jour et par kilomètre de réseau (hors linéaires de branchements). Cette perte est calculée par différence entre le volume mis en distribution et le volume consommé autorisé. Il est exprimé en m^3/km/jour.

Indice linéaire des volumes non comptés [P105.3] :

L'indice linéaire des volumes non comptés est égal au volume journalier non compté par kilomètre de réseau (hors linéaires de branchements). Le volume non compté est la différence entre le volume mis en distribution et le volume comptabilisé. L'indice est exprimé en m^3/km/jour.

Nombre d'habitants desservis (Estimation du) [D101.0] :

Il s'agit de la population totale (avec 'double compte') desservie par le service, estimée par défaut à partir des populations authentifiées annuellement par décret pour les communes du service et des taux de couverture du service sur ces communes. Conformément à la réglementation en vigueur, l'exercice de l'année N donne le recensement de l'année N-3.

Parties prenantes :

Acteurs internes et externes intéressés par le fonctionnement d'une organisation, comme un service d'eau ou d'assainissement : salariés, clients, fournisseurs, associations, société civile, pouvoirs publics …

Prélèvement :

Un prélèvement correspond à l'opération permettant de constituer un ou plusieurs échantillons cohérents (un échantillon par laboratoire) à un instant donné (ou durant une période donnée) et à un endroit donné (1 prélèvement = n échantillons pour n laboratoires). (Circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008)

Rendement du réseau de distribution [P104.3] :

Le rendement du réseau est obtenu en faisant le rapport entre, d'une part le volume consommé autorisé augmenté du volume vendu à d'autres services publics d'eau potable et, d'autre part le volume produit augmenté des volumes achetés à d'autres services publics d'eau potable. Le volume consommateurs sans comptage et le volume de service du réseau sont ajoutés au volume comptabilisé pour calculer le volume consommé autorisé. Le rendement est exprimé en pourcentage. (Arrêté du 2 mai 2007)
La Loi Grenelle 2 a imposé un rendement minimum à atteindre pour chaque réseau de distribution, dont la valeur dépend de la densité de l'habitat et de la taille du service, ainsi que de la disponibilité de la ressource en eau. Cette valeur « seuil » est définie par le décret 2012–97 du 27 janvier 2012. Cette définition réglementaire est transcrite dans la formule générique donnée ci-après :
Objectif Rdt Grenelle 2 = Min (A + 0,2 ILC ; 85)

Avec :

- Objectif Rdt Grenelle 2 exprimé en % ;
- ILC : Indice Linéaire de Consommation (m^3/j/km) qui traduit la densité de l'habitat et la taille du service ;
- A = 65 dans la majorité des situations excepté pour les réseaux alimentés, d'une part, par une ressource en eau classée en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) et, d'autre part, par des prélèvements supérieurs à 2 Mm^3/an où le terme A prend alors la valeur de 70 (pour tenir compte de la faible disponibilité de la ressource en eau).

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Réseau de desserte :

Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière gravitaire ou sous pression l'eau potable issue des unités de potabilisation jusqu'aux points de raccordement des branchements des abonnés ou des appareils publics (tels que les bornes incendie, d'arrosage, de nettoyage…) et jusqu'aux points de livraison d'eau en gros. Il est constitué de réservoirs, d'équipements hydrauliques, de conduites de transfert, de conduites de distribution mais ne comprend pas les branchements.

Réseau de distribution :

Le réseau de distribution est constitué du réseau de desserte défini ci-dessus et des conduites de branchements.

Résultat d'analyse :

On appelle résultat d'analyse chaque valeur mesurée pour chaque paramètre. Ainsi pour un prélèvement effectué, il y a plusieurs résultats d'analyse (1 résultat par paramètre).

Taux d'impayés [P154.0] :

Il correspond au taux d'impayés au 31/12 de l'année N sur les factures émises au titre de l'année N-1. Le montant facturé au titre de l'année N-1 comprend l'ensemble de la facture, y compris les redevances prélèvement et pollution, la taxe Voies Navigables de France et la TVA liée à ces postes. Pour une facture donnée, les montants impayés sont répartis au prorata hors taxes et redevances de la part « eau » et de la part « assainissement ». Sont exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers. (Arrêté du 2 mai 2007)

Taux d'occurrence des interruptions du service non programmées [P151.1] :

Nombre de coupures d'eau, par millier d'abonnés, survenues au cours de l'année pour lesquelles les abonnés concernés n'ont pas été informés au moins 24h à l'avance.
Les coupures de l'alimentation en eau liées à des problèmes qualitatifs sont prises en compte.
Les coupures chez l'abonné lors d'interventions effectuées sur son branchement ne sont pas prises en compte.

Taux de mensualisation :

Pourcentage du nombre total de clients (consommateurs particuliers, clients industriels, etc.) ayant opté pour un règlement mensuel par prélèvement bancaire.

Taux de prélèvement :

Pourcentage du nombre total de clients (consommateurs particuliers, clients industriels, etc.) ayant opté pour un règlement des factures par prélèvement bancaire.

Taux de conformité aux paramètres microbiologiques [P101.1] :

Pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m^3/j : pourcentage des prélèvements aux fins d'analyses microbiologiques jugés conformes selon la réglementation en vigueur. Les prélèvements considérés sont :
Ceux réalisés par l'ARS dans le cadre du Contrôle Sanitaire en application de l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique
Et le cas échéant ceux réalisés par le délégataire dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue en partie au Contrôle Sanitaire dans le cadre de l'arrêté du 21 novembre 2007 relatif aux modalités de prise

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

en compte de la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en application de l'article R. 1321-24 du code de la santé publique

Pour les services desservant moins de 5 000 habitants et produisant moins de 1 000 m³/j : nombre de prélèvements aux fins d'analyses microbiologiques effectués dans l'année et parmi ceux-ci nombre de prélèvements non conformes.

Taux de conformité aux paramètres physico-chimiques [P102.1] :

Pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m³/j : pourcentage des prélèvements aux fins d'analyses physico-chimiques jugés conformes selon la réglementation en vigueur. Les prélèvements considérés sont :
ceux réalisés par l'ARS dans le cadre du Contrôle Sanitaire en application de l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique.
et le cas échéant ceux réalisés par l'opérateur dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue en partie au Contrôle Sanitaire dans le cadre de l'arrêté du 21 novembre 2007 relatif aux modalités de prise en compte de la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en application de l'article R. 1321-24 du code de la santé publique.

Pour les services desservant moins de 5 000 habitants et produisant moins de 1 000 m³/j : nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-chimiques effectués dans l'année et parmi ceux-ci nombre de prélèvements non conformes.

Taux de mutation (demandes d'abonnement) :

Nombre de demandes d'abonnement (mouvement de consommateurs) rapporté au nombre total de consommateurs, exprimé en pour cent.

Taux de réclamations [P155.1] :

Ces réclamations peuvent être reçues par l'opérateur ou directement par la collectivité. Un dispositif de mémorisation et de suivi des réclamations écrites est à mettre en œuvre. Le taux de réclamations est le nombre de réclamations écrites rapporté au nombre d'abonnés divisé par 1 000. Sont prises en compte les réclamations relatives à des écarts ou des non-conformités vis-à-vis d'engagements contractuels, d'engagements de service, notamment au regard du règlement de service, ou vis-à-vis de la réglementation, à l'exception de celles relatives au niveau de prix.

Volume acheté en gros (ou acheté à d'autres services d'eau potable) :

Le volume acheté en gros est le volume d'eau potable en provenance d'un service d'eau extérieur. Il est strictement égal au volume importé.

Volume comptabilisé :

Le volume comptabilisé résulte des relevés des appareils de comptage des abonnés (circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008). Ce volume n'inclut pas le volume vendu en gros.

Volume consommateurs sans comptage :

Le volume consommateurs sans comptage est le volume utilisé sans comptage par des usagers connus, avec autorisation.

Volume consommé autorisé :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Le volume consommé autorisé est, sur le périmètre du service, la somme du volume comptabilisé, du volume consommateurs sans comptage et du volume de service du réseau.

Volume de service du réseau :

Le volume de service du réseau est le volume utilisé pour l'exploitation du réseau de distribution.

Volume mis en distribution :

Le volume mis en distribution est la somme du volume produit et du volume acheté en gros (importé) diminué du volume vendu en gros (exporté).

Volume produit :

Le volume produit est le volume issu des ouvrages de production du service pour être introduit dans le réseau de distribution. Le volume de service de l'unité de production n'est pas compté dans le volume produit.

Volume vendu en gros (ou vendu à d'autres services d'eau potable) :

Le volume vendu en gros est le volume d'eau potable livré à un service d'eau extérieur. Il est strictement égal au volume exporté.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20250626-DEL-2025-06-077-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2025

Ressourcer le monde

© Médiathèque VEOLIA - François Moura © Médiathèque VEOLIA - Samuel Bigot/Andia © Médiathèque VEOLIA - Rodolphe Escher © Médiathèque VEOLIA - Alexandre Dupeyron
© Médiathèque VEOLIA - Martial Ruaud/Andia © Médiathèque VEOLIA - Christel SASSO/CAPA PICTURES © Photo par Thomas Barwick / Getty Images © Cavan Images via Getty Images

Veolia
30 rue Madeleine Vionnet • 93300 Aubervilliers
www.veolia.com
